


GESTION DE PROJET & PMBOK

- Définir un projet, un programme et un portefeuille de projets, la gestion de projet
- Le Chef de Projet, ses compétences, son équipe
- Le PMI, ses standards et certifications
- De la 6^{ème} édition à la 7^{ème} édition du PMBOK
- Gestion de projet prédictive vs Gestion de projet agile
- Structures Organisationnelles, PMO et Cycle de vie des projets
- Code Ethique et de Conduite Professionnelle



NOTE AUX APPRENANTS

- ▶ Cette version des supports du séminaire qui sera utilisée par les Formateurs est fournie afin de minimiser les efforts de prise de notes.
- ▶ Toutefois, certaines diapositives ne sont pas incluses dans la présente version afin de ne pas influencer la réalisation de certains exercices.
- ▶ De même, plusieurs diapositives sont fournies à titre d'information additionnelle et ne seront donc pas explicitement présentées lors du séminaire de formation.
- ▶ La reproduction en partie ou en totalité de ce document sans l'autorisation de ALFINEX et du PMI est interdite.



RUBRIQUE A : PROJET VS MANAGEMENT DE PROJET



Livrables et outils

Livrables	Outils
Projet	GO NO GO
Programme	
Portefeuille de projets	
Management de projet	
Phase de projets	
Acteurs de projet	



 **Construire
un pont**

PROJET : OUI OU NON ?

Concevoir et mettre un nouveau modèle d'avion sur le marché



PROJET : OUI OU NON ?



Lancer un
nouveau
produit high
tech sur le
marché

PROJET : OUI OU NON ?



Développer
une nouvelle
application

PROJET : OUI OU NON ?



Organiser une Campagne Électorale

Projet : OUI ou NON ?

Projet : OUI ou NON ?

2'03

2'17


4'05

5'15

www.exam-pm.com

Définition d'un projet


- ❖ Un projet est une entreprise **temporaire**, décidée en vue d'un **résultat unique** produit ou service.
- ❖ Un projet c'est aussi un **objectif** à atteindre avec des **ressources limitées** dans un **délai donné**.
- ❖ Caractéristiques principales d'un projet :
 - Unicité du produit
 - Notion de progressivité

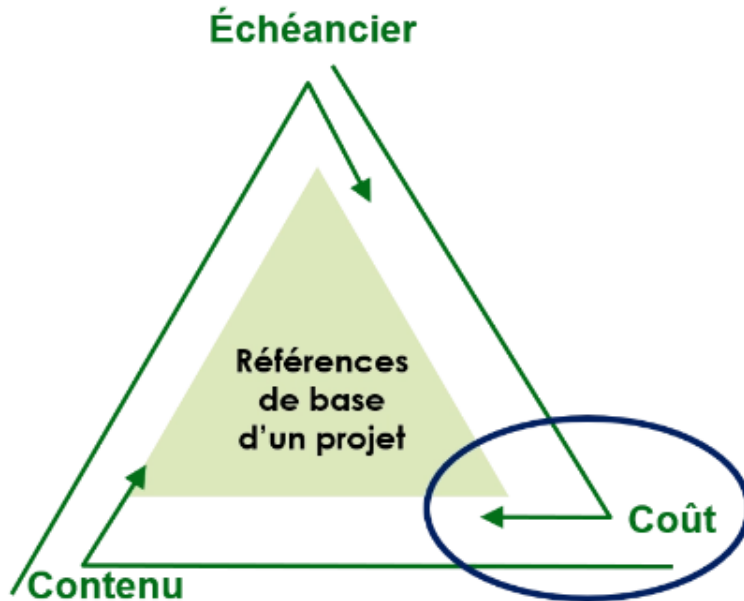

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET FORMATION

Plus que jamais une priorité pour attirer et retenir les collaborateurs

Réinventer l'entreprise et son organisation est un enjeu majeur pour les entreprises. Les formations et certifications en gestion de projet représentent une solution incontournable pour l'avenir et le succès futur des entreprises.

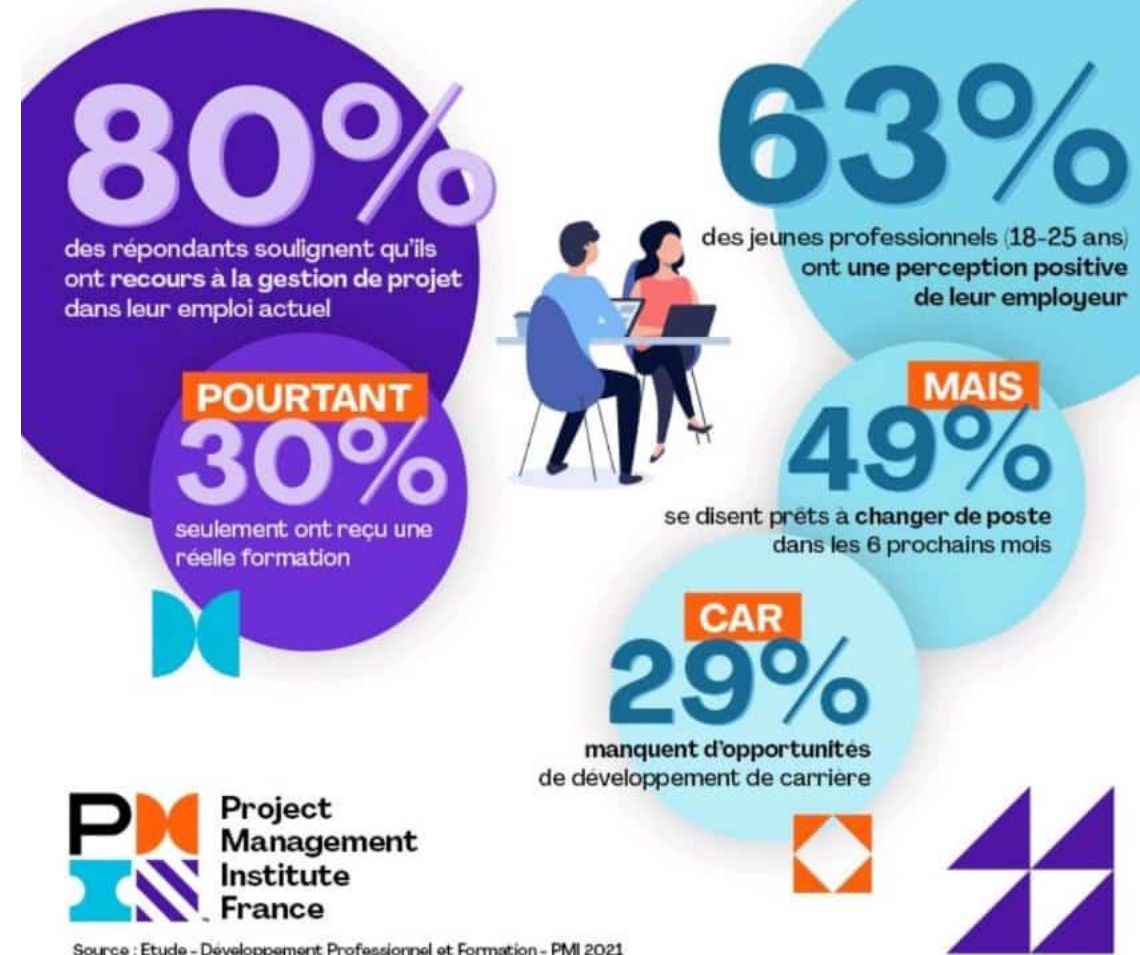

Management de projet

Le Management de projet - La gestion de projet ou la conduite de projet est une **démarche** visant à **structurer, assurer et optimiser** le bon déroulement d'un projet. C'est une **méthode**, un **ensemble de techniques et outils** pour **planifier, estimer et contrôler** les activités en vue d'atteindre un objectif dans les délais, le budget et dans le respect des spécifications ou du périmètre.

Pour les besoins de gestion, un grand projet peut être découpé en sous-projets pour obtenir des unités de réalisation plus petites. Par contre tous les projets sont découpés en **phases** qui sont des ensembles d'activités techniques de fabrication du **produit** final et des activités de gestion de projet logiquement liées aboutissant à la création d'un livrable sachant qu'un livrable projet est un résultat spécifique, tangible et mesurable du projet. L'ensemble des phases constitue le **cycle de vie du projet**.



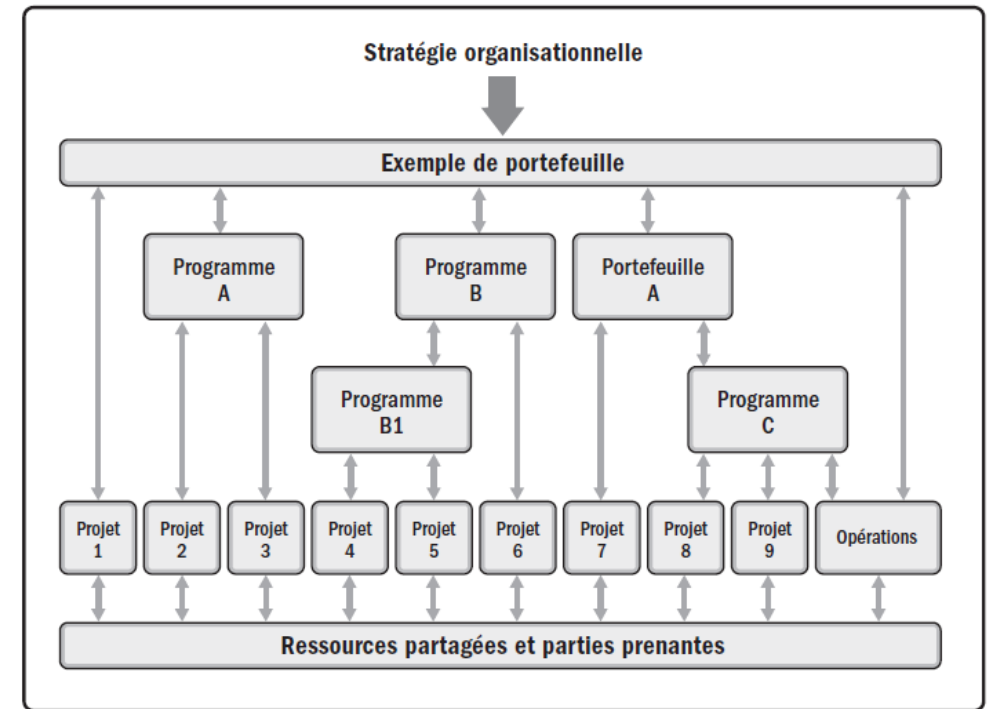


Figure 1-3. Portefeuilles, programmes, projets et opérations


Phases du projet

Phase du projet* : ensemble d'activités de projet liées de façon logique qui aboutit à la réalisation d'un ou plusieurs livrables.

- Produisent un ou plusieurs livrables
- Peuvent être exécutées de manière séquentielle ou se chevaucher
- Les données de sortie d'une phase sont généralement des données d'entrée de la phase suivante.

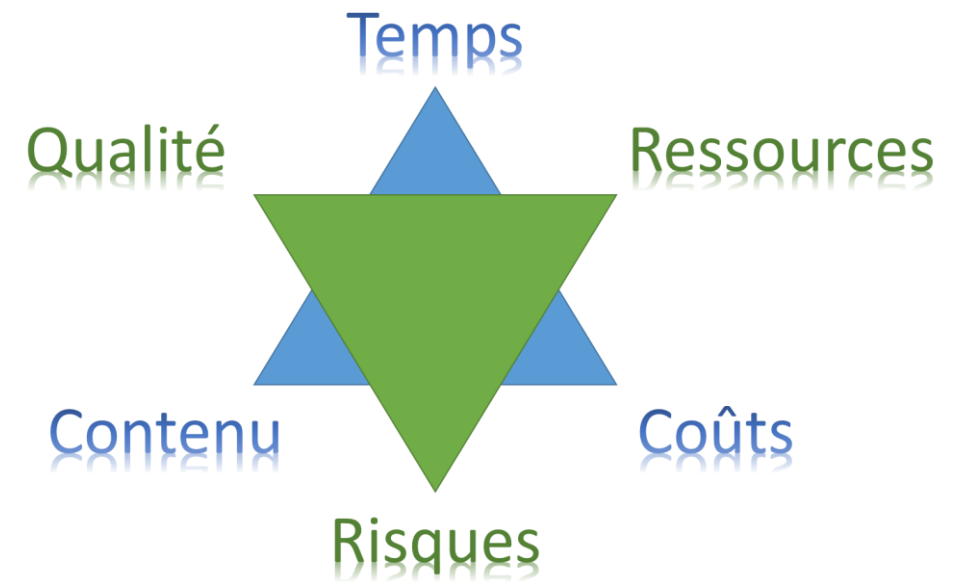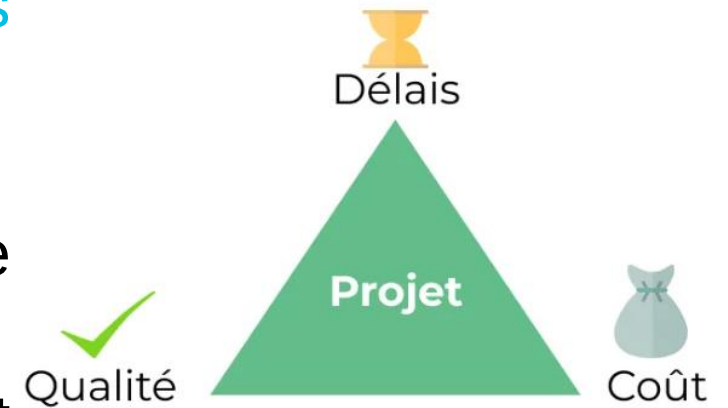

Les relations séquentielles contiennent des phases consécutives qui ne démarrent que lorsque la phase précédente est terminée. Cette relation réduit le niveau d'incertitude, ce qui peut éliminer la possibilité de raccourcir l'échéancier d'un projet.




Les relations de chevauchement contiennent des phases qui commencent avant la fin de la phase précédente. Cette relation augmente le niveau de risque et peut entraîner des reprises si un élément de la phase précédente affecte directement la phase suivante.

Voies d'escalade

Porte de phase* : revue en fin de phase au cours de laquelle la décision est prise de passer à la phase suivante, de continuer en apportant des changements ou de mettre fin à un projet ou à un programme. On parle aussi de revue de phase ou de GO-NO-GO.

- Également appelée porte de gouvernance, porte d'étape ou encore point d'arrêt.
- Utilisée pour vérifier si chaque phase répond aux critères de sortie et est éligible pour passer à la phase suivante.
- Les projets de développement de logiciels utilisent un type particulier de porte de phase appelé porte de qualité.

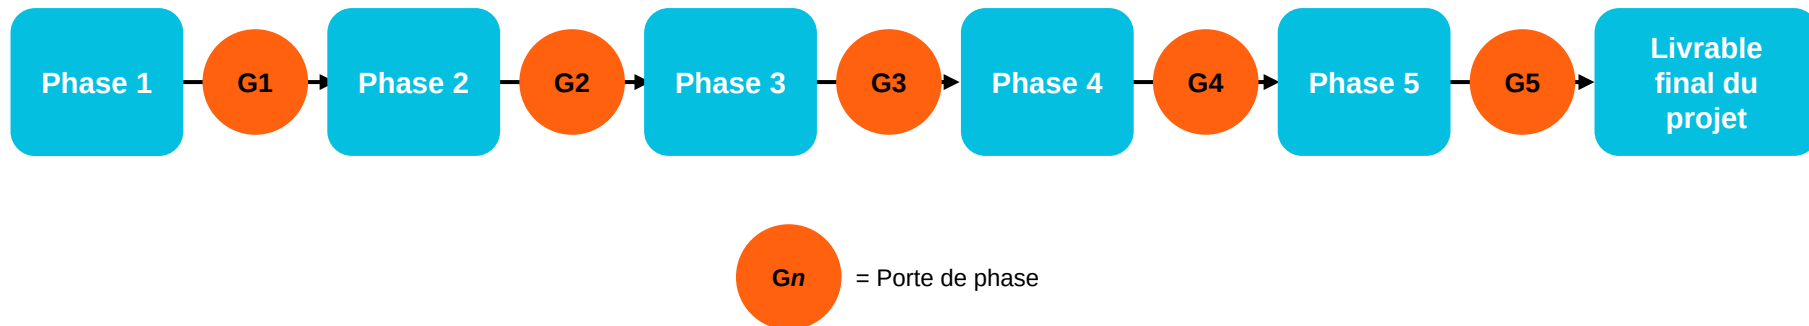

Programme vs Portefeuille de projets


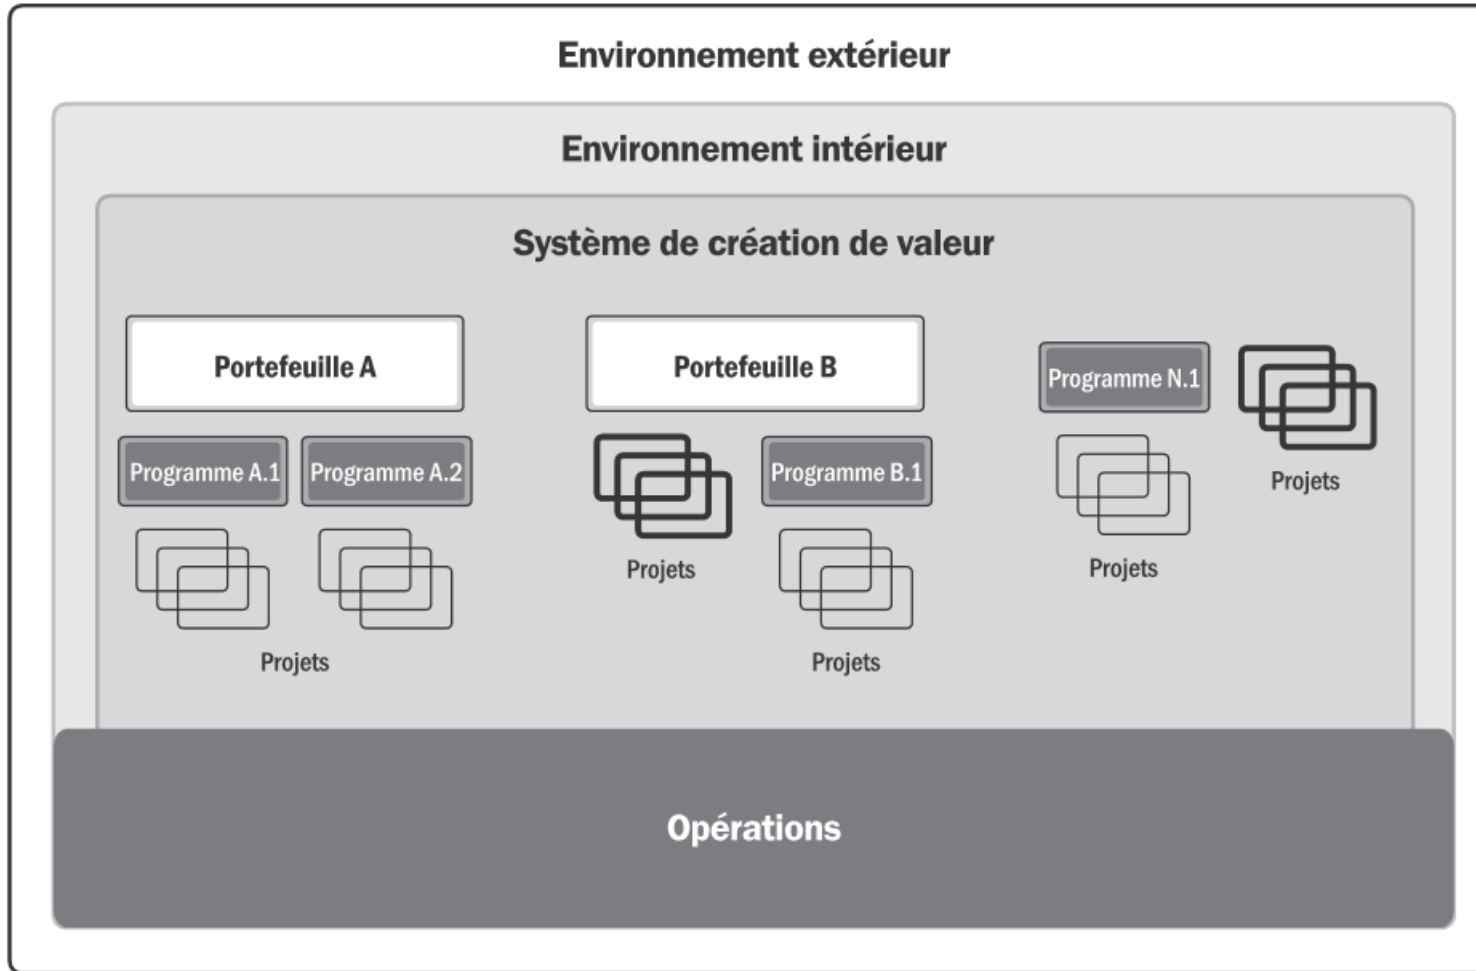


Figure 2-2. Composants d'un exemple de système de création de valeur

Un programme - Groupe de projets en rapport les uns avec les autres, gérés de manière coordonnée afin d'obtenir des gains et un contrôle supérieur à ce qu'on aurait en les gérant indépendamment les uns des autres.



Un portefeuille de projets - Ensemble de projets et de programmes qui sont regroupés afin de faciliter une gestion efficace dans l'atteinte des objectifs stratégiques.

Les acteurs du projet

- ❖ Chef de / Chargé de / Coordonnateur de / Gestionnaire de / Directeur de projet
- ❖ Equipe de projet
- ❖ Pilotes du projet : Comité de Pilotage
- ❖ Sponsor ou Commanditaire du projet
- ❖ Contrôleur et Planificateur de projet
- ❖ Responsable gestion des risques
- ❖ Responsable gestion documentaire
- ❖ Client final, les utilisateurs
- ❖ Acteurs Fonctionnels ou Techniques
- ❖ Acteurs Institutionnels Internes (PMO, Comité de Direction, Architectes, ...)
- ❖ Acteurs Institutionnels Externes (CNIL, Bailleurs de Fonds, ...)
- ❖ Partenaires du projet (Fournisseurs, Sous-traitants, ...)



RUBRIQUE B : LE MYSTERIEUX CHEF DE PROJET



Livrables et outils

Livrables	Outils
Le Chef de Projet	Styles de leadership
Charte d'Équipe	Règles de base
Leadership et Motivation des Équipes	Objectifs SMART
	Évaluation des profils de personnalité
	Théorie des organisations de Maslow
	Théorie de motivation d'Hertzberg

Le Chef de Projet

Le Chef de Projet est un chef d'orchestre qui joue un rôle essentiel dans l'exercice du leadership sur une équipe projet afin d'atteindre les objectifs du projet.

Un grand orchestre peut compter 100 musiciens jouant 25 sortes d'instruments différents appartenant aux grandes familles des cordes, bois, cuivres et percussions. De même un projet peut compter une centaine de membres d'équipe et ou de parties prenantes intervenant chacun dans des domaines particuliers.

Tout comme le chef d'orchestre, le Chef de Projet est responsable de ce que produit l'équipe à savoir l'aboutissement du projet ou du concert symphonique. Les deux chefs doivent avoir une vision globale des livrables de leur équipe afin de les planifier, les coordonner et les achever.

Le chef d'orchestre ne sait pas jouer de tous les instruments de musique en revanche il possède une compréhension, une expérience et des connaissances musicales. De même le Chef de Projet n'est pas censé accomplir ou savoir accomplir les activités des différents corps de métier.

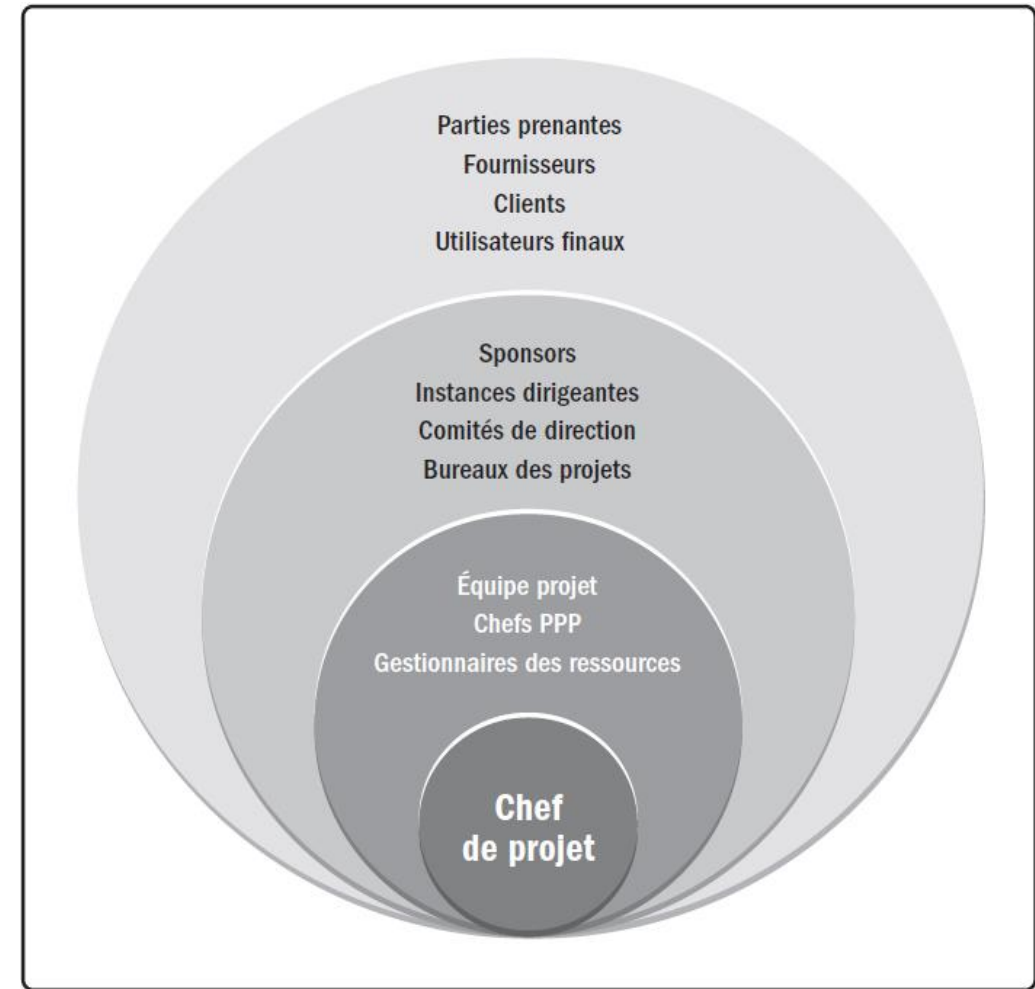


Figure 3-1. Exemple de sphère d'influence du chef de projet

Le Chef de Projet vs Satisfaction Client

Le Chef de Projet

Le Chef de Projet est la personne désignée pour diriger l'équipe de projet afin d'atteindre les objectifs du projet et de répondre aux attentes des parties prenantes. Il s'efforce de trouver un équilibre entre les contraintes divergentes du projet et la disponibilité des ressources.



La priorité du Chef de Projet est d'assumer la communication entre le sponsor du projet, les membres de l'équipe, le client, l'utilisateur final et les autres parties prenantes.

Le Chef de Projet et son pouvoir

Pouvoir de position
ou pouvoir officiel ou
légitime ;

Pouvoir de
l'information ;

Pouvoir de référence
(le respect ou
l'admiration qu'il
suscite, la crédibilité
obtenue) ;

Pouvoir situationnel
(obtenu en raison
d'une situation, une
crise) ;

Pouvoir personnel
ou charismatique (le
charme, l'attraction)
;

Pouvoir relationnel
(participation au
networking, aux
alliances) ;

Pouvoir de l'expert
(compétences,
formations,
expériences, ...) ;

Pouvoir de
récompense
(capacité à féliciter
ou sanctionner) ;

Pouvoir coercitif
(capacité à
contraindre, à
obliger) ;


Pouvoir de
séduction (usage de
flatteries, terrain
d'entente, ...) ;

Pouvoir fondé sur la
pression ()

Le Chef de projet et ses compétences


Connaissances
Compétences
Expériences
en Management de projet

Sensibilité politique
et culturelle

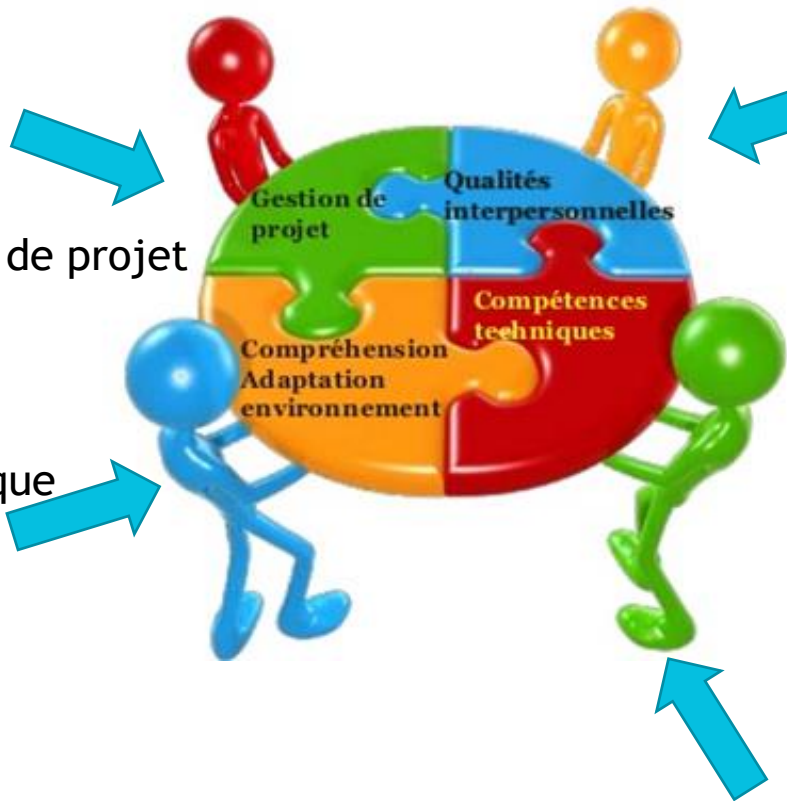

Connaissances et
compétences techniques
générales du secteur
d'activités

- Leadership
- Motivation
- Communication (90% du temps)
- Développement de l'esprit d'équipe
- Influence
- Prise de décision
- Résolution de conflits (climat de confiance, compromis, ...)
- Négociation
- Accueil positif des commentaires
- Visionnaire
- Optimisme et Positivisme
- Promotion du mérite

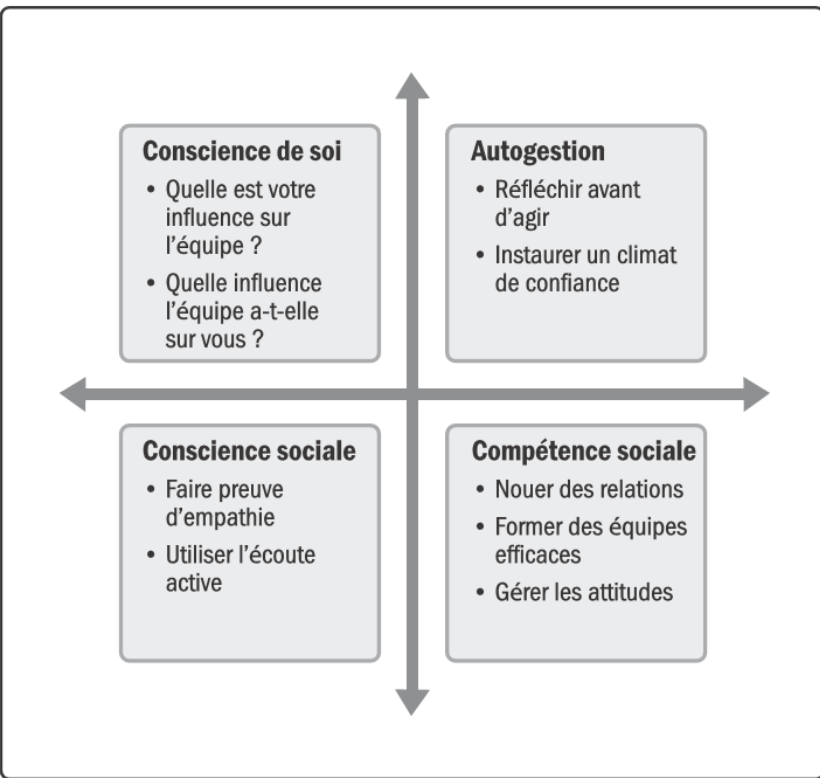



DÉLIMITATION DES RÔLES ET DES TÂCHES PROFESSIONNELLES DU CHEF DE PROJET

PERSONNES

1. Gérer les conflits
2. Diriger une équipe
3. Soutenir les performances de l'équipe
4. Responsabiliser les membres de l'équipe et les parties prenantes
5. Veiller à ce que les membres de l'équipe/parties prenantes soient correctement formés
6. Créer une équipe
7. Surmonter et éliminer les freins, les obstacles et les points de blocage de l'équipe
8. Négocier des accords de projet
9. Collaborer avec les parties prenantes
10. Développer une compréhension commune
11. Impliquer et soutenir les équipes virtuelles
12. Définir des règles de base pour l'équipe
13. Agir en mentor des parties prenantes concernées
14. Promouvoir les performances de l'équipe grâce à la mise en pratique de l'intelligence émotionnelle

PROCESSUS

1. Exécuter le projet avec l'urgence nécessaire pour générer une valeur commerciale
2. Gérer les communications
3. Évaluer et gérer les risques
4. Impliquer les parties prenantes
5. Planifier et gérer le budget et les ressources
6. Planifier et gérer l'échéancier
7. Planifier et gérer la qualité des produits/livrables
8. Planifier et gérer le périmètre du projet
9. Intégrer les activités de planification du projet
10. Gérer les changements apportés au projet
11. Planifier et gérer les approvisionnements
12. Gérer les artefacts du projet
13. Déterminer la méthodologie/les méthodes et les pratiques appropriées pour le projet
14. Établir la structure de gouvernance du projet
15. Gérer les problèmes du projet
16. Veiller au transfert des connaissances pour assurer la continuité du projet
17. Planifier et gérer la clôture ou les transitions du projet/de la phase

ENV. COMMERCIAL

1. Planifier et gérer la conformité du projet
2. Évaluer et générer des bénéfices et de la valeur avec le projet
3. Évaluer et traiter les changements de l'environnement commercial externe pour en déterminer l'impact sur le périmètre
4. Soutenir le changement organisationnel

3 domaines:

Personnes

Processus

Environnement

commercial

35 rôles/tâches

130+ catalyseurs

REPOST



Chef de projet & Styles de Leadership

Leadership ≠ Management

«LE LEADERSHIP SE MESURE AU NOMBRE DE PERSONNES QUI SONT PRÊTES À SE MOBILISER POUR VOUS ET NON AU NOMBRE DE PERSONNES À QUI VOUS AVEZ LE POUVOIR DE DONNER DES ORDRES»

JACQUES MÉNARD



Tableau 3-1. Comparaison entre gestion d'équipe et leadership d'équipe

Management	Leadership
Dirige grâce au pouvoir positionnel	Guide, influence et collabore grâce au pouvoir relationnel
Maintient	Développe
Administre	Innove
Cible les systèmes et la structure	Cible les relations avec les personnes
S'appuie sur le contrôle	Inspire la confiance
Cible les objectifs à court terme	Cible une vision à long terme
Demande comment et quand	Demande quoi et pourquoi
Cible le bénéfice net	Cible l'horizon
Accepte le status quo	Conteste le status quo
Fait bien les choses	Fait les bonnes choses
Cible les points à traiter sur le plan opérationnel et la résolution des problèmes	Cible la vision, l'harmonisation, la motivation et l'inspiration

Chef de projet & Styles de Leadership



Éthique personnelle forte,
intégrité et fiabilité



Compétences
interpersonnelles
(communicant,
collaborateur, meneur)



Compétences conceptuelles
et analytiques

Quel est votre style de leadership ?

Les recherches décrivent de nombreux styles de leadership que le chef de projet peut adopter. Parmi les exemples les plus courants de ces styles figurent notamment :

- ◆ le style « laissez-faire » (par exemple, laisser l'équipe prendre ses décisions et établir ses buts, également appelé le style non interventionniste) ;
- ◆ le style transactionnel (par exemple, concentration sur la réalisation des objectifs, le retour d'information et l'accomplissement en échange de récompenses, gestion par exception) ;
- ◆ le style leader-serviteur (par exemple, démonstration de l'engagement à servir et faire passer les autres en premier, concentration sur le développement, l'apprentissage, l'autonomie et le bien-être des autres, sur les relations, la communauté et la collaboration ; le leadership est secondaire et émerge après le service) ;
- ◆ le style transformationnel (par exemple, responsabilisation des personnes par des attributs et des comportements idéalisés, motivation inspirée, incitation à l'innovation et à la création, considération de la personne) ;
- ◆ le style charismatique (par exemple, capacité à inspirer, grande énergie, enthousiasme, confiance en soi, convictions fortes) ;
- ◆ le style interactionnel (par exemple, une combinaison des styles transactionnel, transformationnel et charismatique).

Chef de projet & Objectifs de l'Équipe

Des objectifs clairs & des rôles et responsabilités compris de tous

L'adhésion de l'équipe au projet passe par l'établissement d'objectifs clairs. Pour se faire, les objectifs doivent être « SMART » :

- ❖ Spécifique
- ❖ Mesurable
- ❖ Atteignable
- ❖ Réaliste
- ❖ Temporellement défini;

L'implication efficace de l'équipe passe par une organisation claire des rôles et responsabilités des membres du projet.

L'organigramme du projet permet d'établir graphiquement la structure hiérarchique de l'équipe de projet;

Les descriptions de poste établissent les rôles et responsabilités de chaque membre du projet;



Chef de projet & Communication avec les membres de l'Équipe

Une mauvaise communication entre les membres de l'équipe du projet peut mener à de véritables désastres. Voici quelques actions importantes que le Chef de projet doit mener pour maintenir une communication claire et efficace avec l'équipe du projet :

- ❖ Faire de bonnes rencontres de travail
 - ❖ Face à face (lorsque possible)
 - ❖ En présence de toute l'équipe
 - ❖ Agenda de la rencontre connu
 - ❖ Dirigées par le Chef de projet
 - ❖ Effectuées sur une base régulière
 - ❖ Encourager les retours d'information (« feedback » en anglais);
- ❖ Utiliser les canaux de communication appropriés pour transmettre efficacement les messages ;
- ❖ Rencontres informelles, réunions, courriels, appels téléphoniques, vidéo conférences, etc.
- ❖ Identifier les types d'information ainsi que le niveau de détail que les différents membres recevront afin d'éviter de les submerger d'informations non pertinentes ;
- ❖ Être à l'écoute des membres de l'équipe du projet pour obtenir les informations réelles du « terrain » ;
- ❖ Communiquer régulièrement avec les membres de l'équipe qui sont hors site à l'aide de la technologie la plus appropriée ;
- ❖ Faire la promotion de l'équipe du projet et de ses membres en toute occasion.

Chef de projet & Règles de base

Les règles de base (ou « ground rules » en anglais)

Les règles de base fixent clairement les attentes concernant le comportement souhaitées de la part des membres de l'équipe de projet;

Une adhésion précoce à des directives claires permet de diminuer les malentendus et d'accroître la productivité ;

Les règles de base en matière de code de conduite, de communication, de collaboration ou de comportement lors des réunions clarifient les attentes comportementales réciproques des membres de l'équipe de projet (ex. ponctualité aux réunions, enregistrements des feuilles de temps chaque vendredi, etc.) ;

Tous les membres de l'équipe de projet partagent la responsabilité d'appliquer ces règles une fois qu'elles sont établies.

LE LANGAGE CORPOREL AU TRAVAIL



POSTURE

Une bonne posture envoie une image de confiance et fait en sorte que les collègues sont plus attentifs à vos propos.



SOUIRE

Le sourire contribue à un sentiment de mieux-être. Être souriant permet aussi de signifier aux autres que vous êtes une personne sociale, coopérative et fiable.



LES MAINS

Utiliser ses mains lorsque l'on parle ajoute de la vie et du poids à votre message. Cependant, dans l'excès, gesticuler peut devenir une distraction.


POSITION

Il est important, que ce soit assis ou debout, d'être face à face avec son interlocuteur. Cela signifie que vous échangez sur un pied d'égalité et diminue un quelconque sentiment d'intimidation.




CONTACT VISUEL

Regarder son interlocuteur dans les yeux indique que vous écoutez ce qu'il a à dire et que vous êtes intéressés par ses propos.



LA TÊTE

Avoir la tête droite peut être utilisé afin de démontrer son autorité ou être pris plus au sérieux.



Remuer

Il faut éviter de remuer sur votre chaise lors des réunions. Faire cela peut être interprété comme de l'impatience face à la situation.

Le corps

Il faut constamment faire attention aux signaux qu'on envoie. Par exemple, croiser les bras signifie que la personne n'est pas à l'écoute.



Règles de base

Règles de base : attentes claires concernant le code de conduite des membres de l'équipe.

- Les règles de base comprennent toutes les actions jugées acceptables et inacceptables dans le contexte du management de projet.
- Bénéfices :
 - Les attentes en matière de performances et de communication sont définies
 - Le risque de confusion est réduit
 - Les performances s'améliorent

Responsabilité

Respect

Équité

Honnêteté

Charte d'équipe

Charte d'équipe* : document qui consigne les valeurs, les accords et les directives de fonctionnement de l'équipe et qui définit clairement le comportement minimal acceptable des membres de l'équipe du projet.



Une bonne charte d'équipe comprend :

- Les valeurs partagées de l'équipe.
- Les directives concernant les communications et l'utilisation des outils dans l'équipe.
- Comment l'équipe prend des décisions.
- Comment l'équipe résout les conflits lorsque des désaccords surviennent.
- Comment et quand l'équipe se réunit.
- D'autres accords d'équipe (tels que les heures partagées, les activités d'amélioration).

Théorie de la motivation

Motivation

- ❖ Ce sont les « forces » internes et externes qui incitent un individu à se conduire d'une manière spécifique résultant en une performance de qualité sur une période donnée.
- ❖ La motivation est la résultante de la quête d'une attente ou d'un besoin à combler (ou satisfaire).
- ❖ La capacité du Chef de projet à motiver son équipe est un puissant moyen de gestion des hommes et de leur performance

Facteurs de la motivation

- ❖ Interpersonnels (rapports entre individus)
- ❖ Organisationnels (travail dans l'entreprise)



Théorie des organisations

Théorie des organisations : étude de la façon dont les personnes, les équipes et les organisations se comportent.


Objectif de la théorie des organisations

- Optimiser l'efficacité et la productivité
- Résoudre les problèmes
- Motiver
- Répondre aux exigences des parties prenantes


Théories des organisations courantes

- Pyramide des besoins de Maslow
- Théories X et Y de McGregor
- Théorie des besoins de McClelland
- Théorie des deux facteurs d'Herzberg

PYRAMIDE DES BESOINS SELON MASLOW

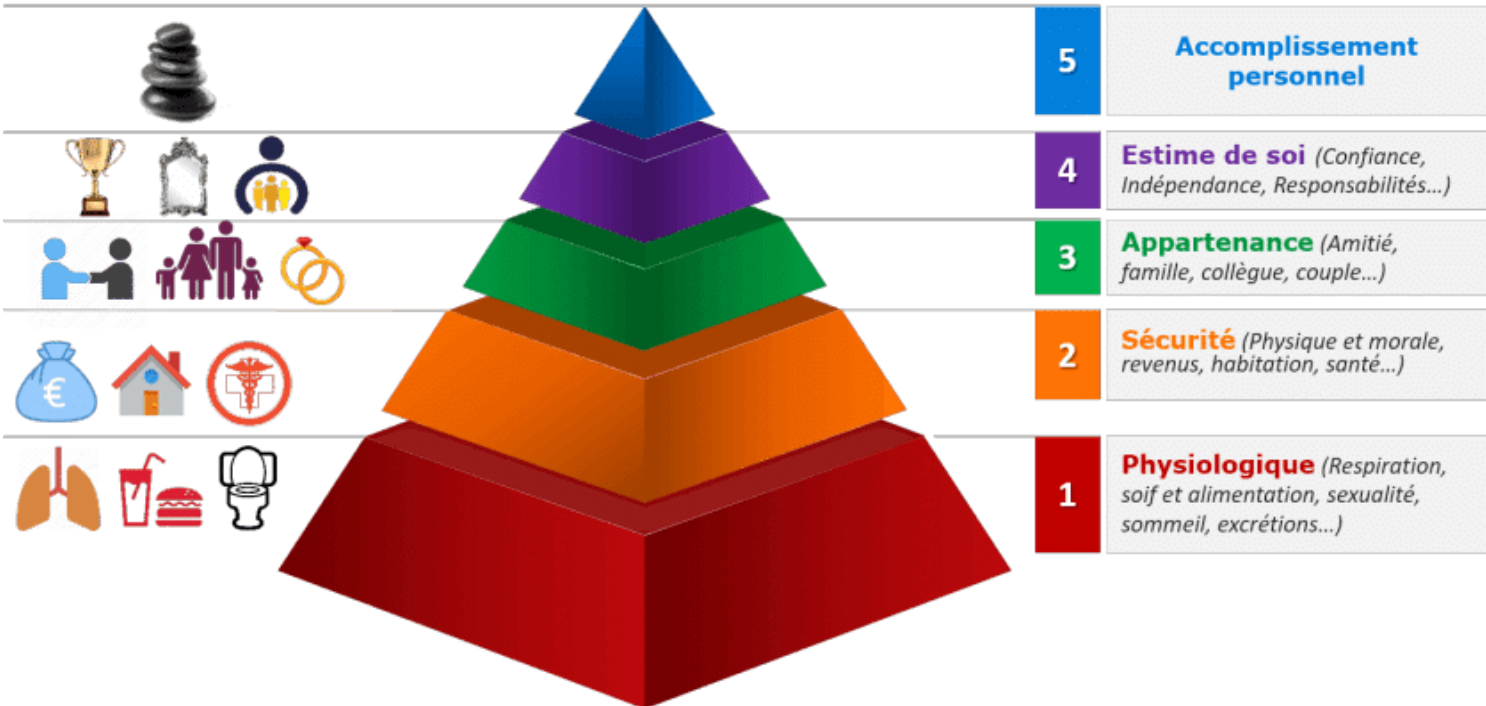

Théorie de la motivation

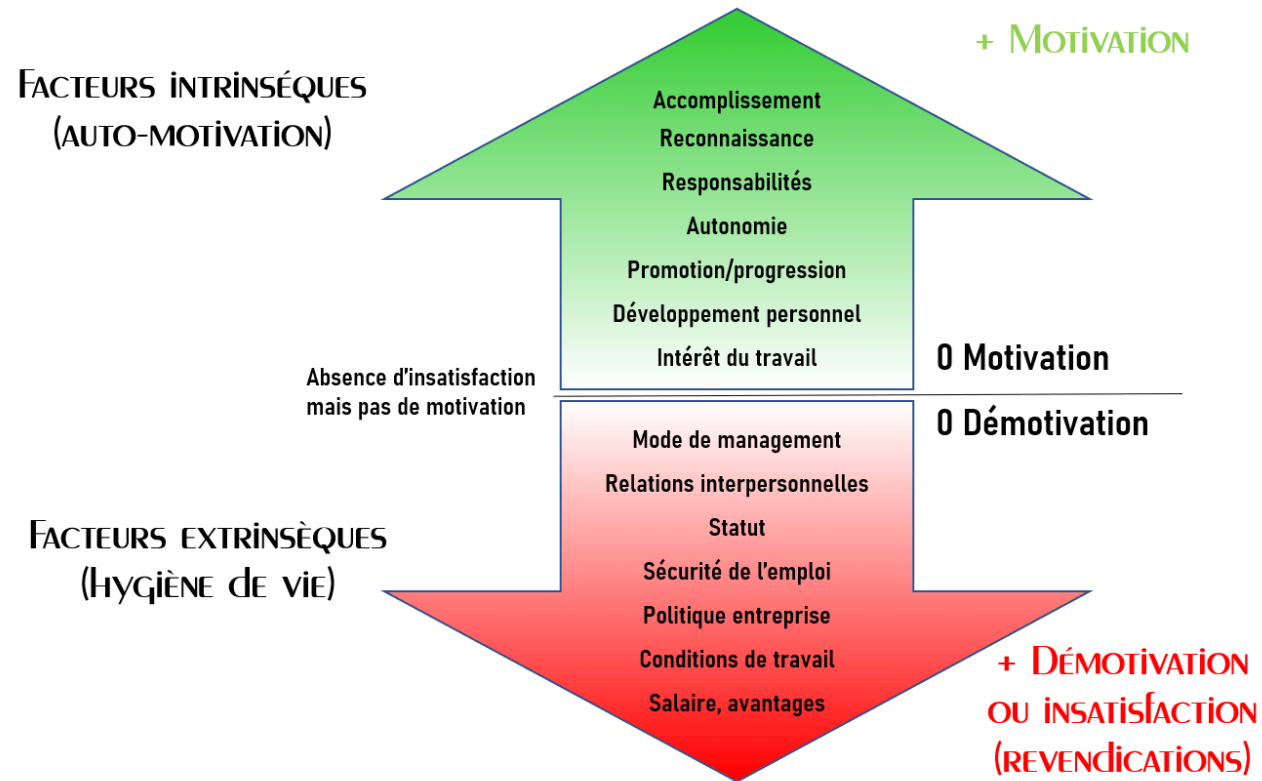

Théorie des deux facteurs de Herzberg

Les **Facteurs d'hygiène** ou d'insatisfaction sont relatifs aux conditions de travail et doivent avoir un niveau minimal de base

Les **Facteurs moteurs** ou de satisfaction sont relatifs à l'épanouissement de l'individu dans son travail

Pour Herzberg, la motivation ne peut pas provenir uniquement de l'élimination des facteurs d'insatisfaction

Motivation = absence d'insatisfaction + satisfaction

Évaluations des profils de personnalité

Théorie des types psychologiques de Carl Jung

Indicateur typologique de Myer-Briggs (MBTI) par Katherine Cook Briggs et Isabel Briggs Myers


Modèle d'évaluation DiSC de William Molton Marston

Méthodologie True Colours de Don Lowry


Modèle des styles sociaux de TRACOM

Approche des préférences cérébrales de Ned Herrmann


La matrice d'Eisenhower

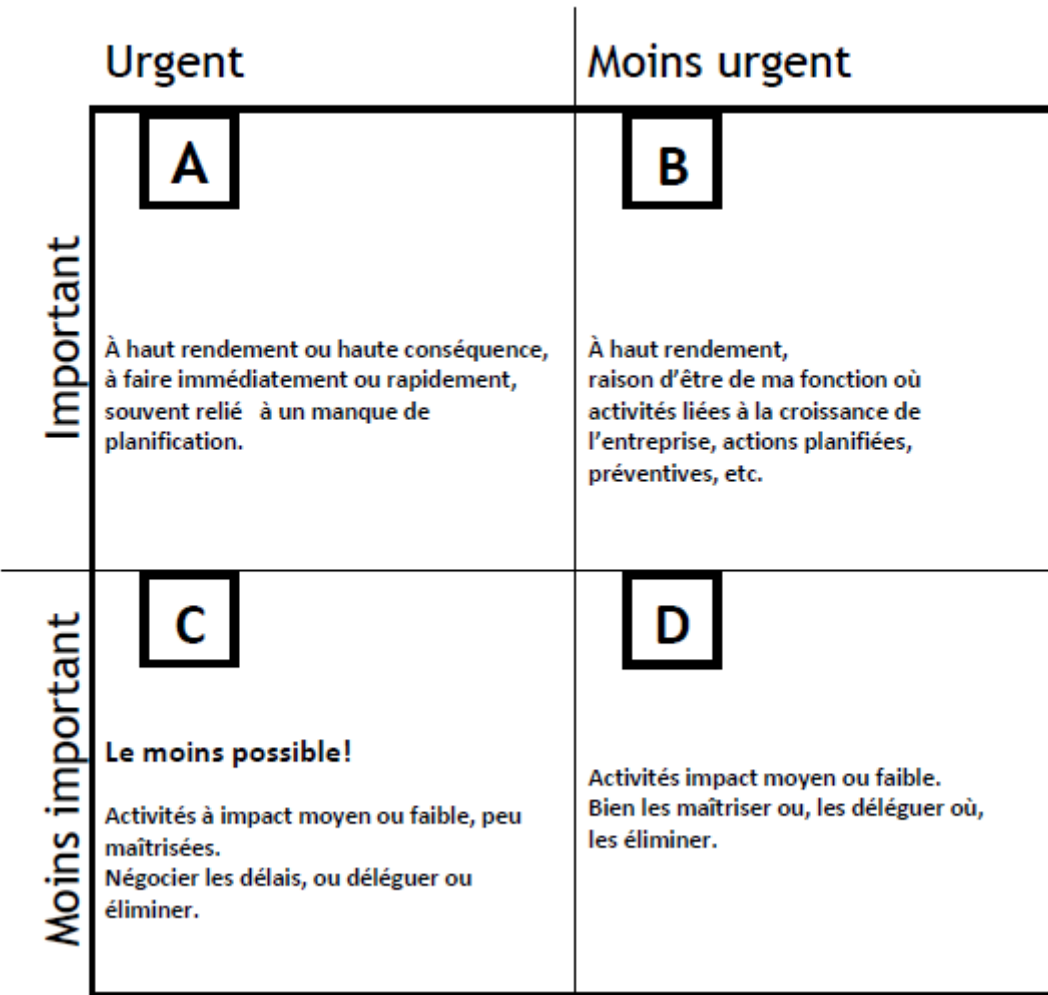

Matrice d'Eisenhower

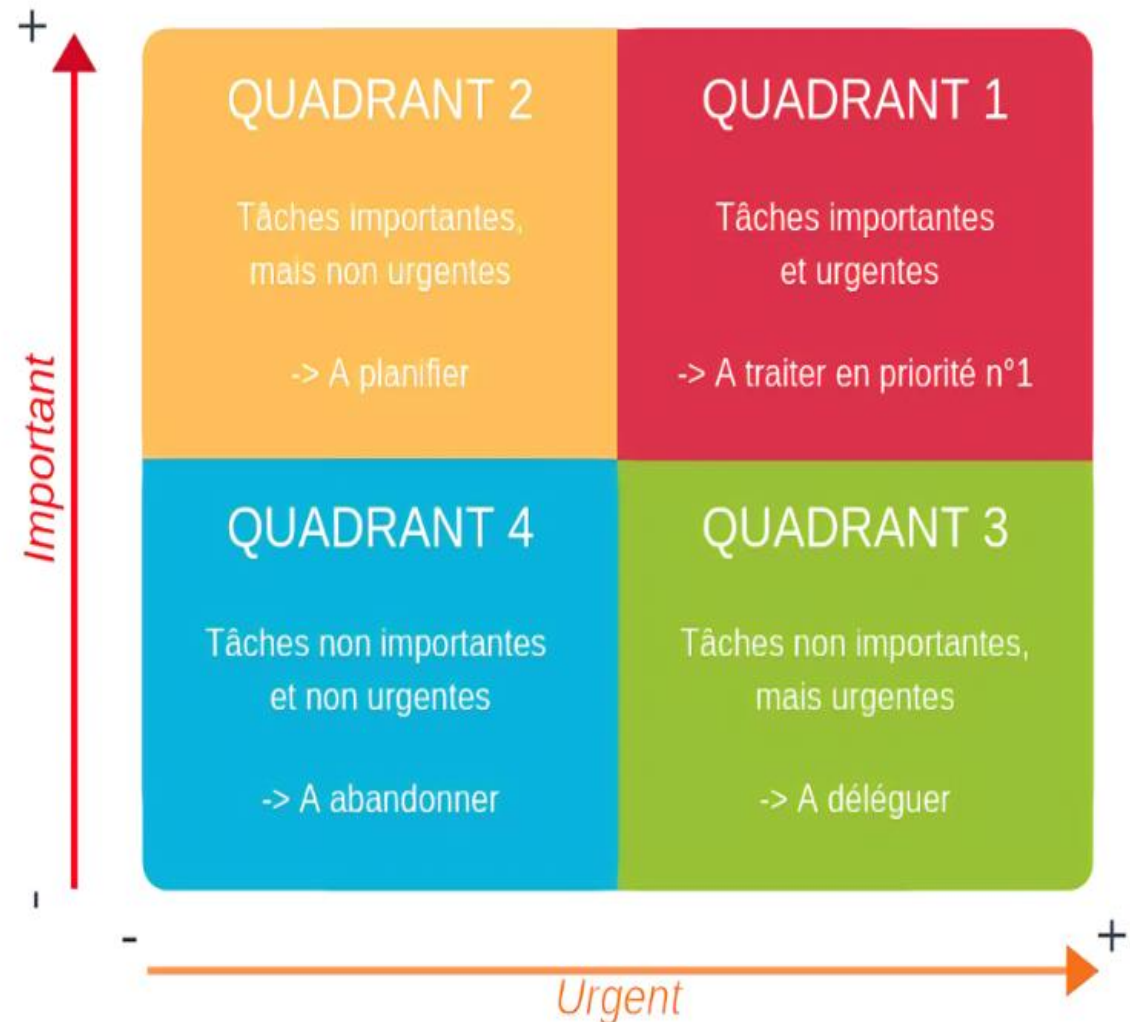

RUBRIQUE C : GÉRER LES CONFLITS



Catalyseurs

- Interpréter la source et la progression du conflit (ECO 1.1.1)
- Analyser le contexte du conflit (ECO 1.1.2)
- Évaluer/recommander/faire accepter et suivre l'efficacité (ECO 1.1.3)
- Identifier la cause originelle du malentendu (ECO 1.10.1)
- Enquêter sur les malentendus potentiels (ECO 1.10.4)

Livrables et outils

Livrables	Outils
Causes de conflits	
Approches de gestion de conflits	

Causes de conflit

Concurrence

Différences
d'objectifs, de valeurs
et de perceptions

Désaccords sur les
exigences du rôle,
les activités de travail
et les approches
individuelles

Problèmes de
communication

Le rôle du chef de projet

La gestion des conflits relève de la responsabilité de toutes les parties prenantes.

Le chef de projet influence fortement la direction et le traitement des conflits.

Les compétences interpersonnelles et d'équipe contribuent à garantir des résultats positifs lors de la gestion des conflits.

Dans les projets Agile, le chef de projet facilite la résolution des conflits tandis que l'équipe est habilitée à résoudre les conflits.

En tant que leader-serviteur, un chef de projet aide à éliminer les obstacles ou les sources de conflit.

Gestion des conflits

Les conflits sont inévitables dans un environnement de projet (rareté des ressources, priorités de l'échéancier, styles de travail de chacun, origines professionnelles et culturelles des membres, etc.)

Le succès des chefs de projet dans la direction de leurs équipes de projet dépend souvent largement de leur capacité à résoudre les conflits.

La gestion efficace des conflits permet d'améliorer la compréhension, les performances et la productivité.

Une gestion inefficace des conflits entraîne :

- Des comportements destructifs
- Une animosité
- De mauvaises performances
- Une productivité réduite.

Application d'une ou plusieurs stratégies de résolution de conflits pour faire face aux désaccords

Approches de gestion des conflits

Retrait/Évitement

- Se retirer d'une situation de conflit
- Reporter à plus tard le différend

Acceptation/Accommodement

- Mettre en avant les points d'accord
- Faire des concessions pour maintenir l'harmonie et les relations

Compromis/Conciliation

- Rechercher des solutions qui apportent un certain degré de satisfaction à chacun
- Résoudre temporairement ou partiellement le conflit par le compromis

Force/Compétition

- Imposer son point de vue au détriment des autres points de vue
- Proposer uniquement des solutions gagnant/perdant

Collaboration/Résolution de problèmes

- Intégrer des points de vue multiples
- Laisser place à une coopération et un dialogue ouvert pour parvenir au consensus et à l'engagement



Management is about persuading people to do things they do not want to do, while leadership is about inspiring people to do things they never thought they could.

— *Steve Jobs* —

AZ QUOTES

RUBRIQUE D : LE PMI, SES STANDARDS ET CERTIFICATIONS



Livrables et outils

Livrables	Outils
De la 6 ^{ème} à la 7 ^{ème} version du PMBOK	10 Domaine de Connaissances
PMI	5 Groupes de Processus
PMBOK	12 Principes
Certifications du PMI	8 Domaines de performance
Manifeste agile	49 processus de gestion de projet prédictif

Le PMI, ses standards/publications et certifications

- ❖ Le **Project Management Institute (PMI)**, fondé en 1969, est une **association professionnelle à but non lucratif** qui élabore et publie des **standards relatifs à la gestion de projet** et propose **différentes certifications** dans ce domaine. Son siège est à Philadelphie en Pennsylvanie (États-Unis). Elle compte plus d'un million de membres répartis dans plus de 125 pays.
- ❖ Le **Project Management Body of Knowledge (PMBOK)** est le guide du PMI définissant les champs de connaissance couvrant la gestion de projet, et recensant les bonnes pratiques professionnelles en la matière. Il sert de base de référence, pour établir les contenus de cours et examens de certification.
- ❖ Le **Project Management Professional ou PMP** est une certification en gestion de projets, dont le programme d'accréditation est géré par le PMI.



Le PMI, ses standards/publications et certifications



PMP – Project Management Professional



CAPM – Certified Associate in Project Management



PMI-PBA – Professional in Business Analysis



PgMP – Program Management Professional



PMI-RMP – Risk Management Professional



PMI-SP – PM Scheduling Professional



PMI-ACP – PMI Agile Certified Practitioner




PfMP – Portfolio Management Professional



Microcertifications

Le PMI, ses standards et certifications

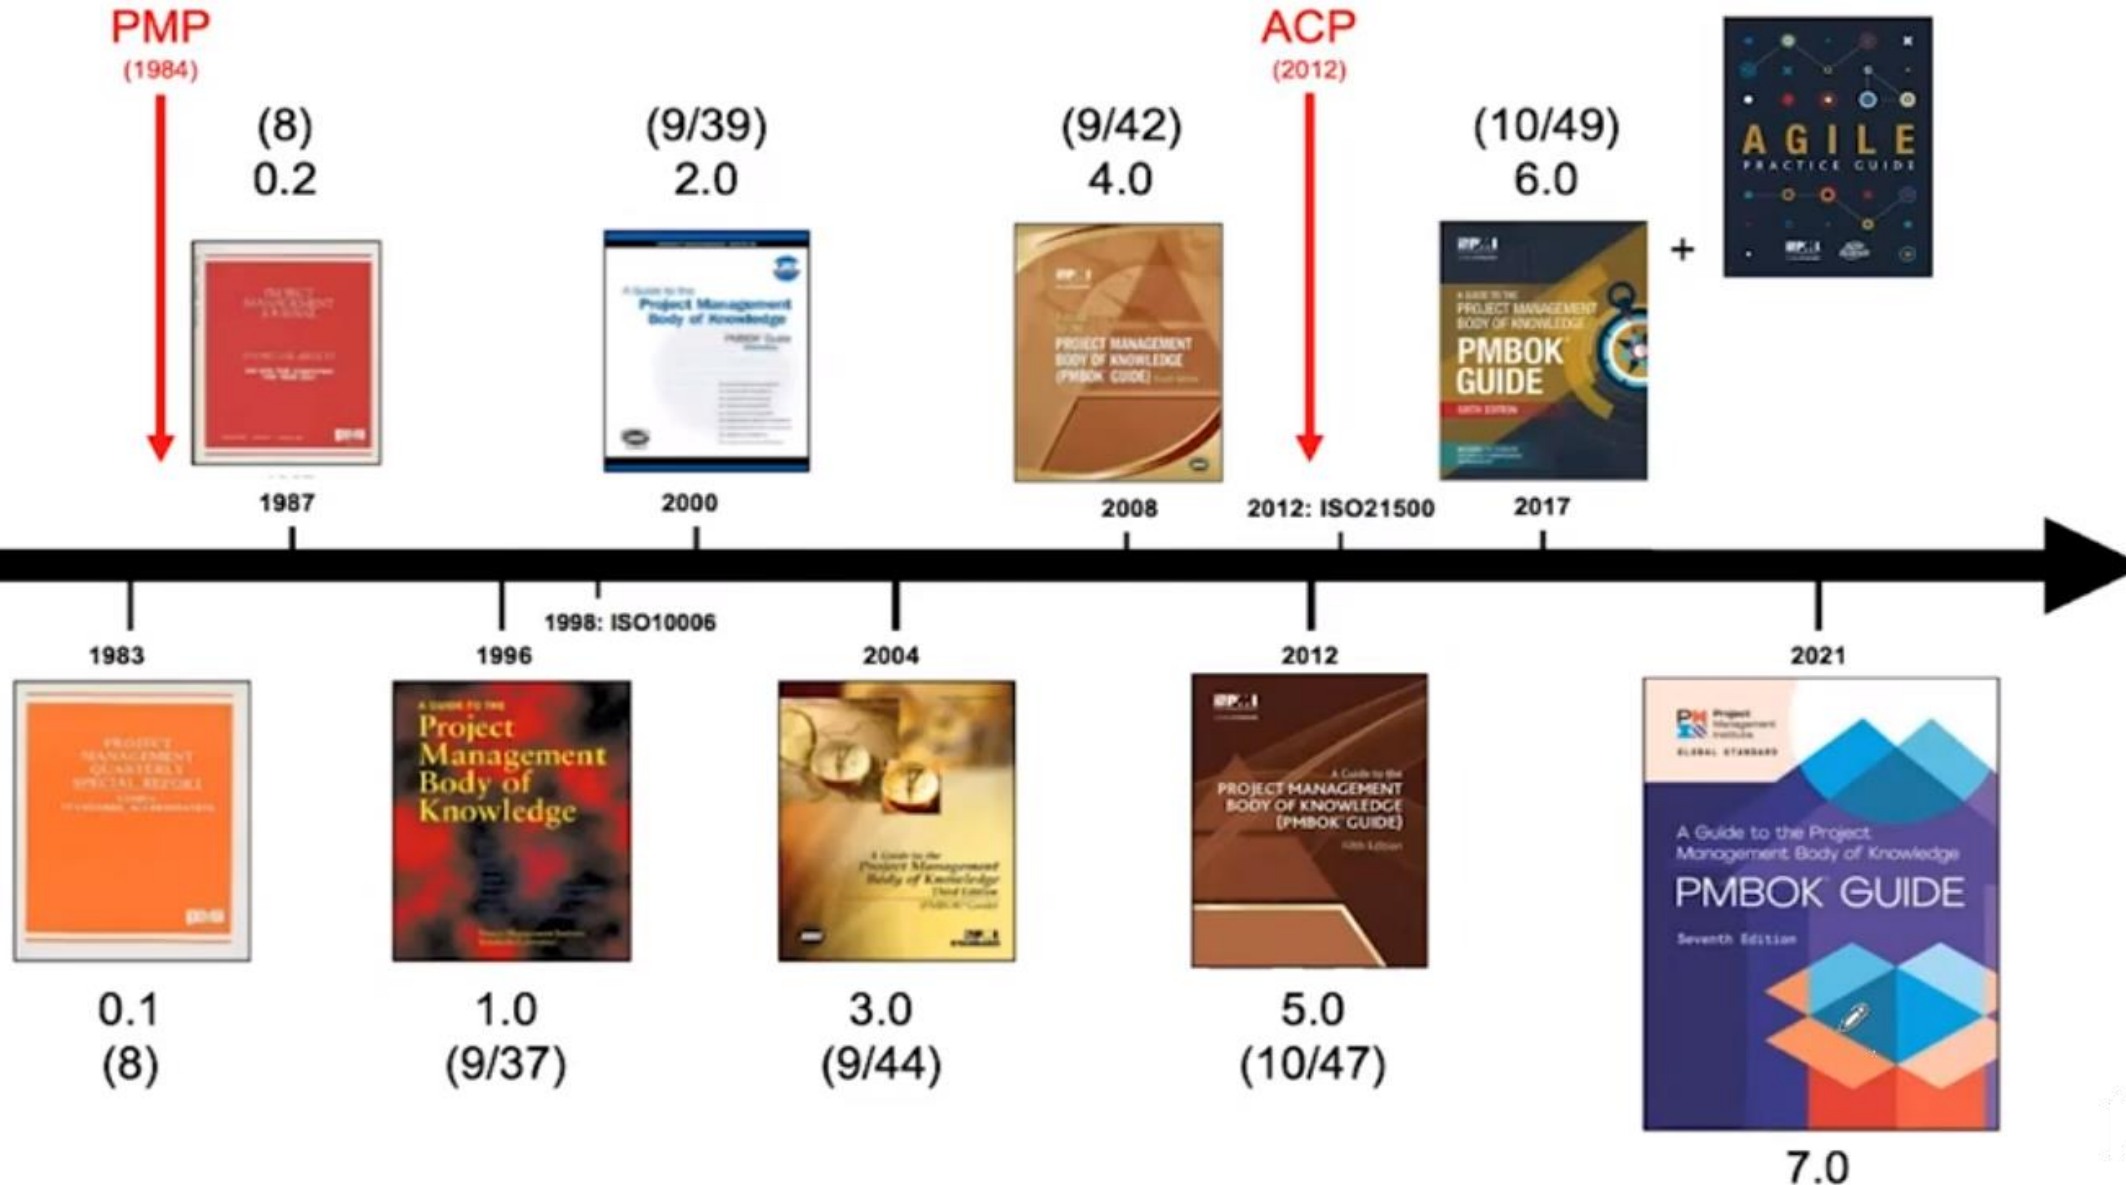

- De 47 à 49 processus (3 ajoutés, 7 renommés, 1 enlevé, 1 déplacé)
- 2 domaines de connaissance renommés
- Agilité pris en compte
- PMBOK 6^{ème} édition divisé en 2 documents distincts

De la 6^{ème} à la 7^{ème} édition du PMBOK

De 1996 à 2020, PMBOK se concentrait sur les **techniques de gestion prédictive des projets** ; Hors les chefs de projet utilisent des approches :

- prédictives (en cascade - waterfall);
- Agiles;
- Hybrides;

En effet dans plusieurs domaines d'affaires, les **cycles de vie des produits sont tellement courts** et les **exigences tellement changeantes** qu'avec le prédictif, les équipes finissent par livrer certes mais des **produits désuets ou obsolètes**;

D'où l'évolution de la concentration sur les livrables à celle sur les résultats du projet : **LA VALEUR**. Les projets ne produisent plus juste des livrables et des produits mais plutôt des résultats qui apportent de la valeur à l'organisation et ses parties prenantes ;

D'où l'évolution de Domaines de Connaissance à **Domaines de Performances** ; D'où l'évolution de l'approche basée sur processus à l'approche basée sur **les principes** ;

D'où l'apparition des **Modèles, Méthodes et des Objets** Réutilisables notamment sur la plateforme de contenu numérique interactif **Standards Plus**. Elle va démarrer avec les EOTS (Entrées, outils, techniques et sorties) de la V6 puis évoluer ;

D'où l'évolution de la gestion de projet à la **livraison de projet** ; D'où l'évolution du PMBOK de 500 pages à 250 pages.


Les 10 Domaines de Management de Projet

Le référentiel se base sur 10 domaines de management dans la gestion de projets :


- ☐ du contenu (périmètre)
- ☐ des délais
- ☐ des coûts
- ☐ de la qualité
- ☐ des ressources
- ☐ des communications
- ☐ des risques
- ☐ des approvisionnements
- ☐ des parties prenantes (« stakeholders »)
ajoutée dans la 5e édition du PMBOK
- ☐ de l'intégration



Les 5 Étapes ou Groupes de Processus en Management de Projet

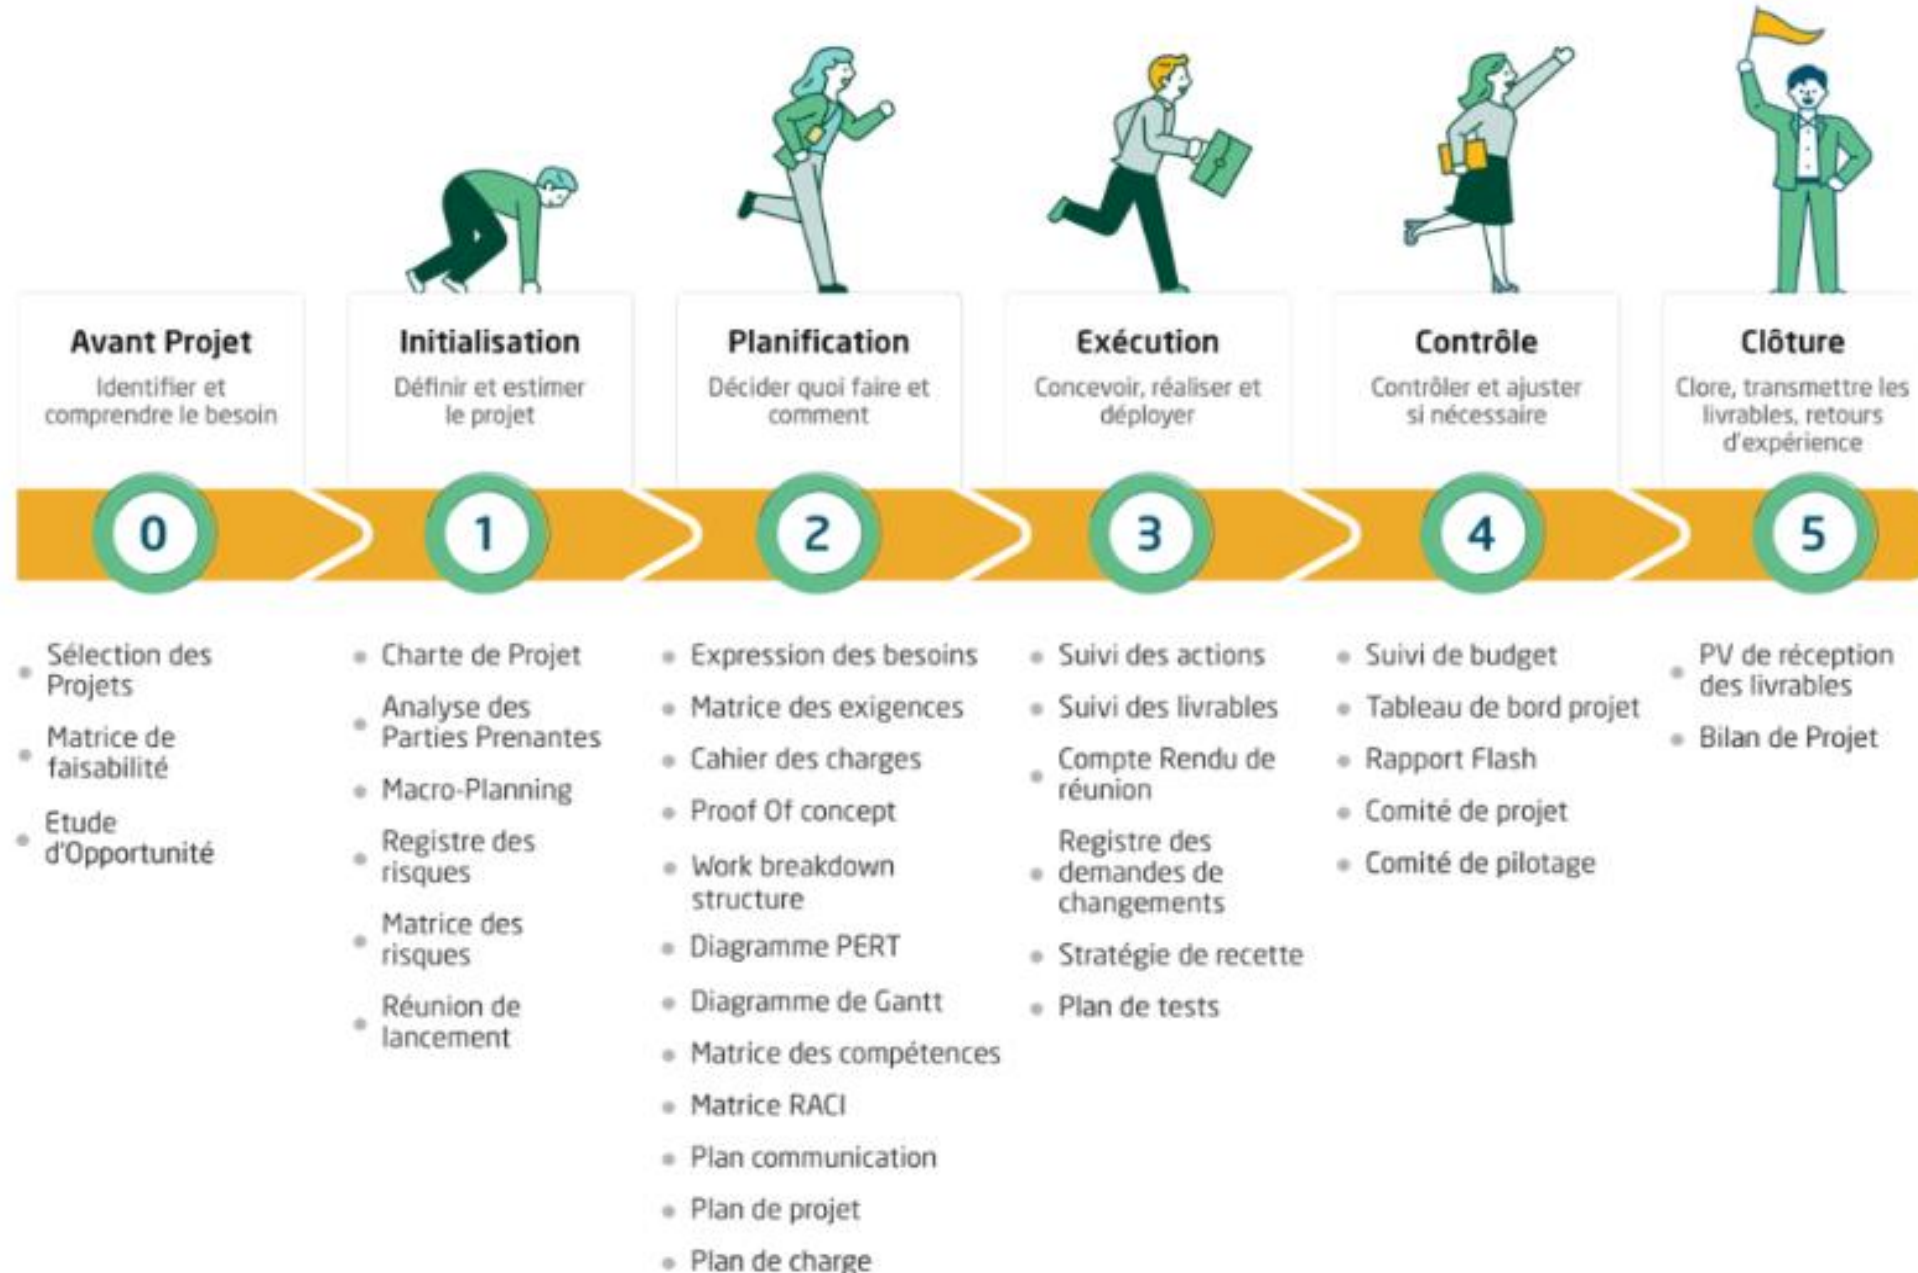

De la 6^{ème} à la 7^{ème} édition du PMBOK

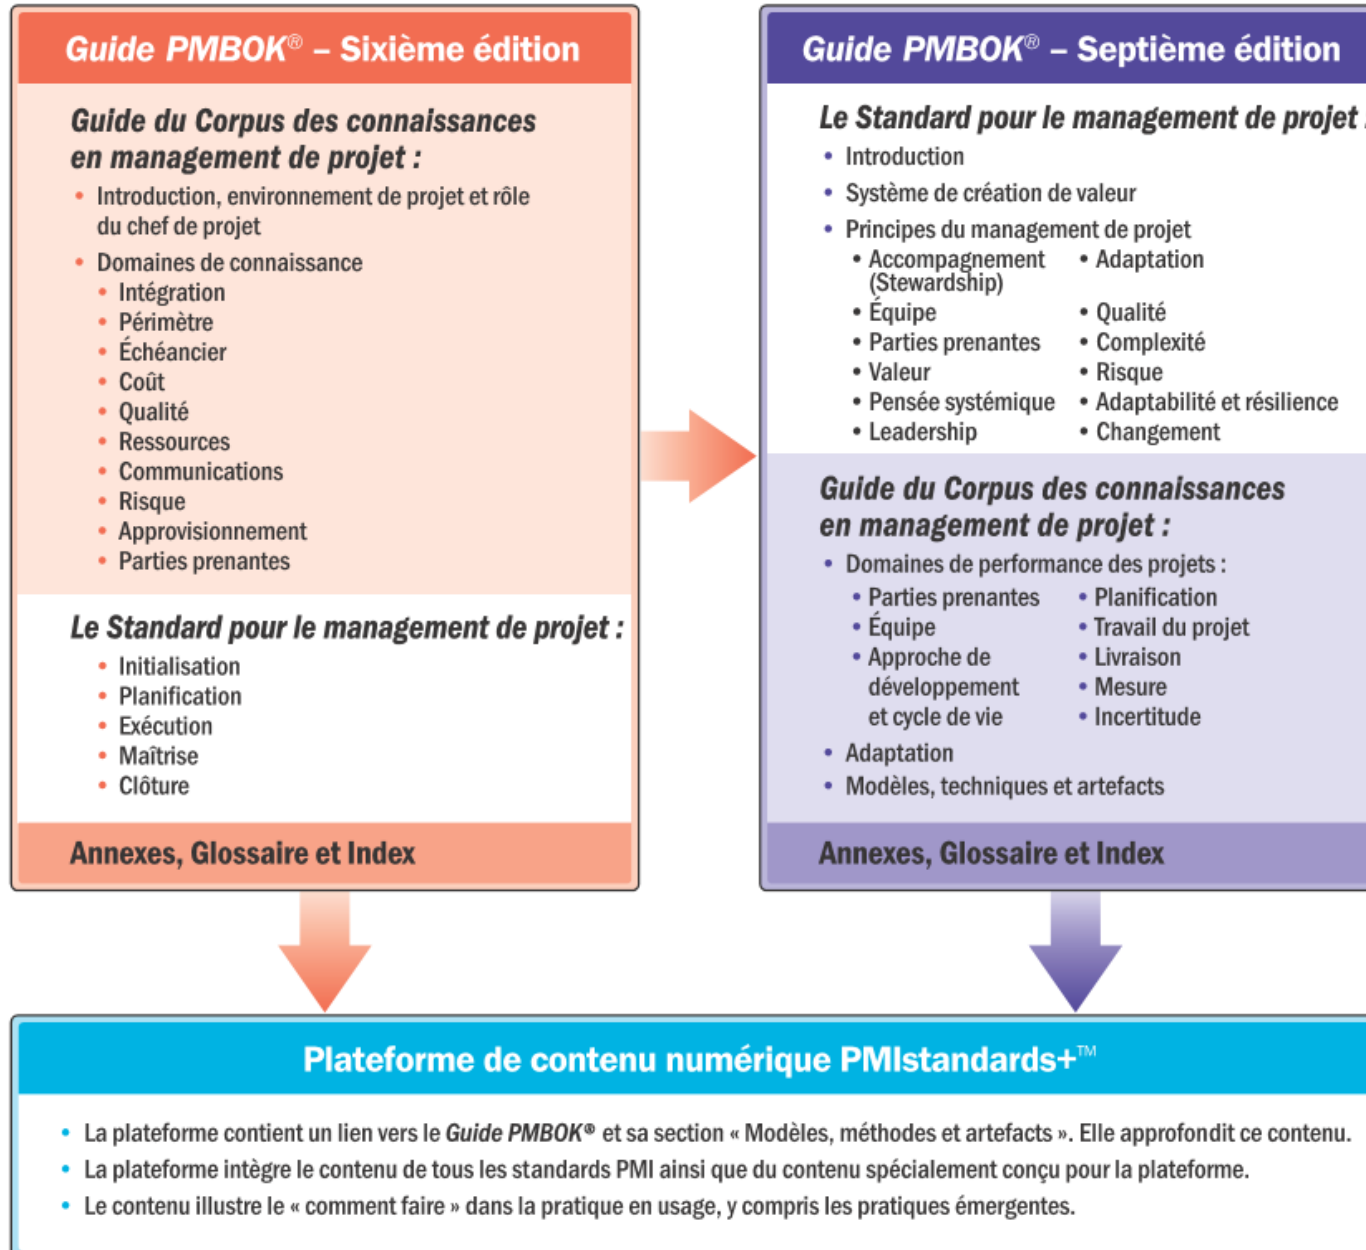


De la 6^{ème} à la 7^{ème} édition du PMBOK

PMBok 6	PMBok 7
10 Domaines de connaissances	8 Domaines de performance
1 Intégration	1- Parties prenantes (DC)
2 Périmètre	2- Équipe (DC)
3 Délai	3- Approche de développement et Cycle de vie
4 Coût	4- Planification (GP)
5 Qualité	5- Travaux du projet (DC)
6 Ressources	6- Mesures (GP+DC)
7 Communications	7- Livraison (GP)
8 Risque	8- Incertitude (DC)
9 Approvisionnement	
10 Parties prenantes	

De la 6^{ème} à la 7^{ème} édition du PMBOK

PMBok 6	PMBok 7
Les 5 groupes de processus	Les 12 principes de gestion de projet
1. Initialisation	1. Gestionnaire Accompagnateur : Être un gestionnaire diligent, respectueux & attentionné
2. Planification	2. Équipe : Créer un environnement collaboratif et inspirant pour l'équipe projet (DC)
3. Exécution	3. Parties prenantes : Impliquer les parties prenantes de manière efficace (DC)
4. Maîtrise	4. Valeur : Se concentrer sur la valeur
5. Clôture	5. Pensée holistique : Reconnaître, évaluer et répondre aux interactions des systèmes
	6. Leadership : Manifester des comportements de leader (motiver, influencer, coacher,...)
	7. Sur-mesure : S'adapter en fonction du contexte
	8. Qualité : Garantir la qualité des processus et des livrables (DC)
	9. Complexité : Se frayer un chemin dans la complexité
	10. Risques : Optimiser les réponses aux risques (DC)
	11. Adaptabilité et résilience : Accepter l'adaptabilité et la résilience
	12. Conduite de changement : Favoriser le changement pour atteindre l'état futur envisagé

Les Principes et les Domaines de Performance

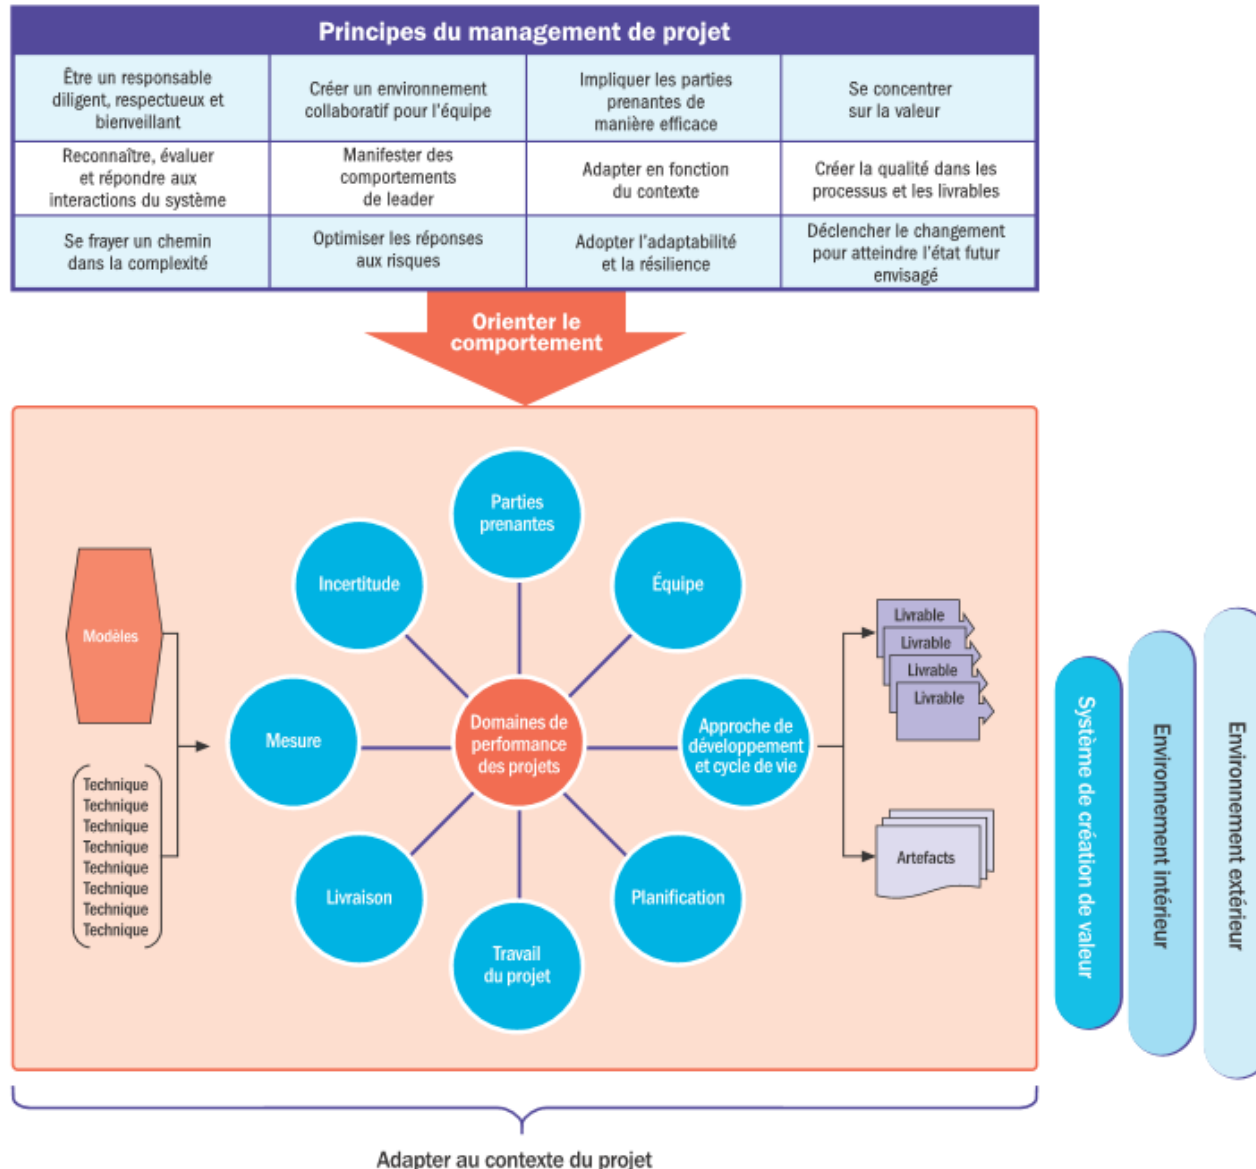

L'aube d'une nouvelle ère...

- On passe des **groupes de processus** aux **principes**
- On passe des **domaines de connaissances** aux **domaines de performance**
- On enlève les **entrées # outils & techniques # sorties**
- On met l'emphasis davantage sur les **résultats** que sur les **livrables**
- On ajoute une section sur le **sur-mesure (Tailoring)**
- On passe de **projets** au **produit**

Cadre de Gestion de Projet Prédictif et Agile

3'03
4'20

Le Cadre de Référence du PMBOK

Domaines de connaissance	Groupes de processus de management de projet				
	Groupe de processus d'initialisation	Groupe de processus de planification	Groupe de processus d'exécution	Groupe de processus de maîtrise	Groupe de processus de clôture
4. Gestion de l'intégration du projet	4.1 Élaborer la charte du projet	4.2 Élaborer le plan de management du projet	4.3 Diriger et gérer le travail du projet 4.4 Gérer les connaissances du projet	4.5 Maîtriser le projet 4.6 Maîtriser les changements	4.7 Clore le projet ou la phase
5. Gestion du périmètre du projet		5.1 Planifier la gestion du périmètre et du contenu 5.2 Recueillir les exigences 5.3 Définir le périmètre 5.4 Créer le WBS		5.5 Valider le périmètre 5.6 Maîtriser le périmètre et le contenu	
6. Gestion de l'échéancier du projet		6.1 Planifier la gestion de l'échéancier 6.2 Définir les activités 6.3 Organiser les activités en séquence 6.4 Estimer la durée des activités 6.5 Élaborer l'échéancier		6.6 Maîtriser l'échéancier	
7. Gestion des coûts du projet		7.1 Planifier la gestion des coûts 7.2 Estimer les coûts 7.3 Déterminer le budget		7.4 Maîtriser les coûts	

Le Cadre de Référence du PMBOK

8. Gestion de la qualité du projet		8.1 Planifier la gestion de la qualité	8.2 Gérer la qualité	8.3 Maîtriser la qualité	
9. Gestion des ressources du projet		9.1 Planifier la gestion des ressources 9.2 Estimer les ressources nécessaires aux activités	9.3 Obtenir les ressources 9.4 Développer l'équipe 9.5 Gérer l'équipe	9.6 Maîtriser les ressources	
10. Gestion des communications du projet		10.1 Planifier la gestion des communications	10.2 Gérer les communications	10.3 Maîtriser les communications	
11. Gestion des risques du projet		11.1 Planifier la gestion des risques 11.2 Identifier les risques 11.3 Mettre en œuvre l'analyse qualitative des risques 11.4 Mettre en œuvre l'analyse quantitative des risques 11.5 Planifier les réponses aux risques	11.6 Appliquer les réponses aux risques	11.7 Maîtriser les risques	
12. Gestion des approvisionnements du projet		12.1 Planifier la gestion des approvisionnements	12.2 Procéder aux approvisionnements	12.3 Maîtriser les approvisionnements	
13. Gestion des parties prenantes du projet	13.1 Identifier les parties prenantes	13.2 Planifier l'engagement des parties prenantes	13.3 Gérer l'engagement des parties prenantes	13.4 Maîtriser l'engagement des parties prenantes	

Le Cadre de Référence du PMBOK

4.1 INTÉGRATION Élaborer la charte du projet DONNÉES D'ENTRÉE 1. Documents business 2. Accords 3. Facteurs environnementaux de l'organisation 4. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Collecte des données 3. Compétences interpersonnelles et d'équipe 4. Réunions DONNÉES DE SORTIE 1. Élaborer la charte du projet 2. Journal des hypothèses	13.1 PARTIES PRENANTES Identifier les parties prenantes DONNÉES D'ENTRÉE 1. Élaborer la charte du projet 2. Documents business 3. Élaborer le plan de management du projet 4. Documents du projet 5. Accords 6. Facteurs environnementaux de l'organisation 7. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Collecte des données 3. Analyse des données 4. Représentation des données 5. Réunions DONNÉES DE SORTIE 1. Registre des parties prenantes 2. Demandes de changement 3. Mises à jour du plan de management du projet 4. Mises à jour des documents du projet	4.2 INTÉGRATION Élaborer le plan de management du projet DONNÉES D'ENTRÉE 1. Élaborer la charte du projet 2. Données de sortie d'autres processus 3. Facteurs environnementaux de l'organisation 4. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Collecte des données 3. Compétences interpersonnelles et d'équipe 4. Réunions DONNÉES DE SORTIE 1. Élaborer le plan de management du projet	5.1 PÉRIMÈTRE Planifier la gestion du périmètre DONNÉES D'ENTRÉE 1. Élaborer la charte du projet 2. Élaborer le plan de management du projet 3. Facteurs environnementaux de l'organisation 4. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Analyse des données 3. Réunions DONNÉES DE SORTIE 1. Plan de gestion du périmètre et du contenu 2. Plan de gestion des exigences	6.1 ÉCHÉANCIER Planifier la gestion de l'échéancier DONNÉES D'ENTRÉE 1. Charte du projet 2. Plan de management du projet 3. Facteurs environnementaux de l'organisation 4. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Analyse des données 3. Réunions DONNÉES DE SORTIE 1. Plan de gestion de l'échéancier	9.1 RESSOURCES Planifier la gestion des ressources DONNÉES D'ENTRÉE 1. Charte du projet 2. Plan de management du projet 3. Documents du projet 4. Facteurs environnementaux de l'organisation 5. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Représentation des données 3. Systèmes de l'organisation 4. Réunions DONNÉES DE SORTIE 1. Plan de gestion des ressources 2. Charte d'équipe 3. Mises à jour des documents du projet
7.1 COÛTS Planifier la gestion des coûts DONNÉES D'ENTRÉE 1. Charte du projet 2. Plan de management du projet 3. Facteurs environnementaux de l'organisation 4. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Analyse des données 3. Réunions DONNÉES DE SORTIE 1. Plan de gestion des coûts	11.1 RISQUES Planifier la gestion des risques DONNÉES D'ENTRÉE 1. Élaborer la charte du projet 2. Élaborer le plan de management du projet 3. Documents du projet 4. Facteurs environnementaux de l'organisation 5. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Analyse des données 3. Réunions DONNÉES DE SORTIE 1. Plan de gestion des risques	8.1 QUALITÉ Planifier la gestion de la qualité DONNÉES D'ENTRÉE 1. Charte du projet 2. Plan de management du projet 3. Documents du projet 4. Facteurs environnementaux de l'organisation 5. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Collecte des données 3. Analyse des données 4. Prise de décision 5. Représentation des données 6. Planification des tests et des inspections 7. Réunions DONNÉES DE SORTIE 1. Plan de gestion de la qualité 2. Métriques qualité 3. Mises à jour du plan de management du projet 4. Mises à jour des documents du projet	10.1 COMMUNICATIONS Planifier la gestion des communications DONNÉES D'ENTRÉE 1. Élaborer la charte du projet 2. Élaborer le plan de management du projet 3. Documents du projet 4. Facteurs environnementaux de l'organisation 5. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Analyse des exigences en communication 3. Technologie de communication 4. Modèles de communication 5. Méthodes de communication 6. Compétences interpersonnelles et d'équipe 7. Représentation des données 8. Réunions DONNÉES DE SORTIE 1. Plan de gestion de la communication 2. Mises à jour du plan de management du projet 3. Mis à jour des documents du projet	12.1 APPROVISIONNEMENTS Planifier la gestion des approvisionnements DONNÉES D'ENTRÉE 1. Élaborer la charte du projet 2. Documents business 3. Élaborer le plan de management du projet 4. Documents du projet 5. Facteurs environnementaux de l'organisation 6. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Collecte des données 3. Analyse des données 4. Analyse de la sélection des sources 5. Réunions DONNÉES DE SORTIE 1. Plan de gestion des approvisionnements 2. Stratégie d'approvisionnement 3. Documents d'appel d'offres 4. Énoncé des travaux d'approvisionnement 5. Critères de sélection des sources 6. Décisions « make-or-buy » 7. Estimations indépendantes des coûts 8. Demandes de changement 9. Mises à jour des documents du projet 10. Mises à jour des actifs organisationnels	13.2 PARTIES PRENANTES Planifier l'engagement des parties prenantes DONNÉES D'ENTRÉE 1. Élaborer la charte du projet 2. Élaborer le plan de management du projet 3. Documents du projet 4. Accords 5. Facteurs environnementaux de l'organisation 6. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Collecte des données 3. Analyse des données 4. Prise de décision 5. Représentation des données 6. Réunions DONNÉES DE SORTIE 1. Plan d'engagement des parties prenantes

Le Cadre de Référence du PMBOK

5.2 PÉRIMÈTRE Recueillir les exigences DONNÉES D'ENTRÉE 1. Élaborer la charte du projet 2. Élaborer le plan de management du projet 3. Documents du projet 4. Documents business 5. Accords 6. Facteurs environnementaux de l'organisation 7. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Collecte des données 3. Analyse des données 4. Prise de décision 5. Représentation des données 6. Compétences interpersonnelles et d'équipe 7. Schéma contextuel 8. Prototypes DONNÉES DE SORTIE 1. Documentation des exigences 2. Matrice de traçabilité des exigences	5.3 PÉRIMÈTRE Définir le périmètre DONNÉES D'ENTRÉE 1. Élaborer la charte du projet 2. Élaborer le plan de management du projet 3. Documents du projet 4. Facteurs environnementaux de l'organisation 5. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Analyse des données 3. Prise de décision 4. Compétences interpersonnelles et d'équipe DONNÉES DE SORTIE 1. Énoncé du périmètre du projet 2. Mises à jour des documents du projet	5.4 PÉRIMÈTRE Créer le WBS DONNÉES D'ENTRÉE 1. Élaborer le plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Facteurs environnementaux de l'organisation 4. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Décomposition DONNÉES DE SORTIE 1. Référence de base du périmètre 2. Mises à jour des documents du projet	6.2 ÉCHÉANCIER Définir les activités DONNÉES D'ENTRÉE 1. Plan de management du projet 2. Facteurs environnementaux de l'organisation 3. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Décomposition 3. Planification en vagues 4. Réunions DONNÉES DE SORTIE 1. Liste d'activités 2. Attributs des activités 3. Liste des jalons 4. Demandes de changement 5. Mises à jour du plan de management du projet	6.3 ÉCHÉANCIER Organiser les activités en sequence DONNÉES D'ENTRÉE 1. Plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Facteurs environnementaux de l'organisation 4. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Méthode des antécédents 2. Détermination et intégration des dépendances 3. Avances et retards 4. Système d'information de gestion du projet (Project Management Information System, PMIS) DONNÉES DE SORTIE 1. Diagrammes de réseau du projet 2. Mises à jour des documents du projet	6.4 ÉCHÉANCIER Estimer la durée des activités DONNÉES D'ENTRÉE 1. Plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Facteurs environnementaux de l'organisation 4. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Estimation par analogie 3. Estimation paramétrique 4. Estimation à trois points 5. Estimation ascendante 6. Analyse des données 7. Prise de décision 8. Réunions DONNÉES DE SORTIE 1. Estimations de durées 2. Base des estimations 3. Mises à jour des documents du projet
		6.5 ÉCHÉANCIER Élaborer l'échéancier DONNÉES D'ENTRÉE 1. Plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Accords 4. Facteurs environnementaux de l'organisation 5. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Analyse du diagramme de réseau 2. Méthode du chemin critique 3. Optimisation des ressources 4. Analyse des données 5. Avances et retards 6. Compression de l'échéancier 7. Système d'information de gestion du projet (Project Management Information System, PMIS) 8. Planification des releases agile DONNÉES DE SORTIE 1. Référence de base de l'échéancier 2. Échéancier du projet 3. Données de l'échéancier 4. Calendriers du projet 5. Demandes de changement 6. Mises à jour du plan de management du projet 7. Mises à jour des documents du projet		9.2 RESSOURCES Estimer les ressources nécessaires aux activités DONNÉES D'ENTRÉE 1. Plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Facteurs environnementaux de l'organisation 4. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Estimation ascendante 3. Estimation par analogie 4. Estimation paramétrique 5. Analyse des données 6. Système d'information de gestion du projet (Project Management Information System, PMIS) 7. Réunions DONNÉES DE SORTIE 1. Besoins en ressources 2. Base des estimations 3. Organigramme des ressources 4. Mises à jour des documents du projet	

Le Cadre de Référence du PMBOK

7.2 COÛTS	7.3 COÛTS	11.2 RISQUES	11.3 RISQUES	11.4 RISQUES	11.5 RISQUES
Estimer les coûts	Déterminer le budget	Identifier les risques	Effectuer l'analyse qualitative des risques	Effectuer l'analyse quantitative des risques	Planifier les réponses aux risques
DONNÉES D'ENTRÉE 1. Plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Facteurs environnementaux de l'organisation 4. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Estimation par analogie 3. Estimation paramétrique 4. Estimation ascendante 5. Estimation à trois points 6. Analyse des données 7. Système d'information de gestion du projet (Project Management Information System, PMIS) 8. Prise de décision DONNÉES DE SORTIE 1. Estimations de coûts 2. Base des estimations 3. Mises à jour des documents du projet	DONNÉES D'ENTRÉE 1. Plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Documents business 4. Accords 5. Facteurs environnementaux de l'organisation 6. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Consolidation des coûts 3. Analyse des données 4. Revue des données historiques 5. Réconciliation des limites de financement 6. Financement DONNÉES DE SORTIE 1. Référence de base des coûts 2. Besoin en financement du projet 3. Mises à jour des documents du projet	DONNÉES D'ENTRÉE 1. Élaborer le plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Accords 4. Documents d'approvisionnements 5. Facteurs environnementaux de l'organisation 6. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Collecte des données 3. Analyse des données 4. Compétences interpersonnelles et d'équipe 5. Listes rapides 6. Réunions DONNÉES DE SORTIE 1. Registre des risques 2. Rapport sur les risques 3. Mises à jour des documents du projet	DONNÉES D'ENTRÉE 1. Élaborer le plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Facteurs environnementaux de l'organisation 4. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Collecte des données 3. Analyse des données 4. Compétences interpersonnelles et d'équipe 5. Catégorisation des risques 6. Représentation des données 7. Réunions DONNÉES DE SORTIE 1. Mises à jour des documents du projet	DONNÉES D'ENTRÉE 1. Élaborer le plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Facteurs environnementaux de l'organisation 4. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Collecte des données 3. Compétences interpersonnelles et d'équipe 4. Représentations de l'incertitude 5. Analyse des données DONNÉES DE SORTIE 1. Mises à jour des documents du projet	DONNÉES D'ENTRÉE 1. Élaborer le plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Facteurs environnementaux de l'organisation 4. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Collecte des données 3. Compétences interpersonnelles et d'équipe 4. Stratégies pour les menaces 5. Stratégies pour les opportunités 6. Stratégies de réponse conditionnelles 7. Stratégies pour le risque global du projet 8. Analyse des données 9. Prise de décision DONNÉES DE SORTIE 1. Demandes de changement 2. Mises à jour du plan de management du projet 3. Mises à jour des documents du projet

Le Cadre de Référence du PMBOK

4.3 INTÉGRATION	9.5 RESSOURCES	9.3 RESSOURCES	9.4 RESSOURCES	10.2 COMMUNICATIONS	12.2 APPROVISIONNEMENTS
Diriger et gérer le travail du projet	Gérer l'équipe	Obtenir les ressources	Développer l'équipe	Gérer les communications	Procéder aux approvisionnements
DONNÉES D'ENTRÉE 1. Élaborer le plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Demandes de changement approuvées 4. Facteurs environnementaux de l'organisation 5. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Système d'information de gestion du projet (Project Management Information System, PMIS) 3. Réunions DONNÉES DE SORTIE 1. Livrables 2. Données de performance d'exécution 3. Journal des points à traiter 4. Demandes de changement 5. Mises à jour du plan de management du projet 6. Mises à jour des documents du projet 7. Mises à jour des actifs organisationnels	DONNÉES D'ENTRÉE 1. Plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Rapports sur la performance d'exécution 4. Évaluations des performances de l'équipe 5. Facteurs environnementaux de l'organisation 6. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Compétences interpersonnelles et d'équipe 2. Système d'information de gestion du projet (Project Management Information System, PMIS) DONNÉES DE SORTIE 1. Demandes de changement 2. Mises à jour du plan de management du projet 3. Mises à jour des documents du projet 4. Mises à jour des facteurs environnementaux de l'organisation	DONNÉES D'ENTRÉE 1. Plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Facteurs environnementaux de l'organisation 4. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Prise de décision 2. Compétences interpersonnelles et d'équipe 3. Affectation préalable 4. Équipes virtuelles DONNÉES DE SORTIE 1. Affectations des ressources matérielles 2. Affectations des membres de l'équipe projet 3. Calendriers des ressources 4. Demandes de changement du projet 5. Mises à jour du plan de management du projet 6. Mises à jour des documents du projet 7. Mises à jour des facteurs environnementaux de l'organisation 8. Mises à jour des actifs organisationnels	DONNÉES D'ENTRÉE 1. Plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Facteurs environnementaux de l'organisation 4. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Colocalisation 2. Équipes virtuelles 3. Technologie de communication 4. Compétences interpersonnelles et d'équipe 5. Reconnaissance et récompenses 6. Formation 7. Évaluations des personnes et de l'équipe 8. Réunions DONNÉES DE SORTIE 1. Évaluations des performances de l'équipe 2. Demandes de changement 3. Mises à jour du plan de management du projet 4. Mises à jour des documents du projet 5. Mises à jour des facteurs environnementaux de l'organisation 6. Mises à jour des actifs organisationnels	DONNÉES D'ENTRÉE 1. Élaborer le plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Rapports sur la performance d'exécution 4. Facteurs environnementaux de l'organisation 5. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Technologie de communication 2. Méthodes de communication 3. Compétences en communication 4. Système d'information de gestion du projet (Project Management Information System, PMIS) 5. Établissement des rapports du projet 6. Compétences interpersonnelles et d'équipe 7. Réunions DONNÉES DE SORTIE 1. Communications du projet 2. Mises à jour du plan de management du projet 3. Mises à jour des documents du projet 4. Mises à jour des actifs organisationnels	DONNÉES D'ENTRÉE 1. Élaborer le plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Documents d'approvisionnements 4. Propositions des fournisseurs 5. Facteurs environnementaux de l'organisation 6. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Publicité 3. Conférences des soumissionnaires 4. Analyse des données 5. Compétences interpersonnelles et d'équipe DONNÉES DE SORTIE 1. Vendeurs sélectionnés 2. Accords 3. Demandes de changement 4. Mises à jour du plan de management du projet 5. Mises à jour des documents du projet 6. Mises à jour des actifs organisationnels

Le Cadre de Référence du PMBOK

4.4 INTÉGRATION Gérer les connaissances du projet DONNÉES D'ENTRÉE 1. Élaborer le plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Livrables 4. Facteurs environnementaux de l'organisation 5. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Gestion des connaissances 3. Gestion de l'information 4. Compétences interpersonnelles et d'équipe DONNÉES DE SORTIE 1. Registre des retours d'expérience 2. Mises à jour du plan de management du projet 3. Mises à jour des actifs organisationnels	8.2 QUALITÉ Gérer la qualité DONNÉES D'ENTRÉE 1. Plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Collecte des données 2. Analyse des données 3. Prise de décision 4. Représentation des données 5. Audits 6. Design for X 7. Résolution de problèmes 8. Méthodes d'amélioration de la qualité DONNÉES DE SORTIE 1. Rapport de qualité 2. Documents d'évaluation et de test 3. Demandes de changement 4. Mises à jour du plan de management du projet 5. Mises à jour des documents du projet	11.6 RISQUES Appliquer les réponses aux risques DONNÉES D'ENTRÉE 1. Élaborer le plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Compétences interpersonnelles et d'équipe 3. Système d'information de gestion du projet (Project Management Information System, PMIS) DONNÉES DE SORTIE 1. Demandes de changement 2. Mises à jour des documents du projet	13.3 PARTIES PRENANTES Gérer l'engagement des parties prenantes DONNÉES D'ENTRÉE 1. Élaborer le plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Facteurs environnementaux de l'organisation 4. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Compétences en communication 3. Compétences interpersonnelles et d'équipe 4. Règles de base 5. Réunions DONNÉES DE SORTIE 1. Demandes de changement 2. Mises à jour du plan de management du projet 3. Mises à jour des documents du projet	5.5 PÉRIMÈTRE Valider le périmètre DONNÉES D'ENTRÉE 1. Élaborer le plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Livrables acceptés 4. Données de performance d'exécution OUTILS ET TECHNIQUES 1. Inspection 2. Prise de décision DONNÉES DE SORTIE 1. Livrables acceptés 2. Information sur la performance d'exécution 3. Demandes de changement 4. Mises à jour des documents du projet
---	--	---	--	---

Le Cadre de Référence du PMBOK


4.5 INTÉGRATION	5.6 PÉRIMÈTRE	6.6 ÉCHÉANCIER	7.4 COÛTS	4.6 INTÉGRATION	9.6 RESSOURCES
Maîtriser le travail du projet	Maîtriser le périmètre	Maîtriser l'échéancier	Maîtriser les coûts	Maîtriser les changements	Maîtriser les ressources
DONNÉES D'ENTRÉE 1. Élaborer le plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Information sur la performance d'exécution 4. Accords 5. Facteurs environnementaux de l'organisation 6. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Analyse des données 3. Prise de décision 4. Réunions DONNÉES DE SORTIE 1. Rapports sur la performance d'exécution 2. Demandes de changement 3. Mises à jour du plan de management du projet 4. Mises à jour des documents du projet	DONNÉES D'ENTRÉE 1. Élaborer le plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Données de performance d'exécution 4. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Analyse des données DONNÉES DE SORTIE 1. Information sur la performance d'exécution 2. Demandes de changement 3. Mises à jour du plan de management du projet 4. Mises à jour des documents du projet	DONNÉES D'ENTRÉE 1. Plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Données de performance d'exécution 4. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Analyse des données 2. Méthode du chemin critique 3. Système d'information de gestion du projet (Project Management Information System, PMIS) 4. Optimisation des ressources 5. Avances et retards 6. Compression de l'échéancier DONNÉES DE SORTIE 1. Information sur la performance d'exécution 2. Prévisions de l'échéancier 3. Demandes de changement 4. Mises à jour du plan de management du projet 5. Mises à jour des documents du projet	DONNÉES D'ENTRÉE 1. Plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Besoins de financement du projet 4. Données de performance d'exécution 5. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Analyse des données 3. Indice de performance à terminaison du projet 4. Système d'information de gestion du projet DONNÉES DE SORTIE 1. Information sur la performance d'exécution 2. Prévisions de coûts 3. Demandes de changement 4. Mises à jour du plan de management du projet 5. Mises à jour des documents du projet	DONNÉES D'ENTRÉE 1. Élaborer le plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Rapports sur la performance d'exécution 4. Demandes de changement 5. Facteurs environnementaux de l'organisation 6. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Outils de gestion des changements 3. Analyse des données 4. Prise de décision 5. Réunions DONNÉES DE SORTIE 1. Demandes de changement approuvées 2. Mises à jour du plan de management du projet 3. Mises à jour des documents du projet	DONNÉES D'ENTRÉE 1. Plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Données de performance d'exécution 4. Accords 5. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Analyse des données 2. Résolution de problèmes 3. Compétences interpersonnelles et d'équipe 4. Système d'information de gestion du projet (Project Management Information System, PMIS) DONNÉES DE SORTIE 1. Information sur la performance d'exécution 2. Demandes de changement 3. Mises à jour du plan de management du projet 4. Mises à jour des documents du projet

Le Cadre de Référence du PMBOK


8.3 QUALITÉ Maîtriser la qualité DONNÉES D'ENTRÉE 1. Plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Demandes de changement approuvées 4. Livrables 5. Données de performance d'exécution 6. Facteurs environnementaux de l'organisation 7. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Collecte des données 2. Analyse des données 3. Inspection 4. Tests/évaluations du produit 5. Représentation des données 6. Réunions DONNÉES DE SORTIE 1. Mesures de contrôle de la qualité 2. Livrables vérifiés 3. Information sur la performance d'exécution 4. Demandes de changement 5. Mises à jour du plan de management du projet 6. Mises à jour des documents du projet	11.7 RISQUES Maîtriser les risques DONNÉES D'ENTRÉE 1. Élaborer le plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Données de performance d'exécution 4. Rapports sur la performance d'exécution OUTILS ET TECHNIQUES 1. Analyse des données 2. Audits 3. Réunions DONNÉES DE SORTIE 1. Information sur la performance d'exécution 2. Demandes de changement 3. Mises à jour du plan de management du projet 4. Mises à jour des documents du projet 5. Mises à jour des actifs organisationnels	10.3 COMMUNICATIONS Maîtriser les communications DONNÉES D'ENTRÉE 1. Élaborer le plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Données de performance d'exécution 4. Facteurs environnementaux de l'organisation 5. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Système d'information de gestion du projet (Project Management Information System, PMIS) 3. Représentation des données 4. Compétences interpersonnelles et d'équipe 5. Réunions DONNÉES DE SORTIE 1. Information sur la performance d'exécution 2. Demandes de changement 3. Mises à jour du plan de management du projet 4. Mises à jour des documents du projet	12.3 APPROVISIONNEMENTS Maîtriser les approvisionnements DONNÉES D'ENTRÉE 1. Élaborer le plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Accords 4. Documents d'approvisionnements 5. Demandes de changement approuvées 6. Données de performance d'exécution 7. Facteurs environnementaux de l'organisation 8. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Gestion des réclamations 3. Analyse des données 4. Inspection 5. Audits DONNÉES DE SORTIE 1. Approvisionnements clos 2. Information sur la performance d'exécution 3. Mises à jour des documents d'approvisionnements 4. Demandes de changement 5. Mises à jour du plan de management du projet 6. Mises à jour des documents du projet 7. Mises à jour des actifs organisationnels	13.4 PARTIES PRENANTES Maîtriser l'engagement des parties prenantes DONNÉES D'ENTRÉE 1. Élaborer le plan de management du projet 2. Documents du projet 3. Données de performance d'exécution 4. Facteurs environnementaux de l'organisation 5. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Analyse des données 2. Prise de décision 3. Représentation des données 4. Compétences en communication 5. Compétences interpersonnelles et d'équipe 6. Réunions DONNÉES DE SORTIE 1. Information sur la performance d'exécution 2. Demandes de changement 3. Mises à jour du plan de management du projet 4. Mises à jour des documents du projet	4.7 INTÉGRATION Clore le projet ou la phase DONNÉES D'ENTRÉE 1. Élaborer la charte du projet 2. Élaborer le plan de management du projet 3. Documents du projet 4. Livrables acceptés 5. Documents business 6. Accords 7. Documents d'approvisionnements 8. Actifs organisationnels OUTILS ET TECHNIQUES 1. Jugement à dire d'expert 2. Analyse des données 3. Réunions DONNÉES DE SORTIE 1. Mises à jour des documents du projet 2. Transfert du produit, du service ou du résultat final 3. Rapport final 4. Mises à jour des actifs organisationnels
--	---	--	--	--	--

La gestion de projet en une image

selon norme iso 21500 simplifiée

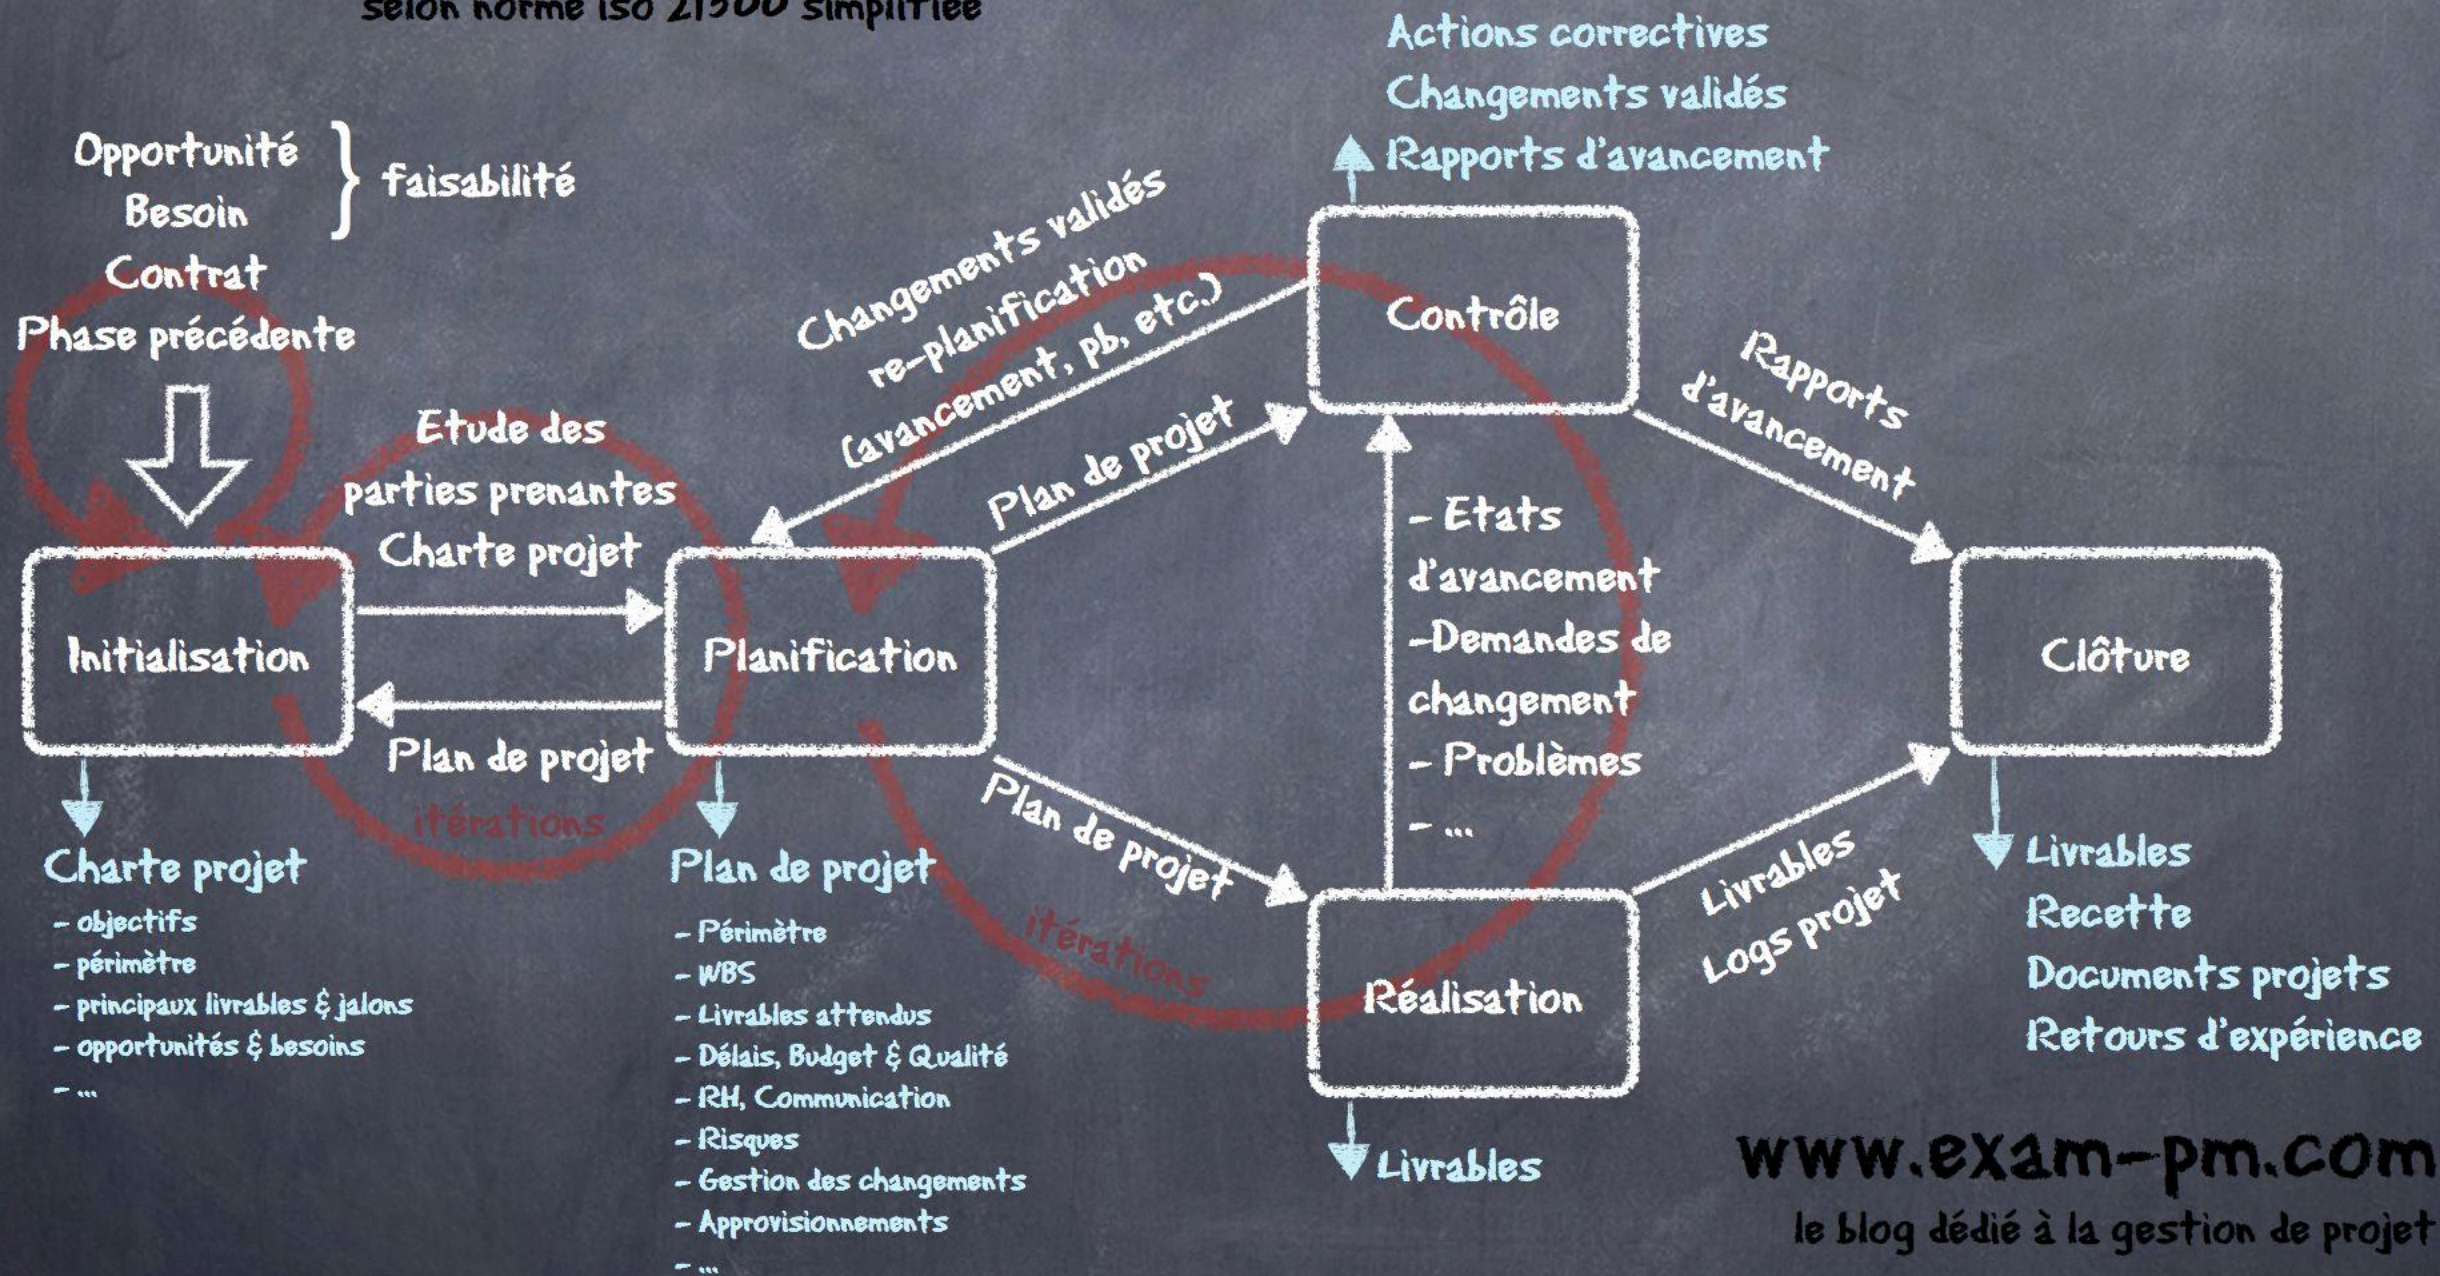

Sprint

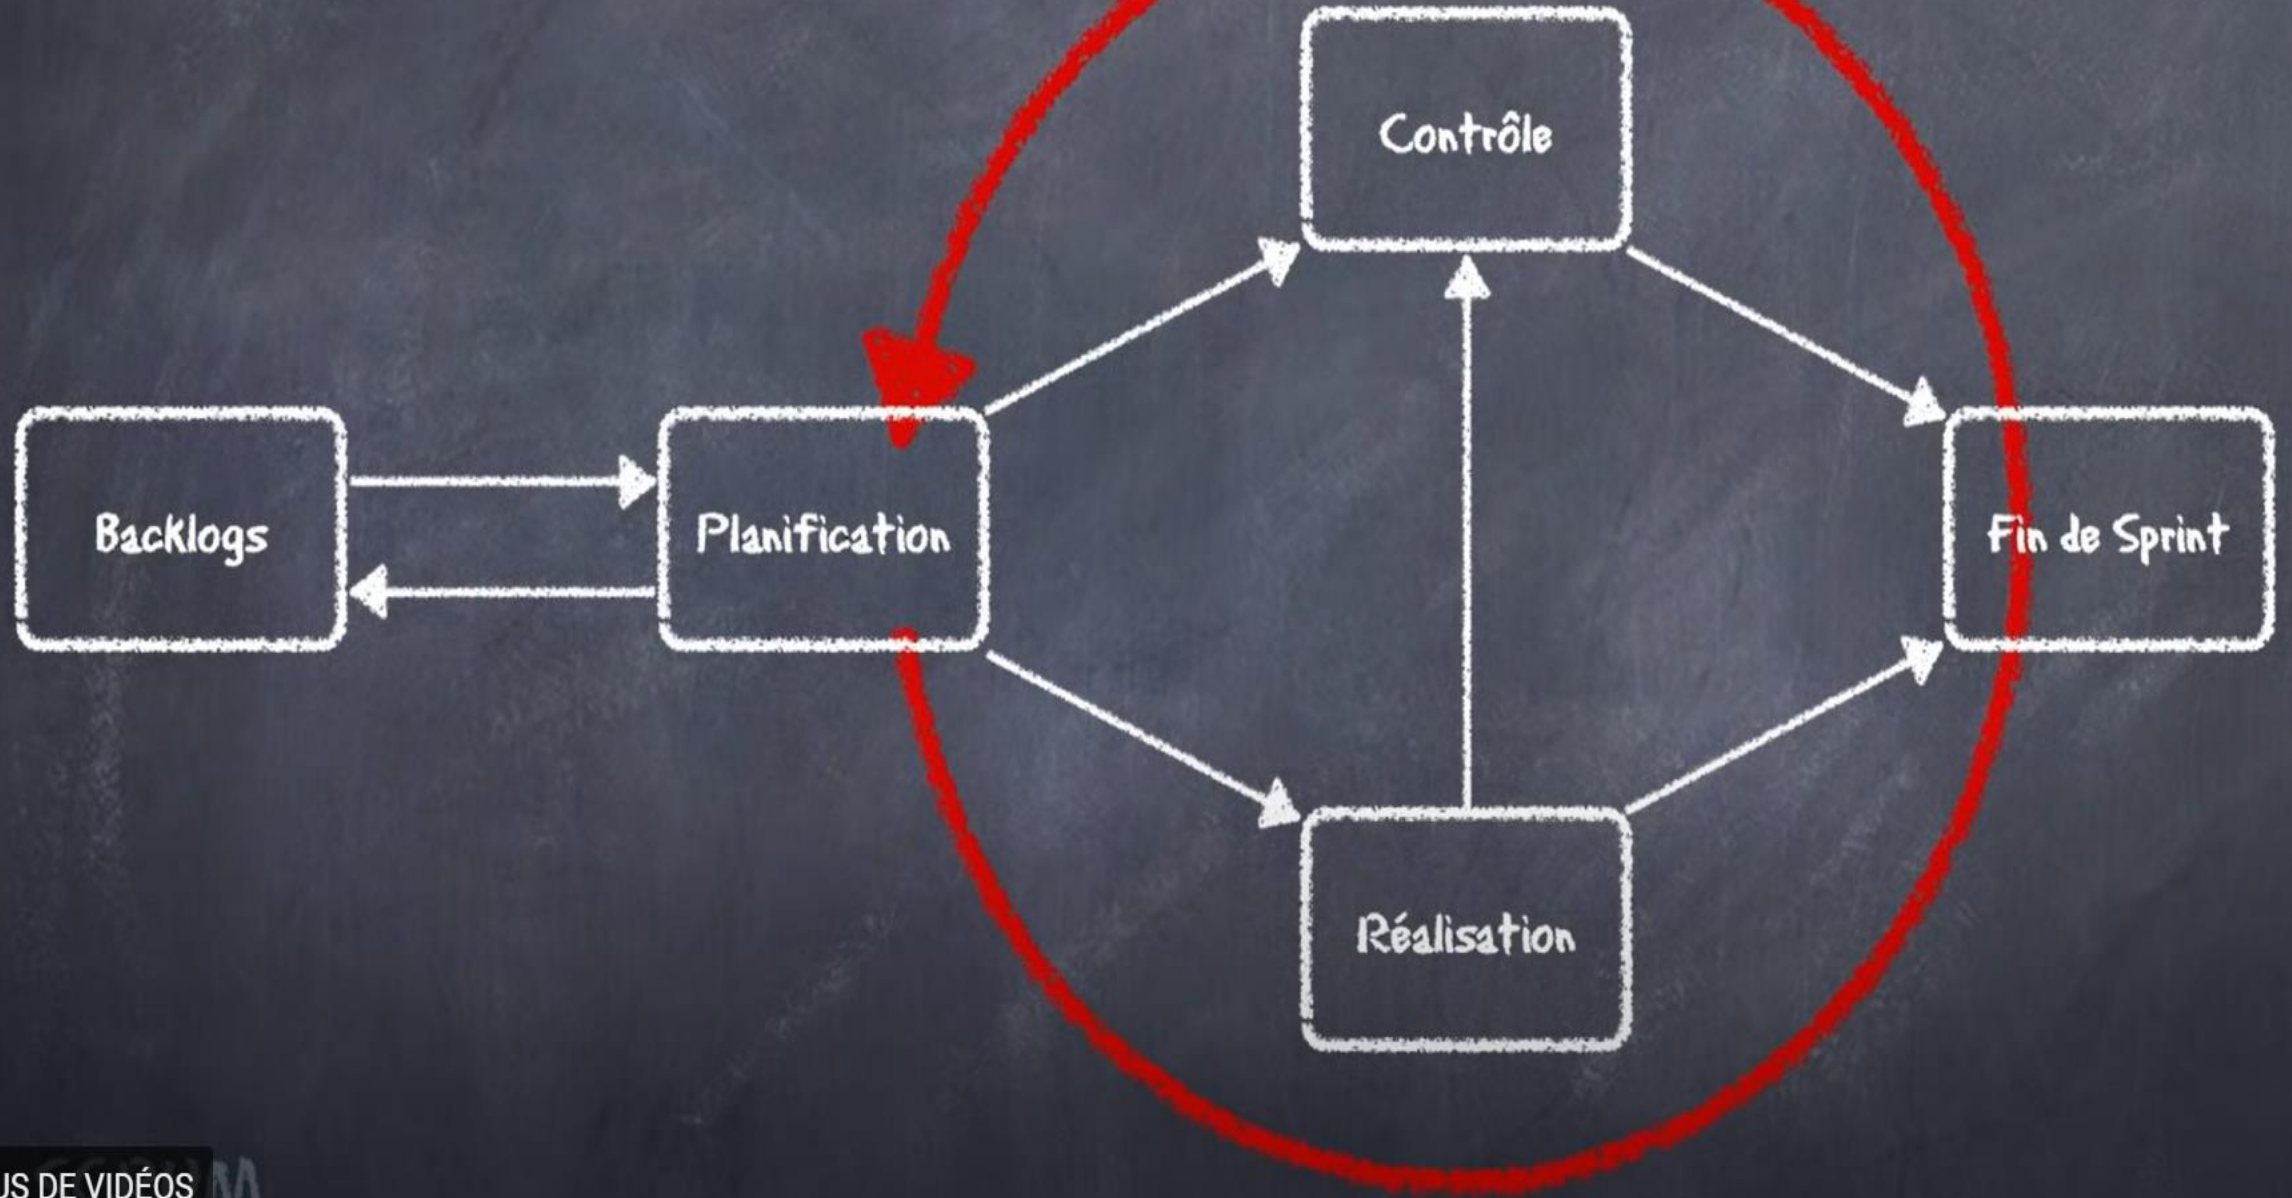


Le Manifeste Agile



1. Les individus et les interactions plutôt que les processus et les outils
2. Le Produit (Logiciel) fonctionnel plutôt que la documentation complète
3. La collaboration avec le client plutôt que la négociation du contrat
4. Réagir au changement plutôt que de suivre un plan

RUBRIQUE E : PMBOK VS D'AUTRES REFERENTIELS DE GESTION DE PROJET



Livrables et outils

Livrables	Outils
Référentiel SCRUM	Daily Scrum
Référentiel PRINCE 2	Sprint Review
	Sprint Retrospective
	Product Owner
	Scrum Master
	Product Backlog
	Sprint Backlog
	Increment

Les autres approches en management de projet: PRINCE2 (depuis 1996) → 7-7-7

Thèmes (7)

Business Case
Organisation
Quality
Plans
Risk
Change Progress

Principes (7)

Continued Business Justification
Learn From Experience
Defined Roles and Responsibilities
Manage by Stages
Manage by Exception
Focus on Products
Tailor to Suit Project Environment

Rôles

Project Board
Executive
Senior Supplier
Senior User
Project Manager
Team Manager
Project Assurance
Change Authority
Project Support

Événements

Plusieurs


Artéfacts

Baselines (12)
Records (6)
Reports (8)

Processus (7)

Starting Up A Project
Initiating A Project
Directing A Project
Controlling A Stage
Managing Product Delivery
Managing Stage Boundaries
Closing A Project

Cadre de référence

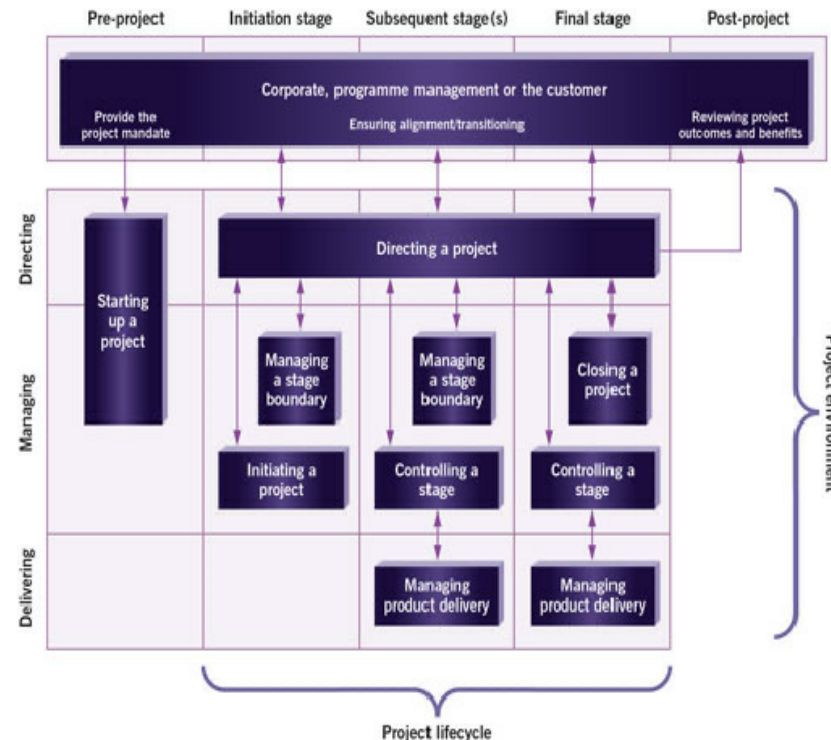


Les autres approches en management de projet: Scrum (depuis 1995)

Valeurs (5)



Piliers (3)




Rôles (3)



Événements (5)

Event	Inspection	Adaptation
Sprint Planning	• Product Backlog • (Commitments Retrospective) • (Definition of Done)	• Sprint Goal • Forecast • Sprint Backlog
Daily Scrum	• Progress toward Sprint Goal	• Sprint Backlog • Daily Plan
Sprint Review	• Product Increment • Product Backlog (Release) • Market-business conditions	• Product Backlog
Sprint Retrospective	• Team & collaboration • Technology & engineering • Definition of Done	• Actionable improvements

Artéfacts (3)

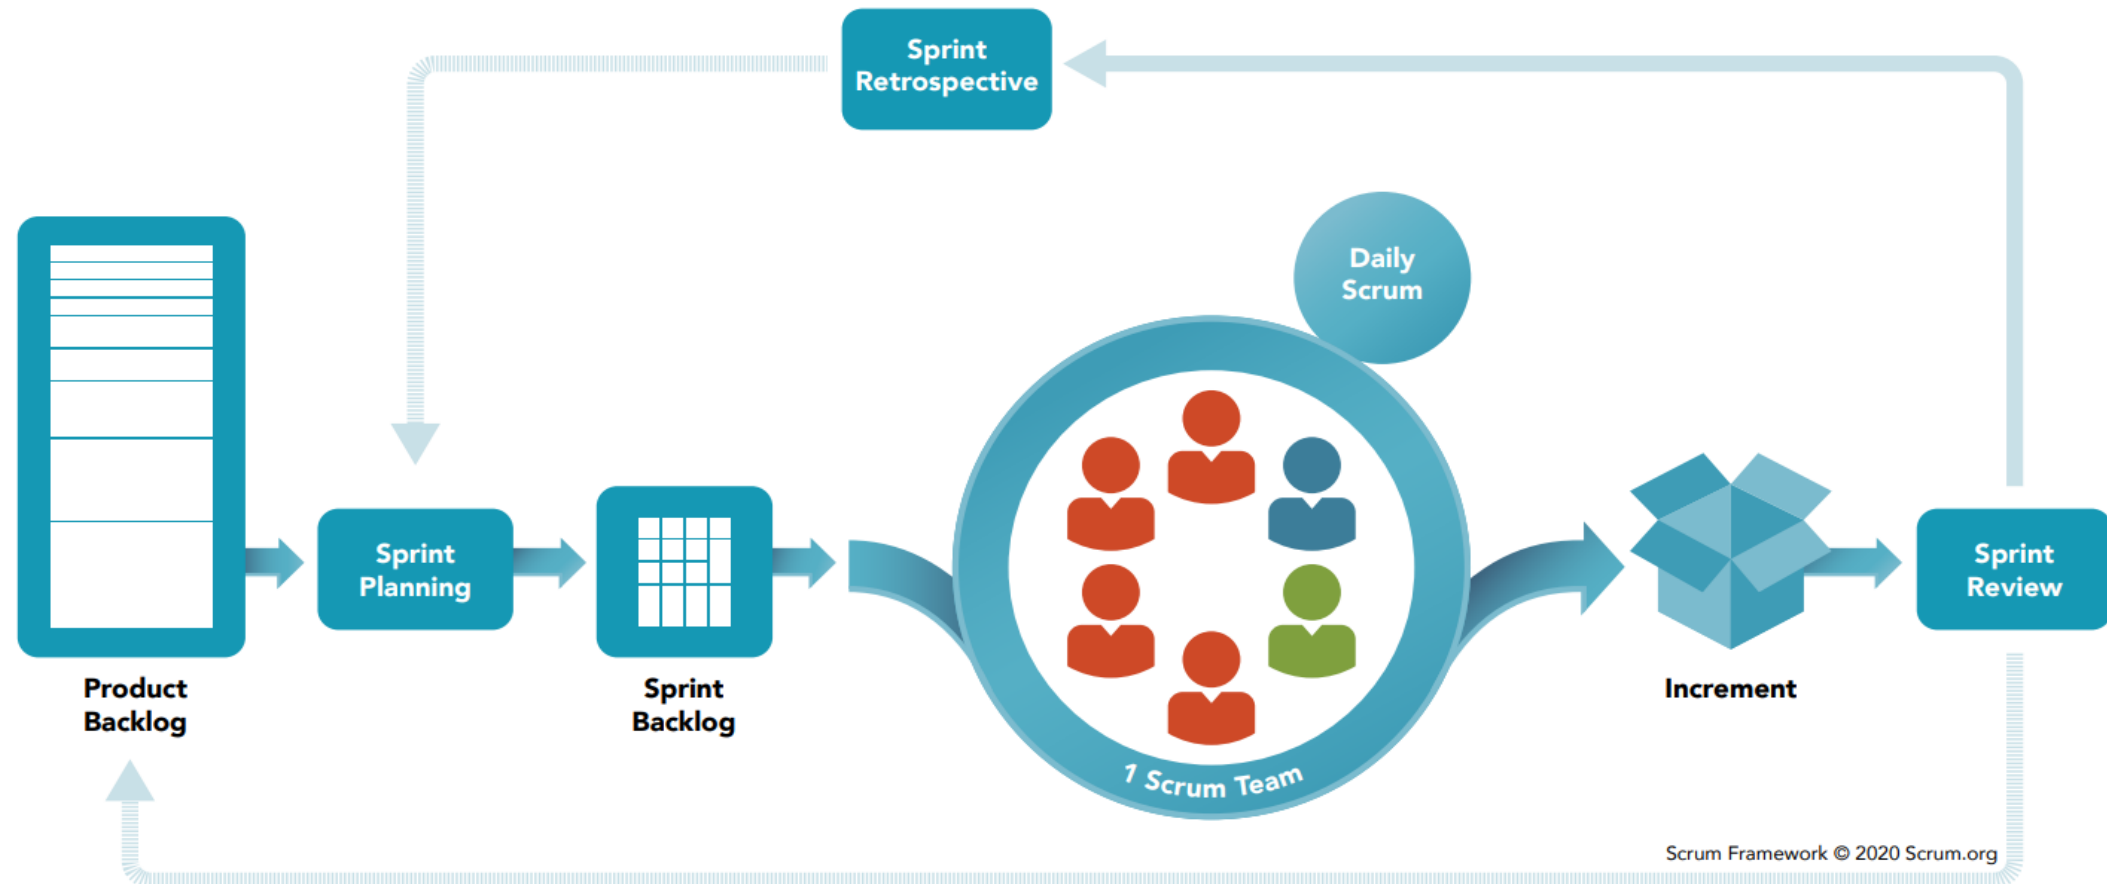

L'Agilité selon SCRUM

Le cœur de Scrum est le Sprint, qui est une boîte de temps (time-box), une durée, de 4 semaines ou moins au cours de laquelle un Incrément Produit « Fini » fonctionnel et potentiellement publiable est créé.

La planification du Sprint (Sprint Planning) est un événement qui a une durée limitée à 8 heures maximum pour un sprint de 4 semaines et qui permet de planifier les activités prévues dans le sprint.

L'objectif du Sprint (Sprint Goal) est un but fixé pour le Sprint et peut être réalisé par l'implémentation d'une partie du Product Backlog.

L'objectif de la mêlée quotidienne (Daily Scrum) d'une durée de 15 minutes au plus est d'inspecter la progression vers l'Objectif de Sprint et d'adapter le Sprint Backlog si nécessaire, en ajustant les futurs travaux planifiés.

Dans Scrum, **la revue de Sprint (Sprint Review)** est organisée à la fin du Sprint pour inspecter l'incrément du produit et adapter le backlog du produit si nécessaire. Pendant la revue de Sprint qui dure au plus 4 heures pour les sprints de 4 semaines, l'équipe Scrum, et les parties prenantes échangent sur ce qui a été fait durant le Sprint.

La rétrospective de Sprint (Sprint Retrospective) qui dure au plus 3 heures maximum est une opportunité pour l'équipe Scrum de s'auto-inspecter et de créer un plan d'améliorations à adopter au cours du prochain Sprint.

L'Agilité selon SCRUM

Le Product Owner est la personne responsable de maximiser la valeur du produit résultant du travail de la Scrum Team. Il peut représenter les besoins de nombreuses parties prenantes dans le Product Backlog.

Le Scrum Master aide toutes les parties prenantes à comprendre la théorie et la pratique Scrum, à la fois au sein de la Scrum Team et de l'organisation.

Les développeurs sont les membres de la Scrum Team qui s'engagent à traiter n'importe quel aspect utile pour un Incrément durant chaque Sprint.

Scrum Team = Product Owner + Scrum Master + 3 à 9 Développeurs.

Le Backlog Produit élaboré par le Product Owner est une liste ordonnée de tous les éléments identifiés comme nécessaires au produit. Il se bonifie au fur et à mesure des sprints.

Le Sprint Backlog élaboré par et pour les développeurs est composé de l'Objectif de Sprint (pourquoi), de l'ensemble des éléments du Product Backlog choisis pour le Sprint (quoi), ainsi que d'un plan d'action pour la réalisation de l'Incrément (comment).

La Definition of Done (Définition de Fini) est une description formelle de l'état de l'Incrément lorsqu'il satisfait aux mesures de qualité requises pour le produit. Dès qu'un élément du Product Backlog satisfait à la Definition of Done, un Incrément est né.

Un Incrément est une première étape concrète vers l'Objectif de Produit. C'est le résultat d'un Sprint.


User story

Un **récit utilisateur**, ou « *user story* » en anglais, est une description simple d'un besoin ou d'une attente exprimée par un utilisateur et utilisée dans le domaine du développement de logiciels et de la conception de nouveaux produits pour déterminer les fonctionnalités à développer.

- En 1999, Kent Beck publie en premier le principe des récits utilisateurs dans le cadre de la méthode « *eXtreme Programming (XP)* » qu'il avait expérimentée depuis 1996 au sein du projet C3 chez Chrysler. Celle-ci utilise une gestion et des tâches à base de cartes. Des cartes de récit y sont utilisées pour désigner succinctement les fonctionnalités à développer.
- Un récit utilisateur est une phrase simple dans le langage de tous les jours permettant de définir avec suffisamment de précision le contenu d'une fonctionnalité à développer. Elle contient généralement trois éléments descriptifs de la fonctionnalité, sous la forme :

En tant que **QUI**, je veux **QUOI** afin de **POURQUOI**

Backlogs de produit et d'itération

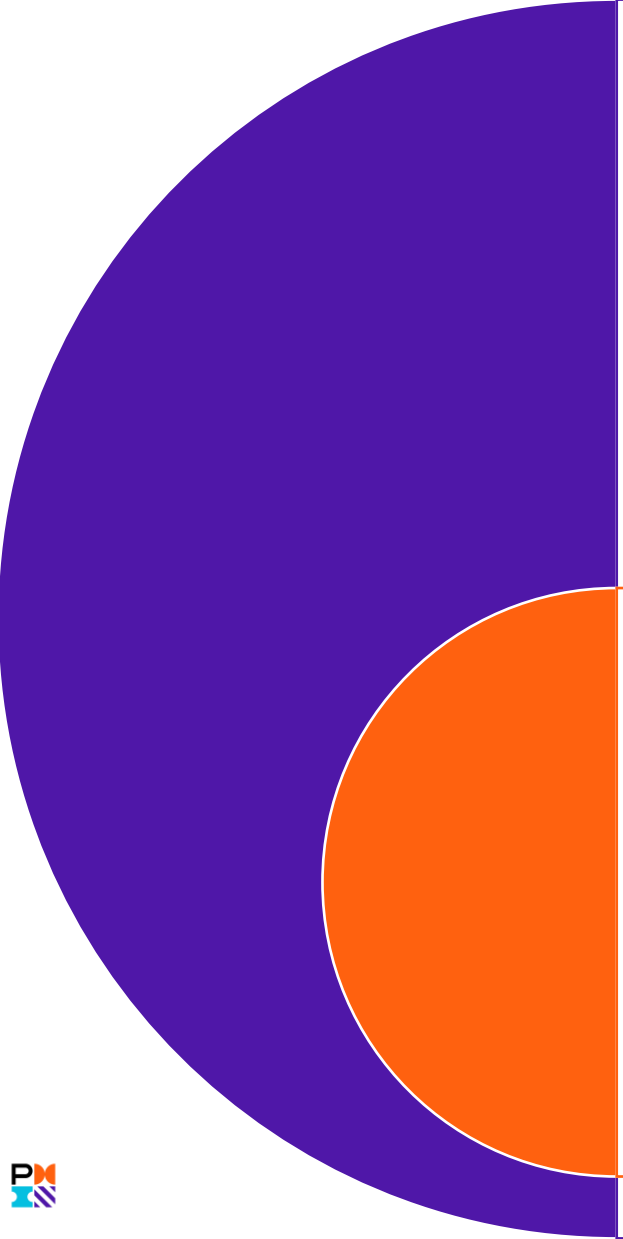

Un backlog de produit (carnet de produit ou product backlog) est essentiellement une liste du travail en attente pour livrer le produit.

- Le backlog de produit d'un projet évolue tout au long du projet.
- L'entretien et l'affinage du backlog de produit doivent être effectués régulièrement ; ils sont généralement planifiés à une fréquence hebdomadaire ou mensuelle.
- Les éléments du backlog de produit sont éliminés une fois le travail effectué.
- Les éléments du backlog sont modifiés et clarifiés au fur et à mesure que l'on en connaît davantage ou que les exigences changent.
- Des éléments sont continuellement ajoutés au backlog lorsque davantage de travail doit être effectué.

Le backlog d'itération ou sprint backlog comprend les éléments du backlog de produit qui peuvent être effectués dans la période de temps en fonction de la capacité de l'équipe.

- Les équipes doivent estimer l'effort nécessaire et comprendre les priorités de l'entreprise.

Cérémonies Agile

Scrum* : cadre de travail Agile pour développer et pérenniser des produits complexes impliquant des rôles, des événements et des artefacts spécifiques.

Sprint* : dans Scrum, itération développée dans un bloc de temps.

Cérémonie	Description
Planification du Sprint*	Événement collaboratif agile au cours duquel l'équipe et le product owner prévoit le travail pour le Sprint en cours. Il permet de passer en revue les user stories (récits) ayant la priorité la plus élevée ou les résultats clés, de poser des questions pour bien comprendre le récit et s'entendre sur les stories que l'équipe prévoit de terminer dans l'itération. Après accord, l'équipe détermine quelles activités sont nécessaires pour atteindre les objectifs de l'itération.
Réunion quotidienne	Brève réunion de 10-15 minutes organisée quotidiennement pour que l'équipe réaffirme son engagement envers ses objectifs pour l'itération, fasse émerger les points de blocage potentiels et coordonne le travail de la journée au sein de l'équipe. Souvent organisée en cercle. (Également appelée <i>daily Scrum</i> .)
Revue de sprint	Revue à la fin de chaque itération avec le product owner (représentant métier) et les autres parties prenantes du client pour passer en revue l'avancement du produit et obtenir un retour d'information pour cette itération.
Rétrospective de Sprint	Réunion des membres de l'équipe, animée par le Scrum Master, pour permettre à l'équipe d'identifier ses propres améliorations. Passe en revue les processus et les pratiques de l'équipe et identifie des moyens pour l'équipe d'améliorer ses performances, sa collaboration, etc.

Réunion quotidienne

Réunion quotidienne* : brève réunion de collaboration quotidienne durant laquelle l'équipe revient sur les progrès réalisés la veille, énonce les intentions du jour et met en lumière les obstacles rencontrés ou anticipés. Également connue sous le nom de *daily Scrum* (meeting quotidien).

- Effectuée au début de la journée de travail.
- La présence de tous les membres de l'équipe impliqués dans le Sprint est obligatoire.
- La réunion permet de répondre aux questions suivantes :
 - Qu'est-ce qui a été fait depuis la dernière réunion ?
 - Que faut-il faire avant la prochaine réunion ?
 - De quelle aide quelqu'un a-t-il besoin ?




Démonstrations

Les changements apportés aux solutions logicielles peuvent nécessiter la démonstration des configurations, processus, flux de travail ainsi que rôles et responsabilités modifiés.


Les retours recueillis au plus tôt permettent une adaptation tant que le retour est pertinent et doivent améliorer la qualité du changement tout en réduisant le coût global et les risques.

Les démonstrations doivent être examinées par les principales parties prenantes côté client et utilisateur pour obtenir des retours afin de s'assurer que les changements fonctionnent comme prévu et n'ont pas d'autre impact sur le flux de travail de la solution.


Revue/Démonstrations de Sprint



À la fin de chaque itération ou Sprint, l'équipe effectue une revue ou une démonstration de Sprint.



L'objectif est de se concentrer sur la réalisation complète des user stories dans chaque Sprint et de vérifier que la capacité est « potentiellement livrable ».



Aux phases précoces, l'acceptation du récit par le product owner (représentant métier) et tout retour permettent à l'équipe d'apporter les changements nécessaires pour optimiser la valeur commerciale.



Rétrospective

Planter le décor

- Activités de présentation pour impliquer l'équipe

Collecter et partager les données

- Métriques de performance de l'équipe, analyse de la valeur acquise, etc.

Générer des analyses

- Qu'est-ce qui fonctionne ? Quelles sont les difficultés ? Analyse des problèmes

Prendre des décisions

- Convenir d'un(e) ou deux améliorations/changements à essayer dans la prochaine itération.

Clore

- Nouvelles informations, gratitude et remerciements

Tâches du Product Owner

Son rôle est d'aider l'équipe du projet à prioriser le travail en fonction de la valeur que la capacité apportera à l'entreprise.

Crée et communique amplement la vision du produit.

Responsable de la définition et de la hiérarchisation des user stories avec l'aide de l'équipe.


Fournit des retours opportuns à l'équipe.

Responsable de la valeur commerciale ultime de la solution produite par l'équipe du projet.

Coordonne les différents besoins business des différentes parties prenantes dans le backlog de produit.

Répond aux questions de l'équipe sur la solution requise.

Prédicatif vs Adaptatif

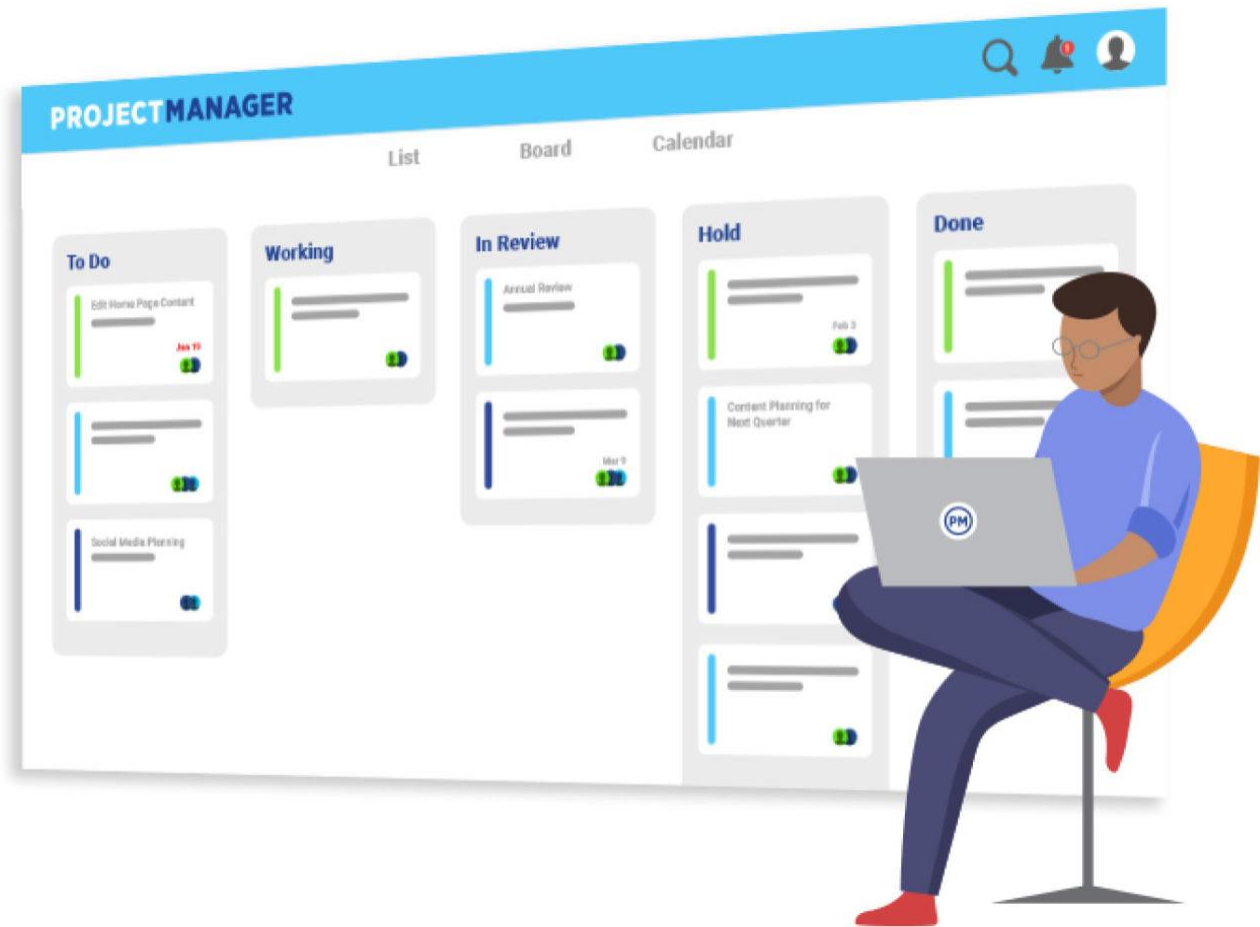

Workshop



Réunion de
planification



Point
quotidien



Comité Projet



Comité de
Pilotage



Parce que le Scrum aussi est un framework de gestion de projets avec Réunion

Grooming



Sprint planning



Daily Scrum



Sprint Review



Rétrospective



Chef de projet
Métier



équipe de réalisation
(Development Team)



PMO

Parce que l'Agilité aussi a autant de groupes d'intervenants



Product Owner




équipe de réalisation
(Development Team)





Scrum Master

Parce que l'Agilité aussi a ses étapes incontournables

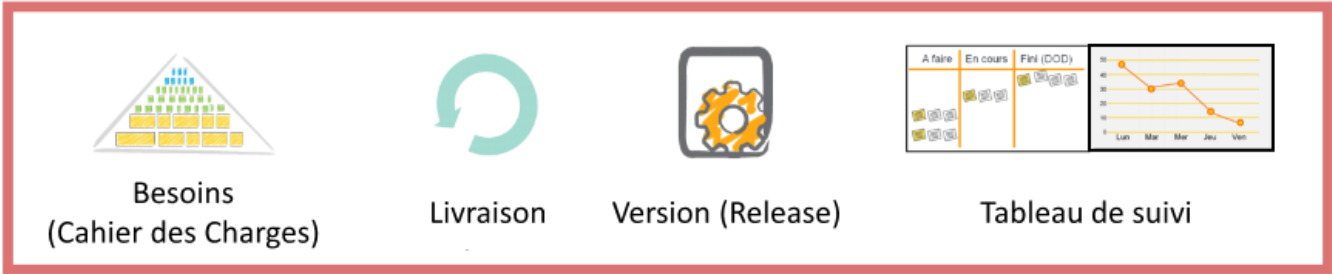


Parce que l'Agilité aussi a ses étapes incontournables

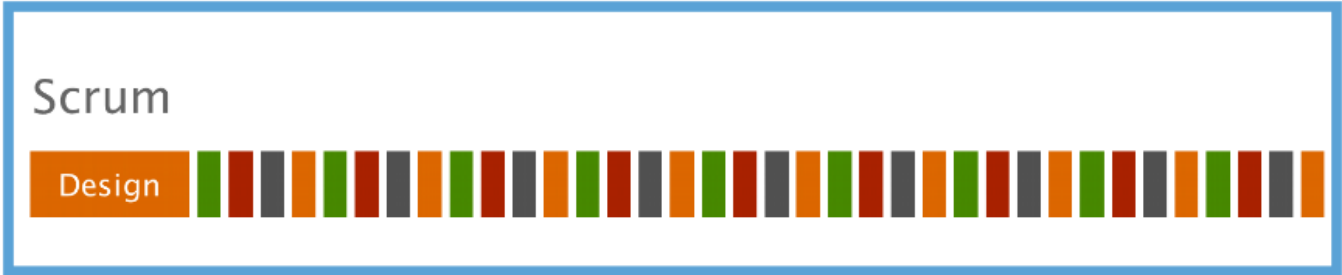



Parce que à chaque sprint on obtient une version du produit qui fonctionne.

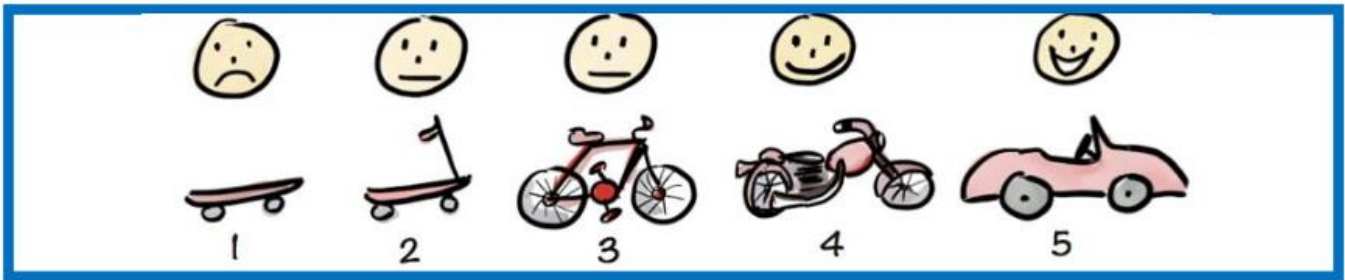

Parce que on s'en tient au planning et à la stricte durée des cérémonies (réunion courte à tous les jours).

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
Matin					
	Post-it Time			Sprint Review	
Après-midi	Daily Scrum	Daily Scrum	Daily Scrum	Daily Scrum	Daily Scrum
	Sprint Planning	Revue de Bac à Sable	Revue de Backlog (Grooming / Refinement)	Clôture du Sprint	Rétrospective

Tous les jours
1 fois par semaine
Une fois par Sprint
En cours de sprint

30 minutes max.

1 heure max.

1 heure 30 max.



RUBRIQUE F : STRUCTURES ORGANISATIONNELLES, PMO, OPA ET EEF



Catalyseurs


- Évaluer la culture de l'organisation (ECO 3.4.1)
- Évaluer l'impact du changement organisationnel pour déterminer les actions requises (ECO 3.4.2)
- Évaluer l'impact du projet sur l'organisation et déterminer les actions requises (ECO 3.4.3)

Livrables et outils

Livrables	Outils
Structures Organisationnelles	OPA
PMO	EEF

PMO

Bureau des Projets (Project Management Office, PMO)* : structure de management qui assure une gestion centralisée des projets, normalise les processus de gouvernance liés à des projets et facilite le partage des ressources, des méthodologies, des outils et des techniques.

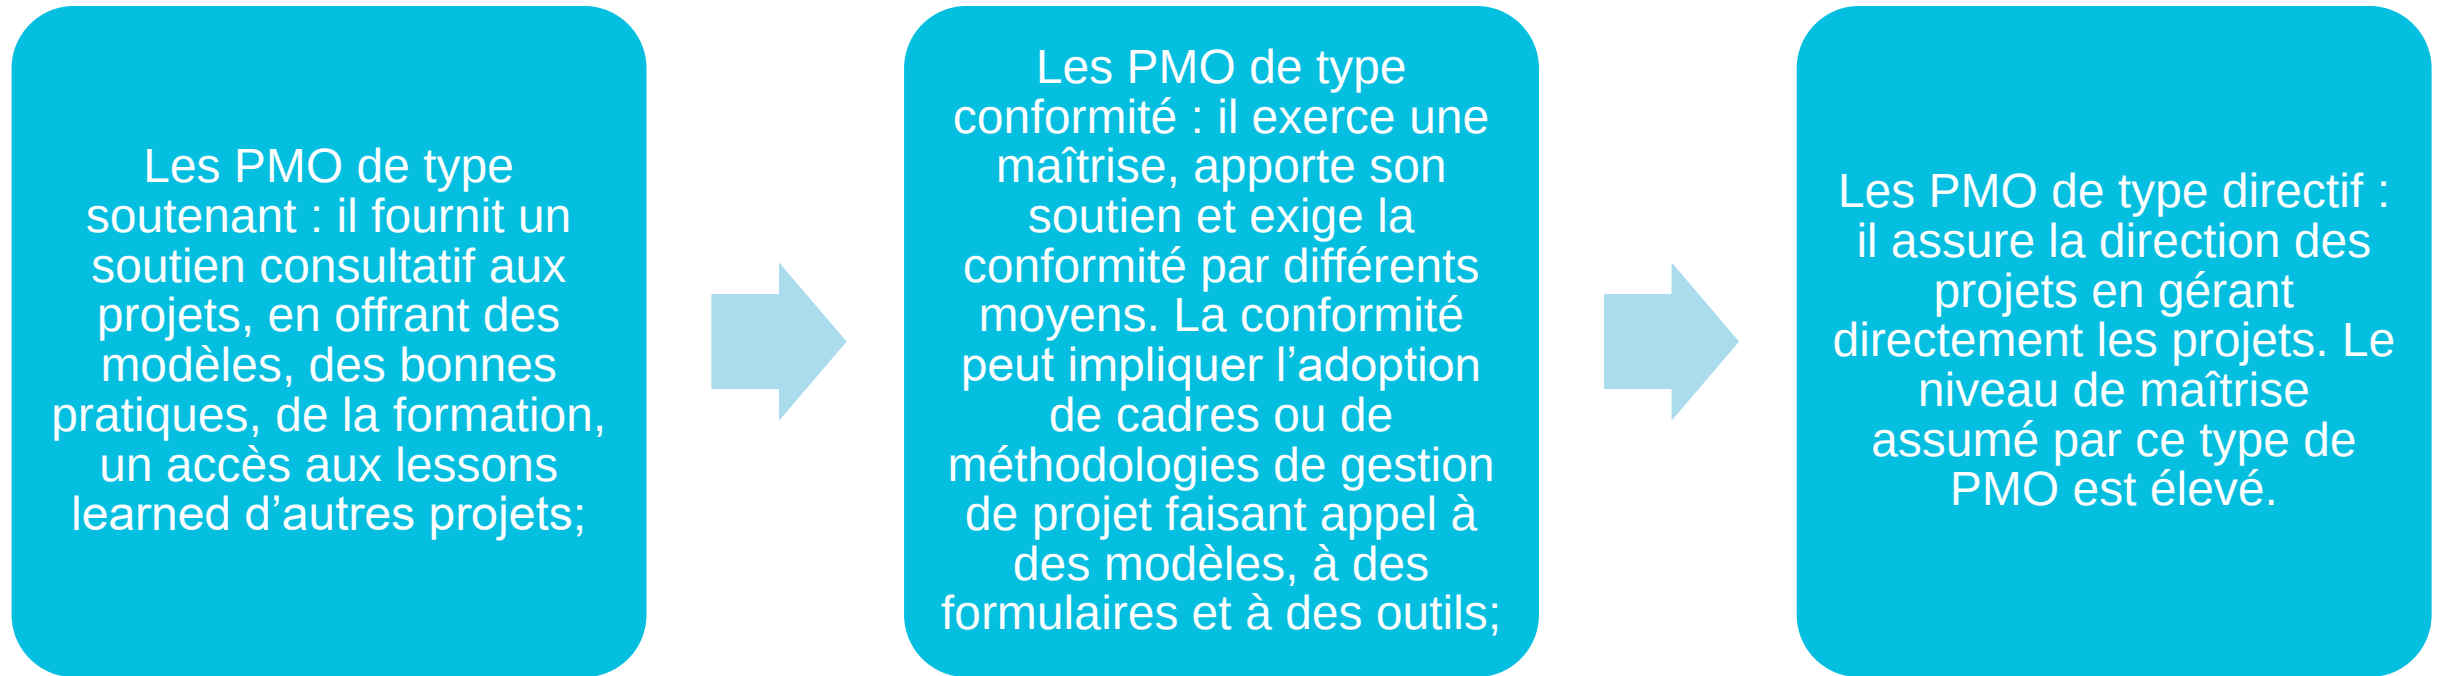


Les bureaux de projet permettent aux organisations de mieux gérer leurs ressources, réduire le nombre de projets qui échouent et de supporter les projets qui contribuent le plus à l'organisation.

Cultures et styles organisationnels



Structures organisationnelles


- Affecte la disponibilité des ressources
- Affecte la façon dont les projets sont menés
- Les principaux types de structures sont notamment la structure fonctionnelle, la structure orientée projet, la structure matricielle et la structure composite.

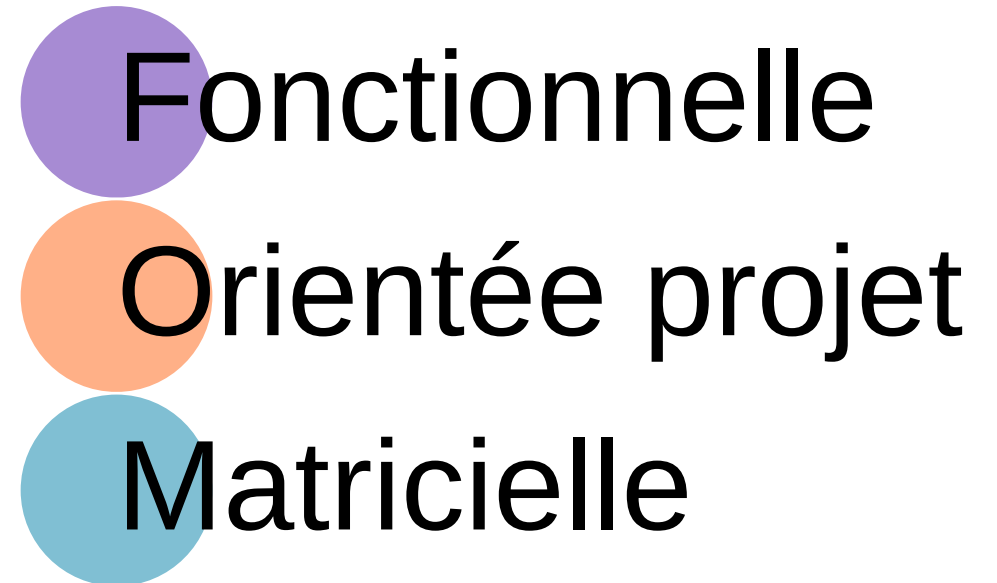

Gestion de projet & Structures Organisationnelles

Organisation Fonctionnelle

- ❖ Hiérarchie dans laquelle chaque employé a un supérieur clairement identifié ;
- ❖ Les membres du personnel sont regroupés au niveau supérieur par spécialité (Ex : production et marketing) ;
- ❖ Les organisations fonctionnelles réalisent elles aussi des projets, mais le contenu de ces projets reste généralement dans les limites de la fonction.

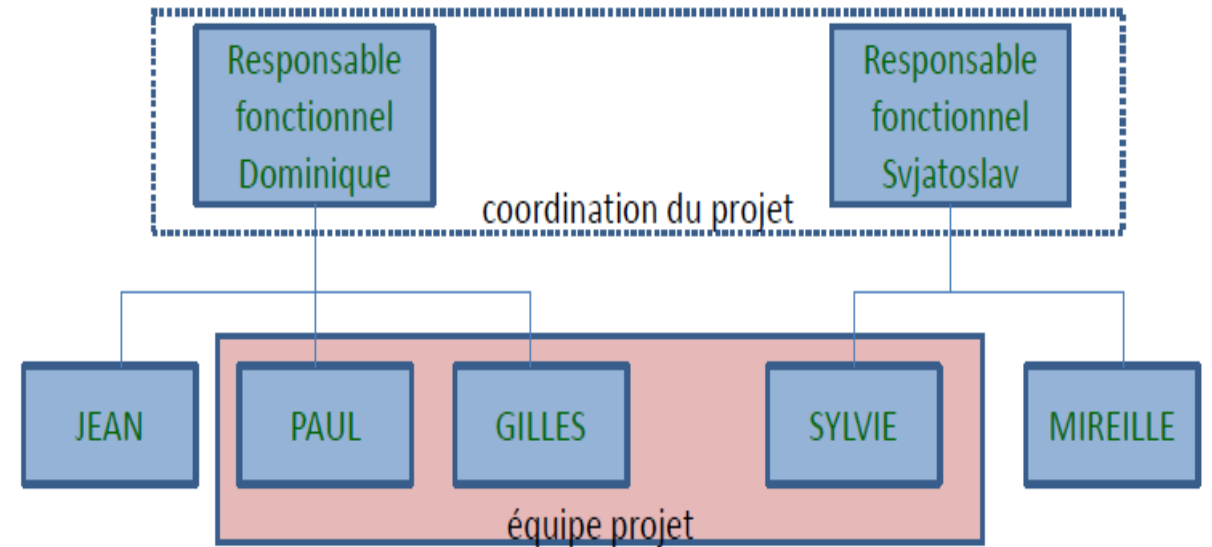


Gestion de projet & Structures Organisationnelles


Organisation par Projets

- ❖ Les membres de l'équipe sont souvent regroupés physiquement ;
- ❖ La majorité des ressources de l'organisation est impliquée dans du travail de projet ;
- ❖ Les chefs de projet disposent d'une indépendance et d'une autorité importantes.

Organisation par projets

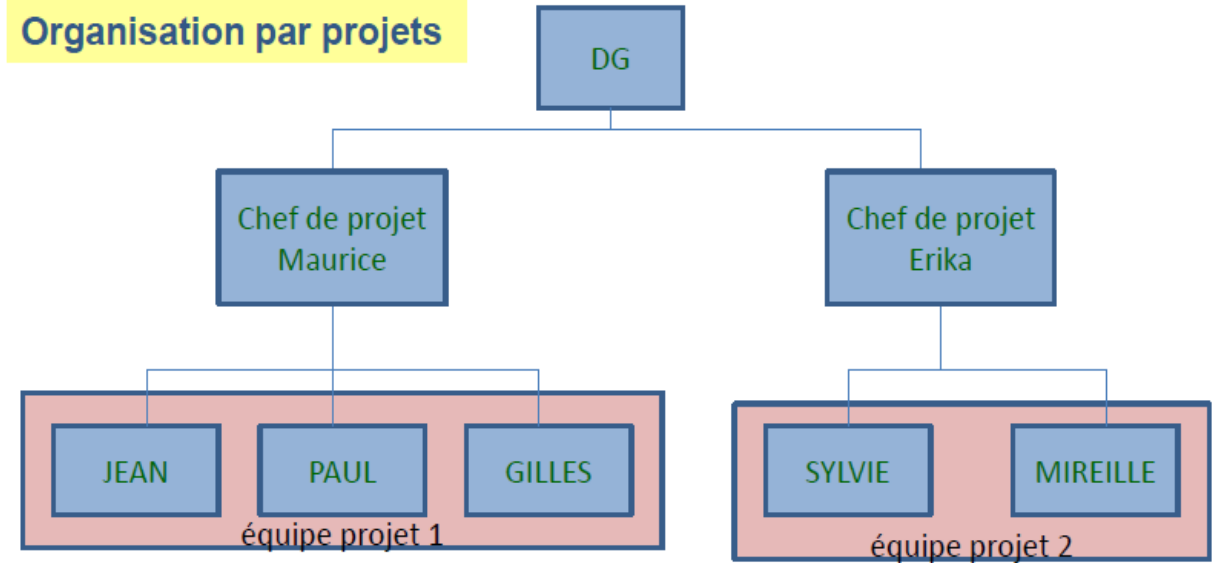

Organisation matricielle forte

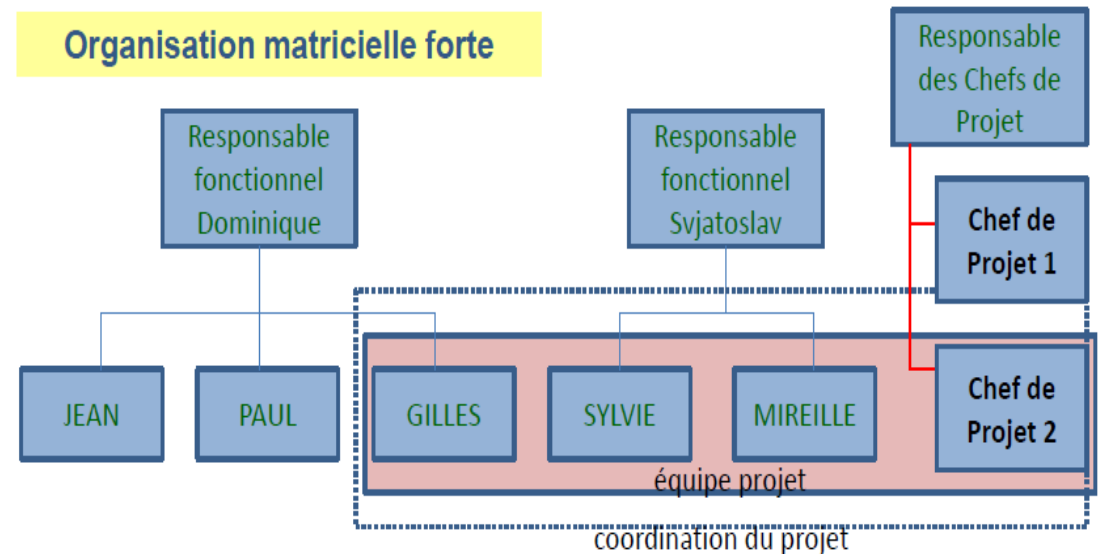

Gestion de projet & Structures Organisationnelles

Organisation Matricielle

Mélanges de structures fonctionnelles et par projets

❖ Les matrices faibles

- conservent de nombreuses caractéristiques des organisations fonctionnelles,
- rôle du chef de projet est plutôt celui d'un facilitateur que celui d'un manager ;


❖ Les matrices fortes

- conservent de nombreuses caractéristiques des organisations par projets,
- Chefs de projet à plein temps, disposant d'une autorité importante et d'un personnel administratif de projet à plein temps ;


❖ Les organisations matricielles équilibrées

- reconnaît la nécessité d'un chef de projet,
- ne laisse pas à celui-ci une autorité totale sur le projet et son financement.

Organisation matricielle faible

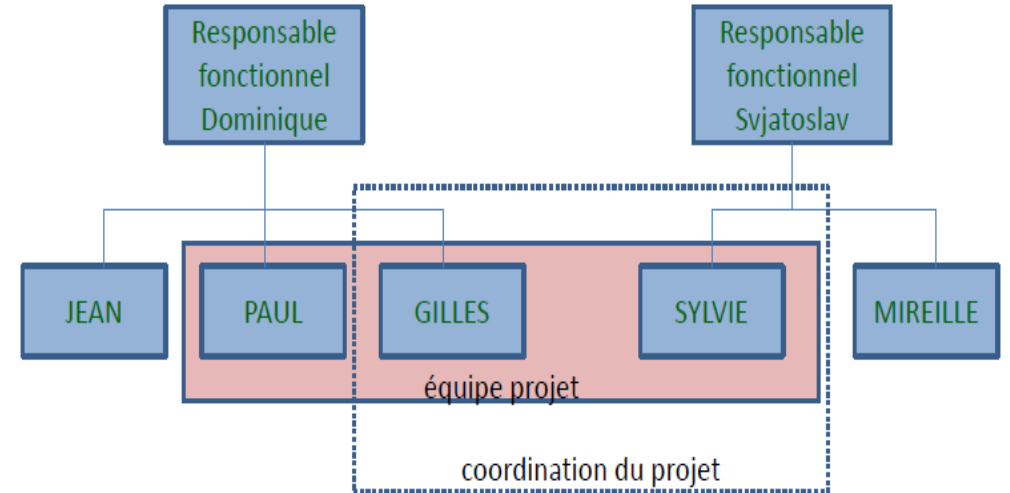

Organisation matricielle équilibrée

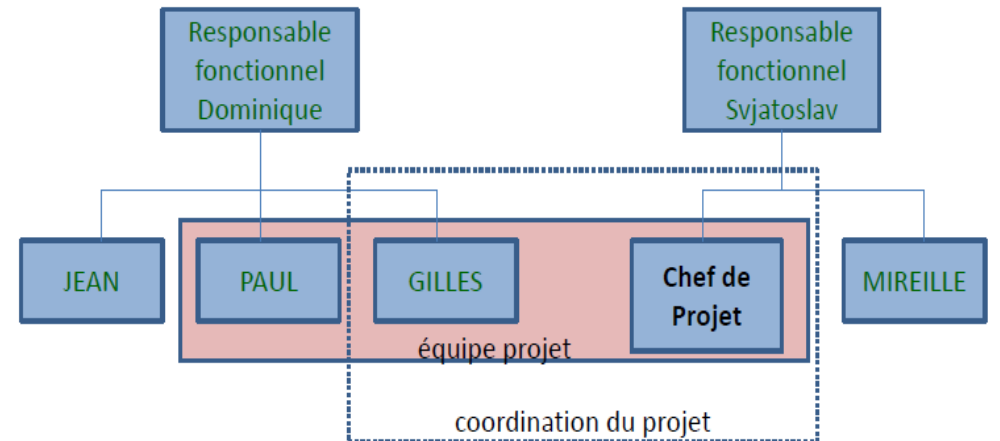


Gestion de projet & Structures Organisationnelles

Quelle est la structure organisationnelle de votre entreprise ?

Tableau 2-1. Influence des structures organisationnelles sur les projets

Structure organisationnelle Caractéristiques du projet	Fonctionnelle	Matricielle			Par projets
		Matrice faible	Matrice équilibrée	Matrice forte	
Autorité du chef de projet	Peu ou aucune	Faible	Faible à modérée	Modérée à forte	Forte à quasi totale
Disponibilité des ressources	Peu ou aucune	Faible	Faible à modérée	Modérée à forte	Forte à quasi totale
Qui gère le budget du projet	Responsable fonctionnel	Responsable fonctionnel	Mixte	Chef de projet	Chef de projet
Rôle du chef de projet	Temps partiel	Temps partiel	Plein temps	Plein temps	Plein temps
Personnel administratif de management de projet	Temps partiel	Temps partiel	Temps partiel	Plein temps	Plein temps

Autorité relative dans les structures organisationnelles



- L'autorité relative est l'autorité du chef de projet par rapport à l'autorité du responsable fonctionnel sur le projet et l'équipe du projet.

Relation	Fonctionnelle	Matricielle	Orientée projet
Les membres de l'équipe sont loyaux envers	Service fonctionnel	Conflit de loyauté	Projet
Les membres de l'équipe rendent compte au	Responsable fonctionnel	Responsable fonctionnel et chef de projet	Chef de projet
Le rôle de chef de projet est à	Temps partiel	Temps plein	Temps plein
Le rôle des membres de l'équipe est à	Temps partiel	Temps partiel	Temps plein
Le contrôle exercé par le chef de projet sur les membres de l'équipe est	Faible	Moyen	Élevé

Actifs Organisationnels et Facteurs Environnementaux

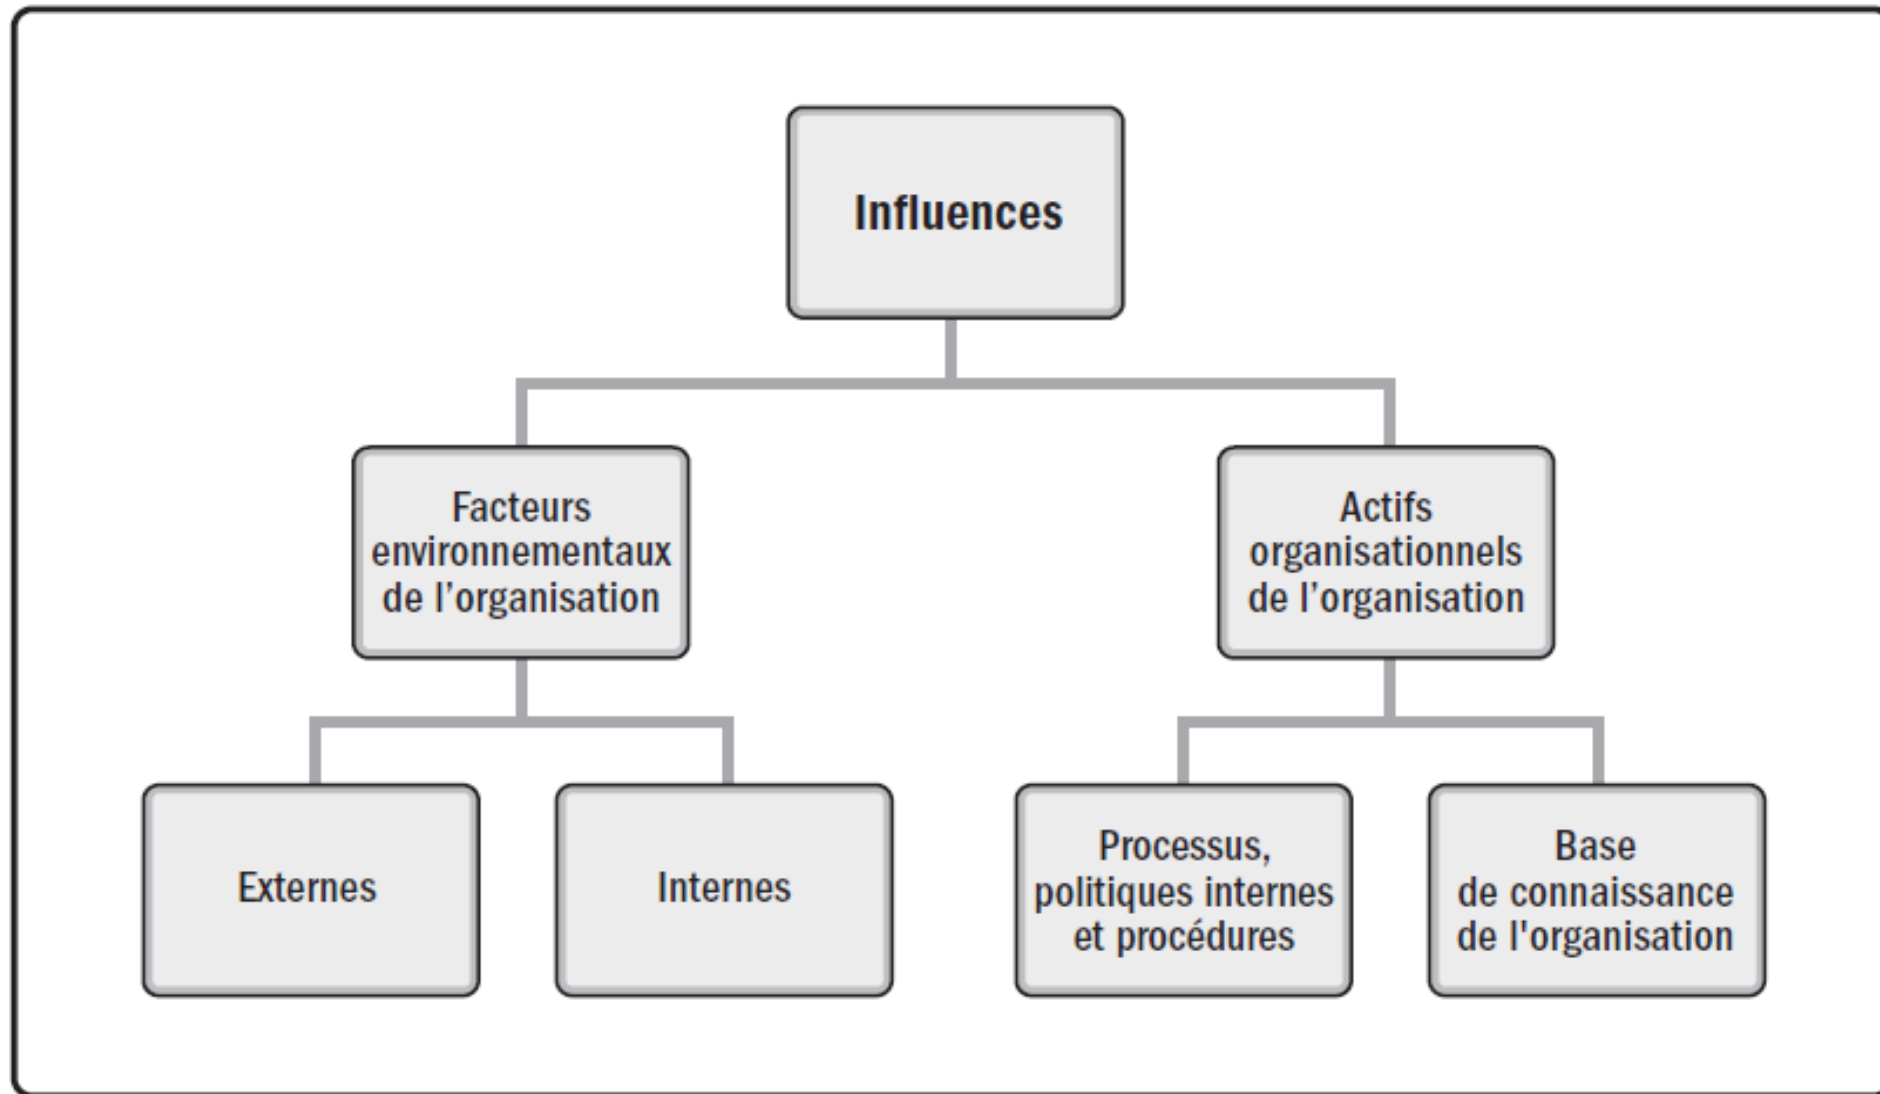


Figure 2-1. Influences du projet

Actifs organisationnels (OPA)

Actifs organisationnels (OPA)* : plans, processus, politiques internes, procédures et bases de connaissances qui sont spécifiques et utilisés par l'organisation réalisatrice.


- Exemples d'actifs organisationnels :
 - Directives et critères pour aligner le travail sur le projet.
 - Standards organisationnels spécifiques.
 - Modèles standards pour le travail de projet.
 - Exigences en matière de communications organisationnelles.
 - Directives standardisées, instructions de travail, critères d'évaluation des propositions et critères de mesure de la performance.
 - Procédures de clôture officielle d'un projet.
- La base de connaissances de l'organisation c'est un référentiel permettant de stocker les informations relatives au projet, notamment :
 - Les fichiers de projet.
 - Les politiques, procédures et directives.
 - La documentation sur les ressources humaines.
 - L'archive des leçons apprises.
 - Données historiques.

Facteurs environnementaux de l'organisation (EEF)


Facteurs environnementaux de l'organisation (EEF)* : paramètres qui ne sont pas sous le contrôle immédiat de l'équipe et qui influencent, contraignent ou orientent le projet, le programme ou le portefeuille ainsi que leur management.

- ❖ Normes gouvernementales ou industrielles;
- ❖ Systèmes d'information de gestion de projet;
- ❖ Structure organisationnelle et culture;
- ❖ Infrastructure en place;
- ❖ Gestion du personnel

Facteurs environnementaux de l'organisation (EEF)

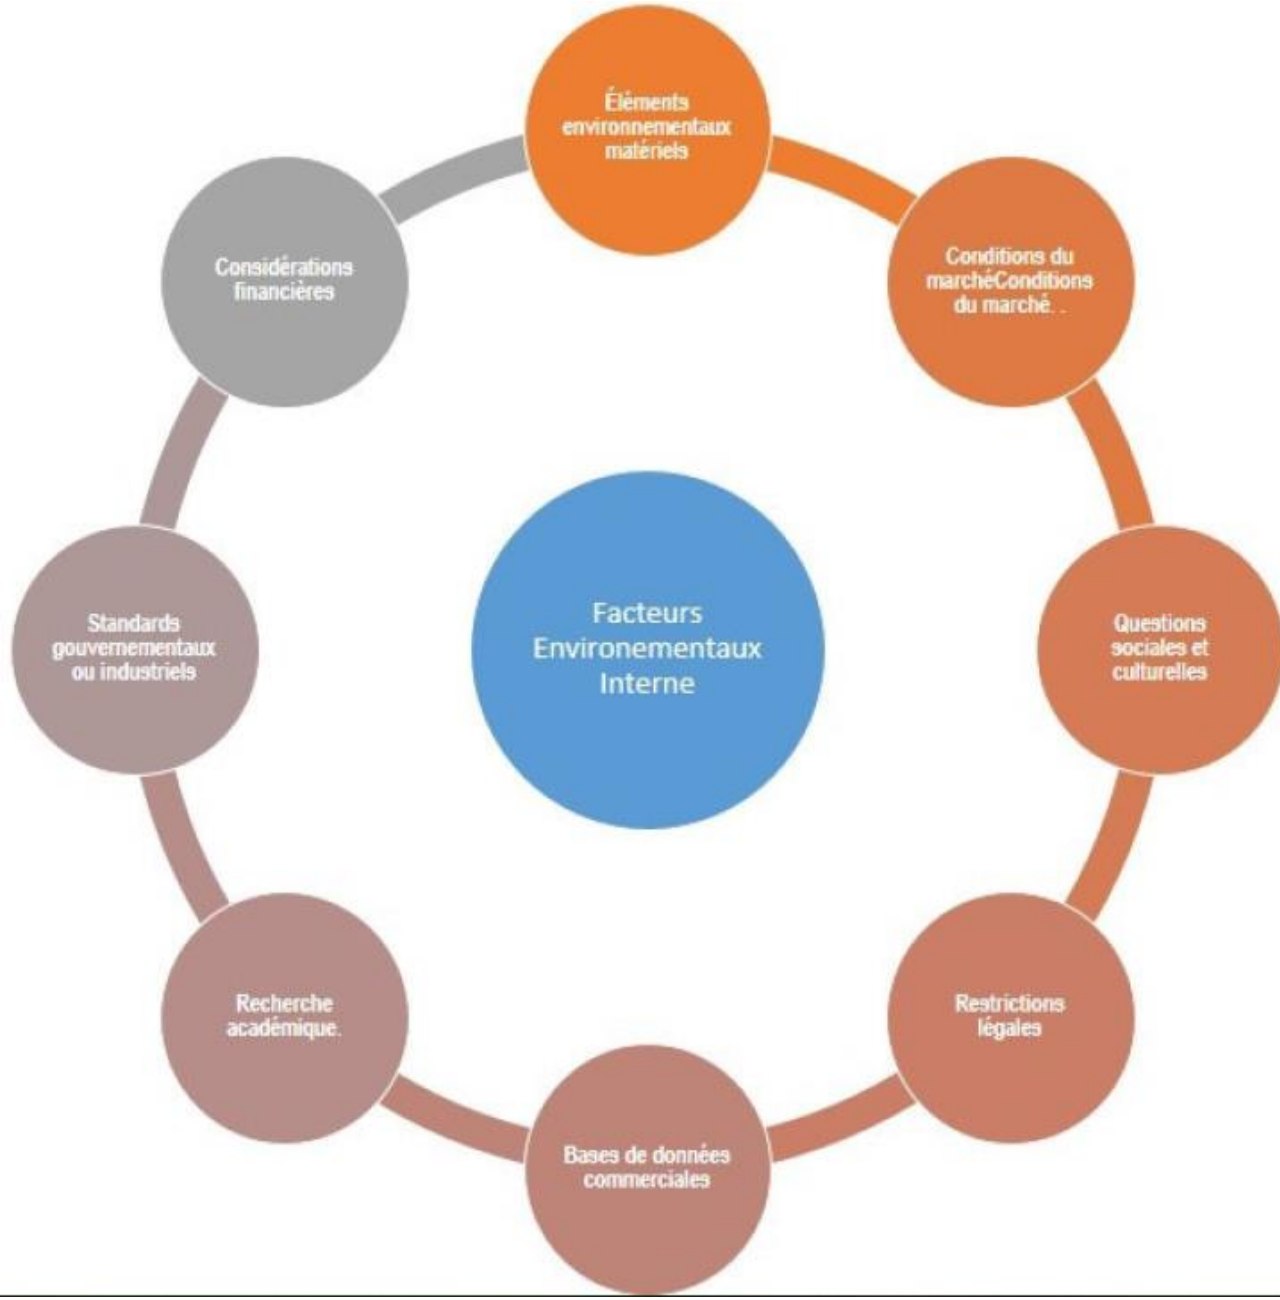

RUBRIQUE G : DÉTERMINER LA MÉTHODOLOGIE/ LE CYCLE DE VIE ET LES PRATIQUES APPROPRIÉES POUR LE PROJET

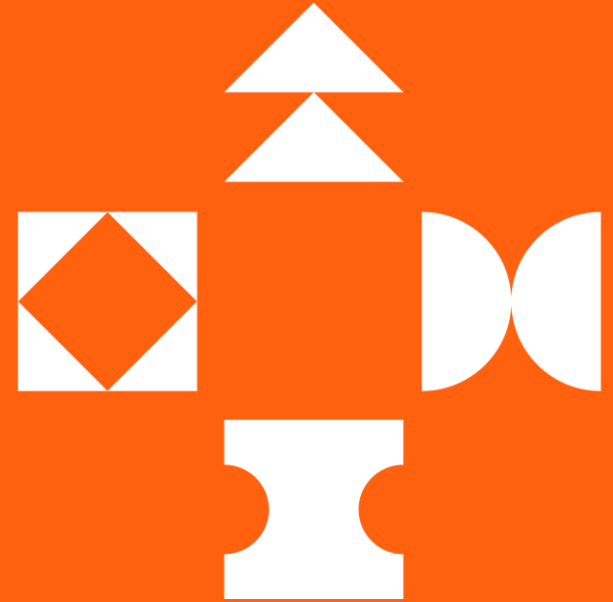

Catalyseurs

- Évaluer les besoins, la complexité et l'ampleur du projet (ECO 2.13.1)
- Recommander une stratégie d'exécution du projet (par exemple, sous-traitance, financement) (ECO 2.13.2)
- Recommander une méthodologie/approche du projet (par exemple, prédictive, Agile, hybride) (ECO 2.13.3)
- Utiliser des pratiques itératives et incrémentielles tout au long du cycle de vie du projet (ECO 2.13.4)

Livrables et outils

Livrables	Outils
Cycle de vie Prédictif	
Cycle de vie Itératif	
Cycle de vie Incrémentiel	
Cycle de vie Agile	
Cycle de vie Hybride	

Méthodologies, méthodes et pratiques du projet

Adaptatif (Agile)

- Approche moderne dans laquelle l'équipe collabore avec le client pour déterminer les besoins du projet au fur et à mesure du déroulement du projet.
- La coordination du client avec l'équipe fait avancer le projet.

Prédictive/fondée sur un plan

- Approche traditionnelle dans laquelle les besoins, les exigences et les contraintes du projet sont compris, et des plans sont élaborés en conséquence.
- Les plans font avancer le projet.

Hybride

- Approche combinée utilisant une stratégie adaptative et ou prédictive pour chaque besoin spécifique.
- Le projet peut changer d'approche en fonction des besoins, de l'évolution des exigences de travail ou des circonstances.

Évaluation des besoins, de la complexité et de l'ampleur du projet

Méthodologie	Idéale lorsque	Exemples
Agile	• Les changements sont relativement simples et le gaspillage n'est pas coûteux. • L'environnement est complexe, avec un produit final qui n'est pas entièrement connu et des retours d'information des utilisateurs qui sont très précieux.	Projets logiciels ou projets basés sur la propriété intellectuelle et la recherche.
Prédictive/fondée sur un plan	• Les changements sont coûteux en raison des rebuts et du gaspillage. • La prévisibilité et un calendrier coordonné sont importants.	Projets de construction ou projets avec de nombreux actifs matériels ou projets similaires ayant été réalisés dans le passé.
Itérative	• Les exigences sont dynamiques et les activités sont répétées jusqu'à ce qu'elles soient jugées correctes.	Projets où l'apprentissage et la correction sont censés aboutir à la solution idéale.
incrémentielle	• Exigences dynamiques, ainsi que des livraisons petites et fréquentes. • La rapidité de livraison de petits incréments est un objectif majeur.	Projets dans lesquels les clients ou l'entreprise souhaitent ou attendent la livraison précoce et fréquente de données de sortie, même partielles.
Hybride	• Les changements ont un certain coût. • Les parties prenantes s'intéressent à une autre méthode, sans toutefois souhaiter adopter pleinement une seule méthode.	Projets avec une diversité de ressources et de niveaux d'expérience ou projets ouverts à l'apprentissage de nouvelles méthodes ou techniques.


Types de cycles de vie

Prédictif

Adaptatif

- Itératif
- Incrémentiel
- Agile

Hybride

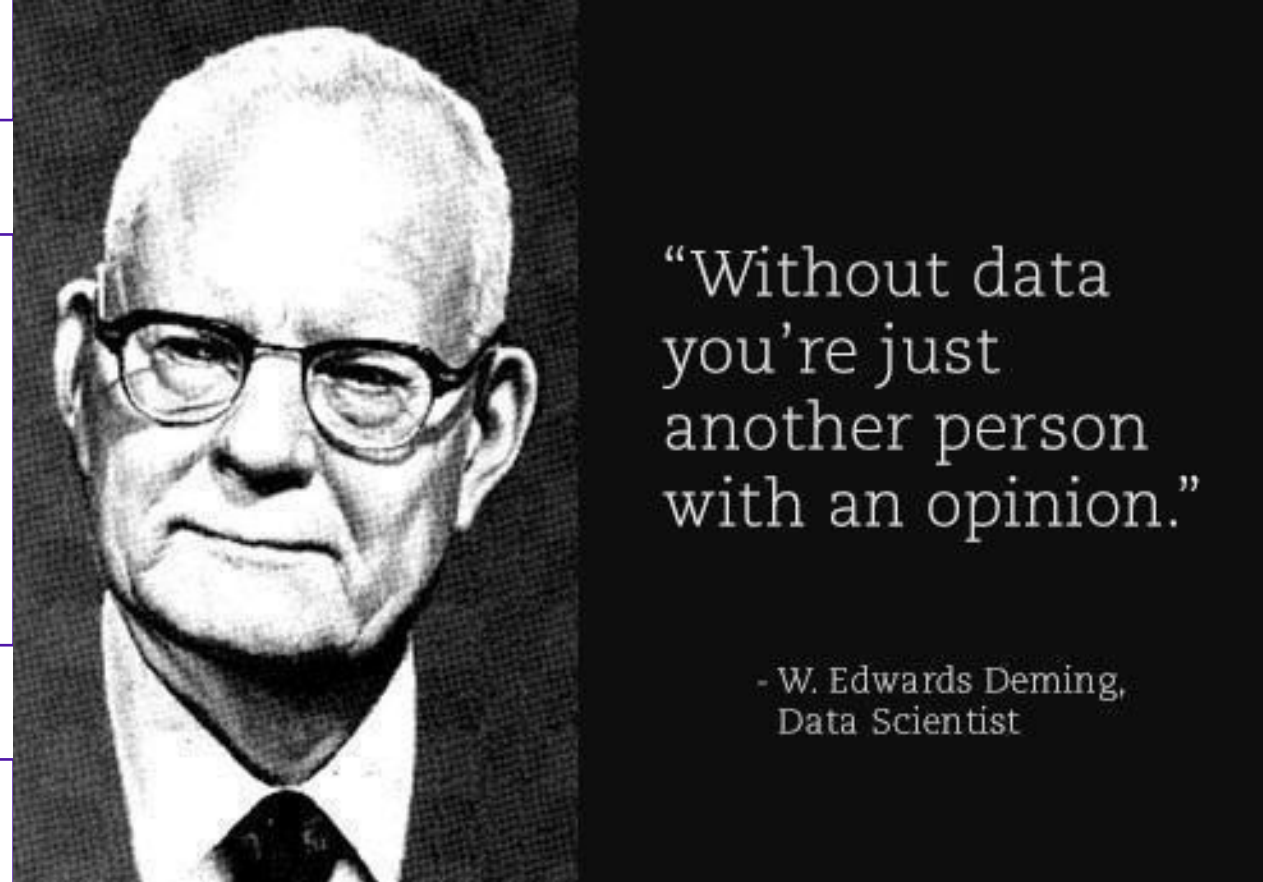

Cycles de vie prédictifs

Cycle de vie prédictif* : forme de cycle de vie d'un projet dans laquelle le périmètre, la durée et le coût du projet sont déterminés au cours des premières phases du cycle de vie.

Types	Caractéristiques
Prédictif	- Exigences fixes - Activités effectuées une fois par projet - Livraison unique - Objectif : gérer les coûts

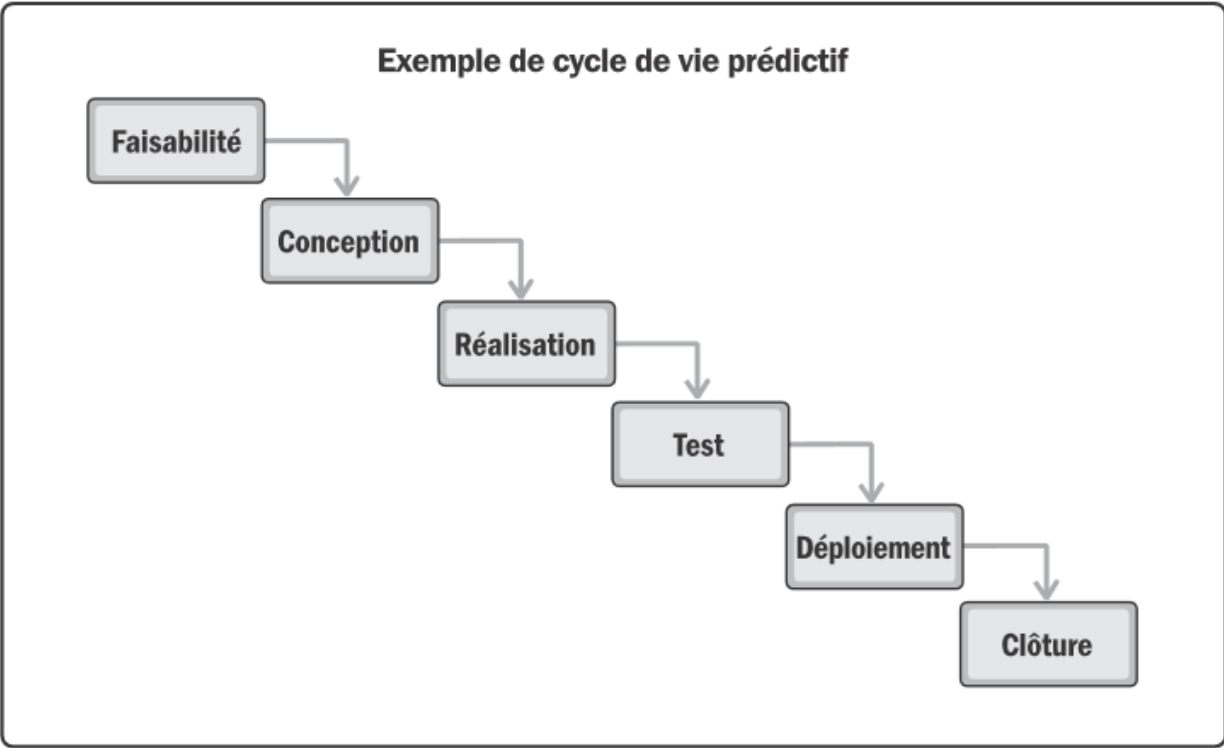


Figure 2-9. Exemple de cycle de vie prédictif

Cycles de vie itératifs

Cycle de vie itératif* : cycle de vie d'un projet dans lequel le périmètre du projet est, en règle générale, déterminé au début du cycle de vie du projet. Toutefois, l'estimation de la durée et des coûts évolue régulièrement au fur et à mesure que l'équipe du projet acquiert une meilleure compréhension du produit.

Types		Caractéristiques
Adaptatif	Itératif	- Exigences dynamiques - Activités répétées jusqu'à ce qu'elles soient correctes - Livraison unique - Objectif : solution correcte

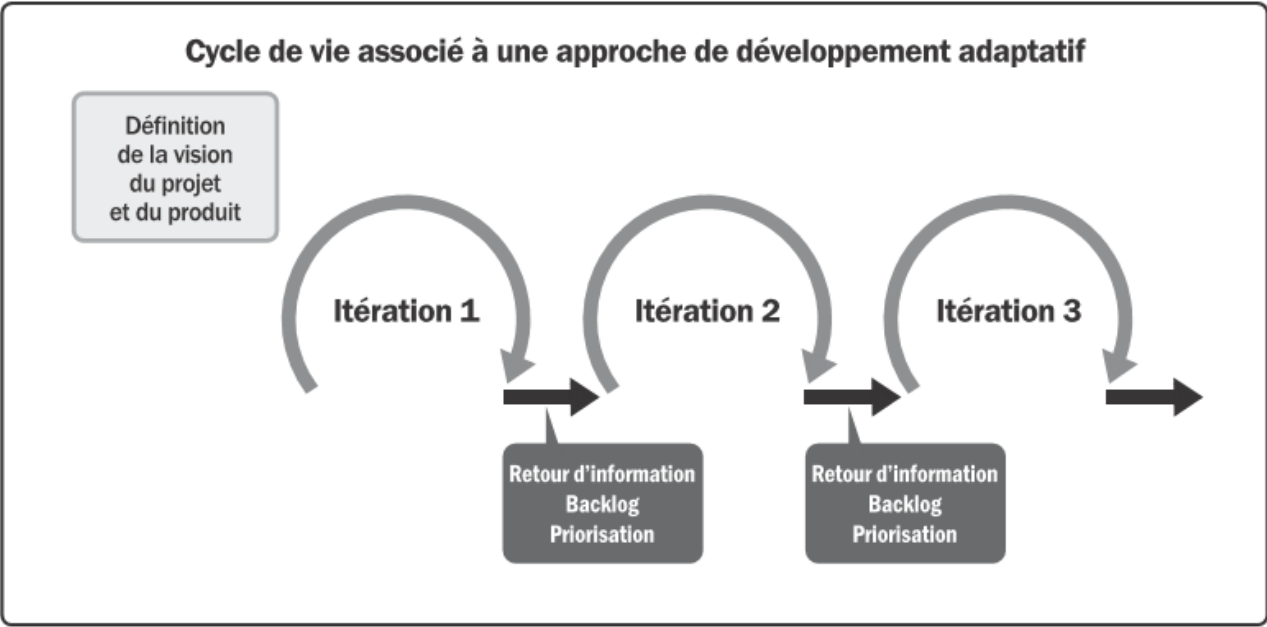


Figure 2-11. Cycle de vie associé à une approche de développement agile

Cycles de vie incrémentiels

Cycle de vie incrémentiel* : cycle de vie d'un projet adaptatif dans le cadre duquel les livrables proviennent d'une série d'itérations qui ajoutent progressivement des fonctionnalités dans une période de temps prédéterminée. Les livrables comprennent les capacités nécessaires et suffisantes pour être considérés comme complets après l'itération finale uniquement.

Types		Caractéristiques
Adaptatif	Itératif	- Exigences dynamiques - Activités répétées jusqu'à ce qu'elles soient correctes - Livraison unique - Objectif : solution correcte
	Incrémentiel	- Exigences dynamiques - Activités effectuées une fois par incrément - Petites livraisons fréquentes - Objectif : vitesse

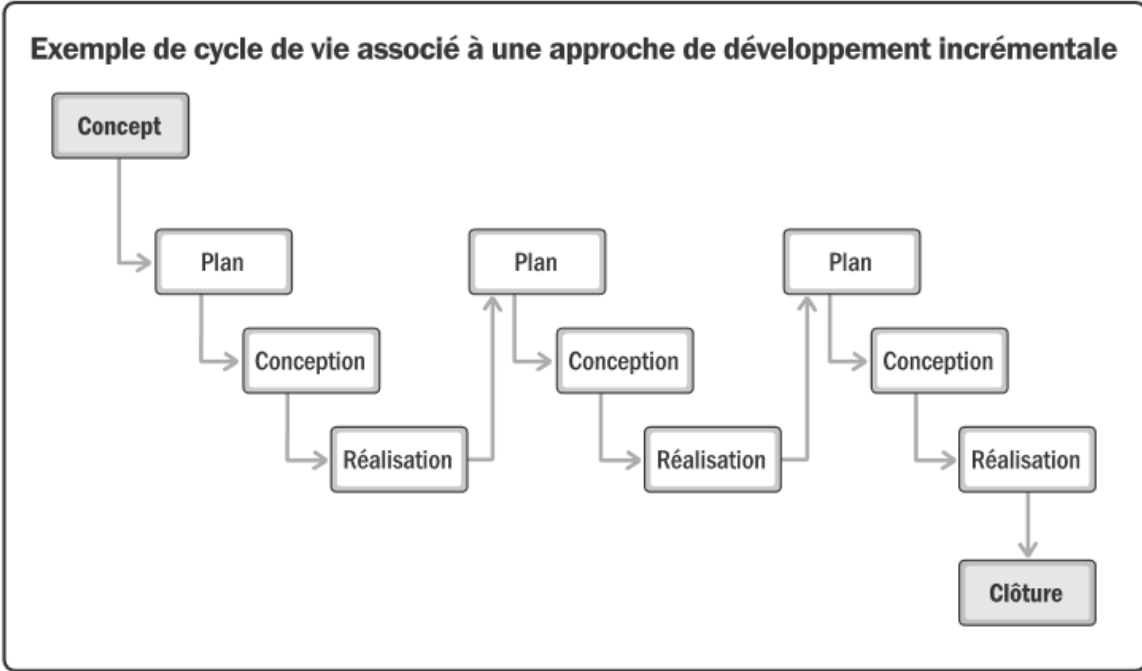


Figure 2-10. Cycle de vie associé à une approche de développement incrémentale

Cycles de vie Agiles

Cycle de vie Agile* : cycle de vie d'un projet itératif ou incrémentiel. Également appelé cycle de vie basé sur le changement ou adaptatif.

Types		Caractéristiques
Adaptatif	Itératif	- Exigences dynamiques - Activités répétées jusqu'à ce qu'elles soient correctes - Livraison unique - Objectif : solution correcte
	Incrémentiel	- Exigences dynamiques - Activités effectuées une fois par incrément - Petites livraisons fréquentes - Objectif : vitesse
	Agile	- Exigences dynamiques - Répétition itérative des activités et livraisons incrémentielles - Objectif : valeur pour le client



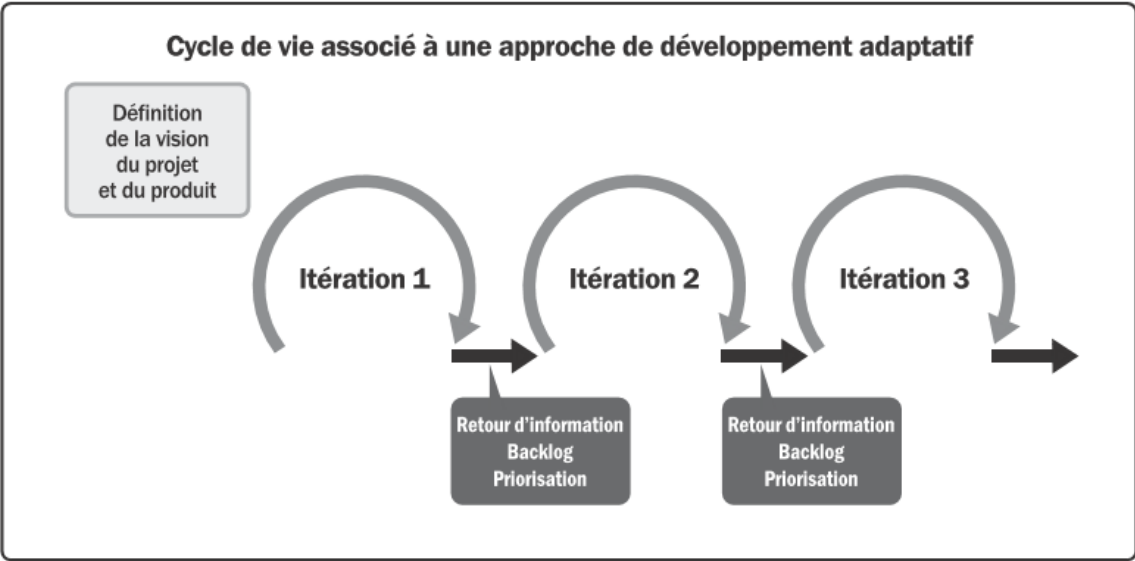


Figure 2-11. Cycle de vie associé à une approche de développement agile

Cycles de vie hybrides

Types		Caractéristiques
Prédictif		• Exigences fixes • Activités effectuées une fois par projet • Livraison unique • Objectif : gérer les coûts
Adaptatif	Itératif	• Exigences dynamiques • Activités répétées jusqu'à ce qu'elles soient correctes • Livraison unique • Objectif : solution correcte
	Incrémentiel	• Exigences dynamiques • Activités effectuées une fois par incrément • Petites livraisons fréquentes • Objectif : vitesse
	Agile	• Exigences dynamiques • Répétition itérative des activités et livraisons incrémentielles • Objectif : valeur pour le client
Hybride		• Composants adaptatifs et prédictifs • Périodes de temps itératives plus courtes • Forte implication des parties prenantes • Exigences plus détaillées

RUBRIQUE H : LE CODE D'ETHIQUE ET DE CONDUITE PROFESSIONNELLE



Livrables et outils

Livrables	Outils
Code Éthique et de Conduite Professionnelle	

Code Éthique et de Conduite Professionnelle

En tant que praticiens de la Gestion de Projet :

- ❖ nous nous engageons à faire ce qui est juste et honorable ;
- ❖ nous établissons des normes élevées pour nous-mêmes et nous aspirons à rencontrer ces normes dans tous les aspects de notre vie à la maison, au travail et sur tous les plans ;

Code Ethique et de Conduite Professionnelle

- ❖ Il décrit les attentes que le PMI a de lui-même et de l'ensemble des praticiens dans la communauté globale de Gestion de Projet;
- ❖ Il définit les idéaux auxquels le PMI aspire ainsi que les habitudes qui sont obligatoires dans notre rôle professionnel ;

Le but de ce code est d'installer la confiance dans la profession de la Gestion de Projet et d'aider les personnes à devenir de meilleurs praticiens.

Il s'applique à :

- ❖ Tous les membres du PMI ;
- ❖ Les non-membres qui :
 - ☐ Ont une certification PMI ;
 - ☐ Appliquent pour passer une certification PMI ;
 - ☐ Servent en tant que volontaires.

Le Code est basé sur 4 Valeurs :

- ❖ La Responsabilité ;
- ❖ Le Respect ;
- ❖ L'Équité ;
- ❖ L'Honnêteté.

Code Éthique et de Conduite Professionnelle

La Responsabilité

est notre devoir d'assumer les décisions que nous avons prises ou que nous avons manqué de prendre, les actions que nous avons menées ou que nous avons manqué de mener ainsi que les conséquences qui en résultent ;

Le Respect

est notre devoir d'avoir de l'estime pour nous même, les autres et pour les ressources qui nous sont confiées. Un environnement de respect conduit à la confiance, la performance en favorisant une coopération mutuelle, un environnement où diverses perspectives sont encouragées et tous les points de vue sont valorisés ;

L'Équité

est notre devoir de prendre des décisions et agir de manière impartiale et objective. Notre conduite doit être exempt de tout intérêt concurrent de soi, de préjugés et de favoritisme ;

L'Honnêteté

est notre devoir de comprendre la vérité et d'agir d'une manière véridique tant dans nos communications que dans notre conduite. Nous devons créer un environnement où les autres se sentent en sécurité.

Rétrospective d'apprentissage de ce Module

- ❖ Le projet et la gestion de projet
- ❖ Le programme et le portefeuille de projets
- ❖ PMI et PMBOK
- ❖ Rôles du Chef de Projet (Sphère d'influence, compétences, pouvoir et leadership)
- ❖ De la 6^{ème} à la 7^{ème} édition du PMBOK
- ❖ L'Agilité selon SCRUM
- ❖ Domaines de Connaissance et Domaines de Performances
- ❖ Groupes de Processus et Principes de Gestion de Projet
- ❖ Les structures organisationnelles
- ❖ Les facteurs environnementaux et les actifs organisationnels
- ❖ Le bureau de projet (PMO)
- ❖ Les cycles de vie du projet
- ❖ Code Ethique et de Conduite Professionnelle

Avantages et Inconvénients des projets Waterfall

Avantages	Inconvénients
La méthode est simple, facile à mettre en place, logique, structurée et éprouvée.	L'inconvénient majeur de cette approche est son manque de flexibilité à cause de son déroulement séquentiel.
Dès le départ, l'intégralité du projet est définie et planifiée avec précision, ce qui (en théorie) facilite l'estimation du budget, du temps et des ressources nécessaires.	Les risques de déception sont plus grands puisque le client ne voit le produit qu'à la livraison, il se peut qu'il soit déçu du résultat final, car ses attentes ont évolué ou le contexte a changé.
	Tous changements impliquent de revoir le projet dans son intégralité (ou presque), car toutes les phases en seront potentiellement affectées.

Avantages et Inconvénients des projets SCRUM


Avantages	Inconvénients
Coûts de production potentiellement moins élevée, car l'équipe livre les fonctionnalités avec le plus de valeur au début du projet.	Risque de multiplication des sprints quand les besoins sont mal définis ou mal communiqués.
Livraison de valeurs d'affaires plus rapidement (itérations). Le ROI est ainsi activé plus rapidement.	Plus le projet est long plus il y a des risques de devoir redévelopper des bouts de code, car les besoins évoluent (Refactoring).
Meilleure communication entre l'équipe TI et le client.	Il est possible que le client n'obtienne pas la solution complète si l'équipe consomme le budget avant de livrer l'ensemble des fonctionnalités.
Échanges actifs et quotidien au sein le l'équipe.	
Flexibilité, rapidité et adaptabilité.	

Agile vs Waterfall

WATERFALL : On sait ce qu'on veut, mais on n'est pas certain du temps que ça prendra ni du budget que ça prendra pour l'obtenir.

AGILE : On définit un budget et un calendrier et on encadre l'équipe afin d'obtenir le plus de fonctionnalités possible avant que le budget ne soit à sec.

Fixed

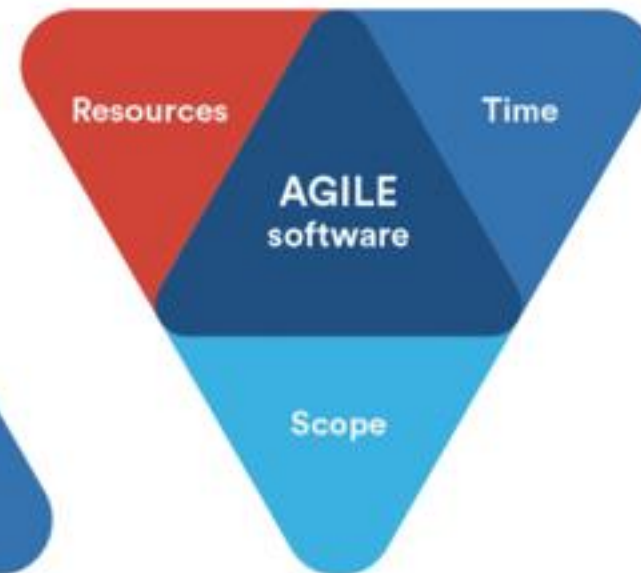

Estimated


Projet vs Produit

PROJET : On sait quand le projet commence et sait quand le projet se termine. Quand le projet est terminé on passe le système à l'équipe d'exploitation qui s'assure de son opération. Aucune amélioration n'est prévue pour l'avenir.

Le budget est fixe et déterminé à l'avance pour l'ensemble du projet. Souvent amortissable CAPEX.

PRODUIT : On sait quand le produit commence mais on ne sait pas quand il se termine. Il s'améliore continuellement jusqu'à ce qu'il n'apporte plus de valeur.

Le budget est trimestriel ou annuel et comprend une portion de développement et une portion d'amélioration/support aux opérations. Un mélange de CAPEX et OPEX.

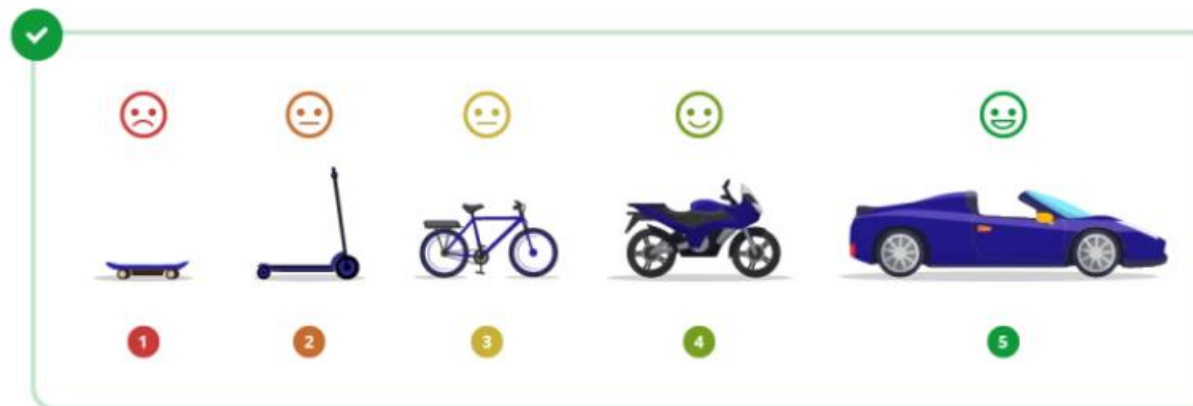

ANNEXES



Annexes 1 : des Principes

GESTION

Les gestionnaires agissent de façon responsable afin de mener leurs activités avec intégrité, attention et fiabilité, dans le respect des directives internes et externes. Ils font preuve d'une grande implication concernant les impacts financiers, sociaux et environnementaux des projets dont ils s'occupent.

- ▶ La gestion regroupe des responsabilités internes et externes à l'organisation.
- ▶ Elle comprend les caractéristiques suivantes :
 - intégrité ;
 - attention ;
 - fiabilité ;
 - conformité.
- ▶ Une vision d'ensemble de la gestion tient compte de la connaissance des aspects financiers, sociaux, techniques et d'environnement durable.

Figure 3-2. Être un gestionnaire diligent, respectueux et attentif

PARTIES PRENANTES

Il s'agit d'impliquer les parties prenantes de manière proactive et dans la mesure nécessaire afin de contribuer à la réussite du projet et à la satisfaction du client.

- ▶ Les parties prenantes influencent les projets, les performances et les résultats.
- ▶ Les équipes projet servent d'autres parties prenantes en travaillant avec elles.
- ▶ L'implication proactive des parties prenantes favorise la création de valeur.

Figure 3-4. Impliquer les parties prenantes de manière efficace

ÉQUIPE

L'équipe projet est constituée de personnes dotées de diverses compétences, connaissances et expérience. L'objectif commun est atteint plus efficacement lorsque les membres de l'équipe projet travaillent ensemble plutôt qu'individuellement.

- ▶ L'équipe projet est chargée de l'exécution des projets.
- ▶ Elle respecte la culture et les directives de l'organisation et de la profession, et établit souvent sa propre culture « locale ».
- ▶ À l'échelle de l'équipe projet, l'environnement collaboratif favorise :
 - le respect des autres cultures et directives de l'organisation ;
 - l'apprentissage et le développement de la personne mais aussi de l'équipe ;
 - les meilleures contributions en vue d'obtenir les résultats souhaités.

Figure 3-3. Créer un environnement collaboratif pour l'équipe projet

VALEUR

Il s'agit d'évaluer et d'ajuster constamment l'alignement du projet sur les objectifs de l'organisation, ainsi que sur les bénéfices et la valeur escomptés.

- ▶ La valeur est l'indicateur ultime de réussite d'un projet.
- ▶ La valeur est créée tout au long du projet, à la fin du projet ou après l'achèvement du projet.
- ▶ La valeur, ainsi que les bénéfices y contribuant, peut être définie de manière quantitative ou qualitative.
- ▶ Une équipe projet centrée sur les résultats soutient les bénéfices escomptés qui favorisent la création de valeur.
- ▶ L'équipe projet évalue les progrès et s'adapte afin d'optimiser la valeur prévue.

Figure 3-5. Se concentrer sur la valeur

Annexes 1 : des Principes

PENSÉE SYSTÉMIQUE

Il s'agit de reconnaître, évaluer et répondre de manière globale aux dynamiques liées au projet pour améliorer les performances du projet.

- ▶ Un projet est un système de domaines d'activité interdépendants et interagissants.
- ▶ Selon la pensée systémique, les interactions entre les parties du projet et les systèmes externes doivent être perçues dans leur intégralité.
- ▶ Les systèmes évoluent constamment. Il convient de prêter constamment attention aux conditions internes et externes.
- ▶ L'équipe projet doit être réceptive aux interactions des systèmes pour tirer parti des résultats positifs.

Figure 3-6. Reconnaître, évaluer et répondre aux interactions du système

LEADERSHIP

Il s'agit de manifester des comportements de leadership et les adapter pour répondre aux besoins individuels et de l'équipe.

- ▶ Un leadership efficace favorise la réussite du projet et contribue à des résultats positifs du projet.
- ▶ Tous les membres de l'équipe projet peuvent manifester des comportements de leader.
- ▶ Leadership et autorité sont deux notions différentes.
- ▶ Les leaders efficaces adaptent leur style à la situation.
- ▶ Les leaders efficaces reconnaissent les différents niveaux de motivation des membres de l'équipe projet.
- ▶ Les leaders adoptent le comportement souhaité en matière d'honnêteté, d'intégrité et de conduite éthique.

Figure 3-7. Manifester des comportements de leader

ADAPTATION

Il s'agit de concevoir l'approche de développement du projet en fonction de son contexte, de ses objectifs, de ses parties prenantes, de sa gouvernance et de son environnement en utilisant juste assez de processus pour obtenir les résultats souhaités tout en maximisant la valeur, en gérant le coût et en accélérant le rythme.

- ▶ Chaque projet est unique.
- ▶ La réussite du projet repose sur l'adaptation au contexte unique du projet en vue de déterminer les méthodes d'atteinte des résultats souhaités les plus appropriées.
- ▶ L'adaptation de l'approche est itérative. Par conséquent, il s'agit d'un processus continu tout au long du projet.

Figure 3-8. Adapter en fonction du contexte

QUALITÉ

Il s'agit de maintenir l'accent sur la qualité produisant des livrables qui atteignent les objectifs du projet et répondent aux besoins, utilisations et exigences d'acceptation établies par les parties prenantes concernées.

- ▶ La qualité du projet comprend la réponse aux attentes des parties prenantes, ainsi qu'aux exigences du projet et du produit.
- ▶ La qualité consiste à assurer que les livrables répondent aux critères d'acceptation.
- ▶ La qualité du projet consiste à assurer que les processus du projet sont appropriés et aussi efficaces que possible.

Figure 3-9. Garantir la qualité des processus et des livrables

Annexes 1 : des Principes

COMPLEXITÉ

Il s'agit d'évaluer et de gérer constamment la complexité du projet afin que les approches et les plans aident l'équipe projet à garder le cap tout au long du cycle de vie du projet.

- ▶ La complexité est le résultat du comportement humain, des interactions des systèmes, de l'incertitude et de l'ambiguïté.
- ▶ La complexité peut survenir à tout moment durant le projet.
- ▶ La complexité peut naître d'événements ou de conditions qui affectent la valeur, le périmètre, les communications, les parties prenantes, le risque et l'innovation technologique.
- ▶ L'équipe projet doit faire preuve de vigilance afin d'identifier les éléments de complexité et d'avoir recours à diverses techniques visant à réduire l'ampleur ou l'impact de la complexité.

Figure 3-10. Se frayer un chemin dans la complexité

CHANGEMENT

Il s'agit de préparer les personnes concernées à adopter et à maintenir des comportements et des processus nouveaux et différents nécessaires à la transition entre l'état actuel et l'état futur escompté créé par les résultats du projet.

- ▶ Une approche structurée du changement aide les personnes, les groupes et les organisations à passer de l'état actuel à l'état futur souhaité.
- ▶ Le changement peut provenir d'influences internes ou de sources externes.
- ▶ Favoriser le changement peut être difficile compte tenu du fait que toutes les parties prenantes n'y sont pas favorables.
- ▶ Trop de changement en peu de temps peut entraîner une fatigue ou une résistance.
- ▶ L'engagement des parties prenantes et les approches motivationnelles contribuent à l'adoption du changement.

Figure 3-13. Favoriser le changement pour atteindre l'état futur envisagé

RISQUE

Il s'agit d'évaluer constamment l'exposition au risque, que ce soit des opportunités ou des menaces, afin de maximiser les impacts positifs et de minimiser les impacts négatifs sur le projet et ses résultats.

- ▶ Les risques individuels et globaux peuvent avoir un impact sur les projets.
- ▶ Les risques peuvent être positifs (opportunités) ou négatifs (menaces).
- ▶ Les risques sont constamment pris en considération durant le projet.
- ▶ L'attitude vis-à-vis du risque, l'appétence au risque et le seuil de risque de l'organisation influencent sa façon de gérer le risque.
- ▶ Les réponses aux risques doivent être :
 - adaptées à l'importance du risque ;
 - rentables ;
 - réalistes dans le contexte du projet ;
 - approuvées par les parties prenantes concernées ;
 - prises en charge par une personne responsable.

Figure 3-11. Optimiser les réponses aux risques

ADAPTABILITÉ ET RÉSILIENCE

Il s'agit de renforcer l'adaptabilité et la résilience des approches de l'organisation et de l'équipe projet afin d'aider le projet à s'adapter au changement, à se relever d'un échec et à avancer.

- ▶ L'adaptabilité est la capacité à réagir face à l'évolution des conditions.
- ▶ La résilience est la capacité à absorber les impacts et à se remettre rapidement d'un échec.
- ▶ L'accent sur les résultats plutôt que sur les données de sortie favorise l'adaptabilité.

Figure 3-12. Accepter l'adaptabilité et la résilience

Annexes 2 : des Domaines de Performance

DOMAINE DE PERFORMANCE DES PARTIES PRENANTES

Le domaine de performance des parties prenantes englobe les activités et les fonctions inhérentes aux parties prenantes.

La bonne application de ce domaine de performance permet d'obtenir les résultats attendus suivants :

- ▶ Une relation professionnelle productive avec les parties prenantes tout au long du projet.
- ▶ L'approbation des objectifs du projet par les parties prenantes.
- ▶ Les parties prenantes bénéficiaires du projet sont solidaires et satisfaites, tandis que celles susceptibles de s'opposer au projet ou à ses livrables n'ont pas d'impact négatif sur les résultats du projet.

Figure 2-1. Domaine de performance des parties prenantes

DOMAINE DE PERFORMANCE DE L'ÉQUIPE

Le domaine de performance de l'équipe concerne les activités et les fonctions inhérentes aux personnes responsables de la réalisation des livrables du projet conduisant à l'obtention de résultats commerciaux.

La bonne application de ce domaine de performance permet d'obtenir les résultats attendus suivants :

- ▶ Responsabilité partagée.
- ▶ Équipe hautement performante.
- ▶ Leadership applicable et autres compétences interpersonnelles démontrées par tous les membres de l'équipe.

Figure 2-4. Domaine de performance de l'équipe

DOMAINE DE PERFORMANCE DE L'INCERTITUDE

Domaine de performance relatif aux activités et fonctions inhérentes aux risques et à l'incertitude.

Une bonne exécution de ce domaine de performance permet d'obtenir les résultats souhaités suivants :

- ▶ Une connaissance de l'environnement du projet, notamment les environnements techniques, sociaux, politiques, du marché et économiques.
- ▶ Une analyse de l'incertitude et les moyens pour y faire face de manière proactive.
- ▶ Une connaissance de l'interdépendance des multiples variables du projet.
- ▶ La capacité d'anticiper les menaces et les opportunités mais aussi de comprendre les conséquences des points à traiter.
- ▶ La livraison du projet avec peu ou pas d'impact négatif provenant d'événements ou de conditions imprévus.
- ▶ Des opportunités saisies afin d'améliorer la performance et les résultats du projet.
- ▶ L'utilisation efficace des réserves de coût et d'échéancier pour assurer la concordance avec les objectifs du projet.

Figure 2-32. Domaine de performance de l'incertitude

Annexes 2 : des Domaines de Performance

DOMAINE DE PERFORMANCE DE LA PLANIFICATION

Le domaine de performance de la planification concerne les activités et fonctions initiales, courantes et évolutives, d'organisation et de coordination, nécessaires pour produire les livrables et les résultats d'un projet.

La bonne application de ce domaine de performance permet d'obtenir les résultats attendus suivants :

- ▶ Le projet avance de manière organisée, coordonnée et délibérée.
- ▶ La livraison des résultats du projet suit une approche holistique.
- ▶ Des informations évolutives sont élaborées pour produire les livrables et les résultats pour lesquels le projet a été entrepris.
- ▶ Le temps consacré à la planification est approprié à la situation.
- ▶ Les informations de planification sont suffisantes pour gérer les attentes des parties prenantes.
- ▶ Il existe un processus d'adaptation des plans tout au long du projet en fonction de l'apparition et de l'évolution des besoins ou des conditions.

Figure 2-13. Domaine de performance de la planification

DOMAINE DE PERFORMANCE DE L'APPROCHE DE DÉVELOPPEMENT

Le domaine de performance de l'approche de développement et du cycle de vie couvre les activités et les fonctions associées à l'approche de développement, à la cadence et aux phases du cycle de vie du projet.

La bonne application de ce domaine de performance permet d'obtenir les résultats attendus suivants :

- ▶ Des approches de développement conformes aux livrables du projet.
- ▶ Un cycle de vie du projet comprenant des phases qui relient la création de valeur métier et de valeur des parties prenantes du début à la fin du projet.
- ▶ Un cycle de vie du projet comprenant des phases qui facilitent la cadence de livraison et l'approche de développement nécessaires pour produire les livrables du projet.

Figure 2-6. Domaine de performance de l'approche de développement et du cycle de vie

DOMAINE DE PERFORMANCE DU TRAVAIL DU PROJET

Domaine de performance du travail du projet relatif aux activités et fonctions inhérentes à l'établissement des processus du projet, à la gestion des ressources physiques et à la promotion d'un environnement d'apprentissage.

Une bonne exécution de ce domaine de performance permet d'obtenir les résultats souhaités suivants :

- ▶ Bonne performance du projet.
- ▶ Processus du projet adaptés au projet et à l'environnement.
- ▶ Communication appropriée avec les parties prenantes.
- ▶ Gestion efficace des ressources physiques.
- ▶ Gestion efficace des approvisionnements.
- ▶ Amélioration des compétences de l'équipe grâce à un apprentissage continu et à une amélioration des processus.

Figure 2-19. Domaine de performance du travail du projet

Annexes 2 : des Domaines de Performance

DOMAINE DE PERFORMANCE DE LIVRAISON

Domaine de performance de livraison relatif aux activités et fonctions inhérentes à la livraison du périmètre et de la qualité pour lesquels le projet a été entrepris.

Une bonne exécution de ce domaine de performance permet d'obtenir les résultats souhaités suivants :

- ▶ Les projets contribuent aux objectifs de l'entreprise et à la promotion de la stratégie.
- ▶ Les projets produisent les résultats escomptés.
- ▶ Les bénéfices du projet sont obtenus dans les délais prévus.
- ▶ L'équipe projet connaît parfaitement les exigences.
- ▶ Les parties prenantes acceptent et sont satisfaites des livrables du projet.

Figure 2-20. Domaine de performance de livraison

DOMAINE DE PERFORMANCE DE LA MESURE

Domaine de performance relatif aux activités et fonctions inhérentes à l'évaluation de la performance du projet et à l'engagement d'actions adaptées pour maintenir une performance acceptable.

Une bonne exécution de ce domaine de performance permet d'obtenir les résultats souhaités suivants :

- ▶ une bonne connaissance de l'état du projet ;
- ▶ des données exploitables pour faciliter la prise de décision ;
- ▶ des actions opportunes et adaptées pour maintenir la performance du projet ;
- ▶ la réalisation des objectifs et la création d'une valeur métier par une prise de décisions éclairées et opportunes fondées sur des prévisions et des évaluations fiables.

Figure 2-23. Domaine de performance de la mesure

Merci de votre attention



Alfinex
Conseils



Alfinex
Conseils



Alfinex
Conseils

Que ferait X ???
